




# INTERVENÇÕES URGENTES EM TRÊS CÂMARAS DA ATUAL ADUTORA ETA-MONTE CHÃOS FASE 1 - INTERVENÇÃO NA CAIXA DE VALE MARIM

CADERNO DE ENCARGOS  
PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

OUTUBRO 2022

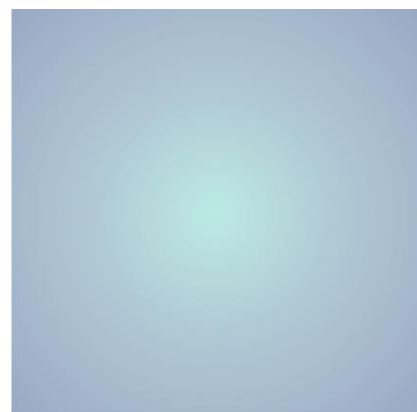

---

**INTERVENÇÕES URGENTES EM  
TRÊS CÂMARAS DA ATUAL ADUTORA ETA-MONTE CHÃOS -  
FASE I - INTERVENÇÃO NA CAIXA DE VALE MARIM**

# ***PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE***

---

| Fase de Projeto           |                          | Fase de Execução                         |                               |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Elaboração <sup>(1)</sup> | Aprovação <sup>(2)</sup> | Desenvolvimento/aplicação <sup>(3)</sup> | Acompanhamento <sup>(4)</sup> |
| R-CSP:<br>R-PRJ:<br>Data: | R-FCZ:<br>RDO:<br>Data:  | RSE:<br>DTE:<br>Data:                    | R-CSO:<br>R-FCZ:<br>Data:     |

<sup>(1)</sup> Responsável pelo exercício da Coordenação de Segurança em Projeto (R-CSP) e o Responsável do Projeto (R-PRJ) e representante do Coordenador de Segurança em Projeto; <sup>(2)</sup> Responsável da Fiscalização da Obra (R-FCZ) e o Representante do Dono da Obra (RDO); <sup>(3)</sup> Responsável do Empreiteiro (RSE) e o Diretor Técnico da Empreitada (DTE); <sup>(4)</sup> Responsável pelo exercício da Coordenação de Segurança em Obra (R-CSO) e o Responsável da Fiscalização da Obra (R-FCZ) e representante do Coordenador de Segurança em Obra.



## PROMULGAÇÃO

O presente Plano de Segurança e Saúde (PSS) respeita à empreitada da ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ, S.A. (AdSA) designada por "INTERVENÇÕES URGENTES EM TRÊS CÂMARAS DA ATUAL ADUTORA ETA-MONTE CHÃOS - FASE I - INTERVENÇÃO NA CAIXA DE VALE MARIM" e entra em vigor na data da consignação da empreitada.

Este PSS faz parte integrante do caderno de encargos da empreitada e estabelece as regras / especificações a observar no estaleiro da obra durante a fase de execução dos trabalhos, pretendendo-se com a implementação do preconizado eliminar ou reduzir o risco de ocorrência de acidentes e de doenças profissionais. Compete ao Empreiteiro manter este PSS permanentemente atualizado e implementá-lo desde o início da instalação do estaleiro de apoio ou de qualquer trabalho no estaleiro, até à receção provisória da empreitada ou, se for o caso, até à última receção provisória parcial, devendo o Empreiteiro devolvê-lo à ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ, S.A. (AdSA) através da Fiscalização, com toda a documentação demonstrativa das ações implementadas durante a execução da empreitada (registos da segurança e saúde no trabalho).

Compete a todos os intervenientes na execução da empreitada a todos os níveis e, em particular, ao Diretor Técnico da Empreitada, cumprir e garantir o cumprimento das determinações que constam deste PSS, sendo cada um responsável por informar o seu superior hierárquico, atendendo ao organograma funcional da empreitada, todas as situações anómalas que detete, assim como propor ações para a melhoria contínua do sistema de segurança e saúde preconizado neste PSS.

São destinatários do presente documento: a Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra, e o Empreiteiro, nas pessoas dos seus representantes para esta empreitada e bem assim o responsável pelo exercício da coordenação de segurança em obra. O representante do Empreiteiro obriga-se a disponibilizar este PSS no processo de consulta a todos os subempreiteiros e trabalhadores independentes nas partes que lhes diz respeito, as quais deverão ser referenciadas nos respetivos contratos e incluir cláusulas que obriguem cada um destes ao seu cumprimento e que assegurem a transmissão dessas cláusulas à sucessiva cadeia de subcontratação. A coordenação e controlo de todos os Subcontratados, compete ao Empreiteiro nos termos do art.º 16.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro.

O Empreiteiro deverá controlar, registar e manter permanentemente atualizada a ficha de distribuição do PSS utilizando para o efeito o modelo S01 apresentado no anexo I deste documento, anexando essas fichas no anexo 2 do presente documento. É proibida a distribuição deste PSS a entidades externas não intervenientes na presente empreitada, salvo autorização expressa por escrito para o efeito do representante do Dono da Obra.

O Representante da ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ, S.A. (AdSA)

Ass: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_  
(Gestor de Obra)



## ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ, S.A. (AdSA)

### INTERVENÇÕES URGENTES EM TRÊS CÂMARAS DA ATUAL ADUTORA ETA-MONTE CHÃOS - FASE I - INTERVENÇÃO NA CAIXA DE VALE MARIM

## Índice

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I - INTRODUÇÃO</b>                                                     | <b>7</b>  |
| 1.1 - Organização deste PSS                                               | 7         |
| 1.2 - Desenvolvimento / Complemento do PSS                                | 8         |
| 1.3 - Identificação dos Arquivos                                          | 9         |
| 1.4 - Alterações ao PSS                                                   | 10        |
| 1.5 - Entrega do Plano de Segurança e de Saúde                            | 10        |
| 1.6 - Organograma Funcional e Definição de Funções                        | 11        |
| 1.7 - Controlo de Assinaturas e Rubricas                                  | 12        |
| 1.8 - Plano de segurança e saúde para a execução da obra                  | 13        |
| <b>2 - MEMÓRIA DESCRITIVA</b>                                             | <b>15</b> |
| 2.1 - Política da Segurança e Saúde no Trabalho                           | 15        |
| 2.2 - Objetivos do PSS                                                    | 15        |
| 2.3 - Princípios de Atuação                                               | 15        |
| 2.4 - Comunicação Prévia e Declaração relativa a trabalhadores imigrantes | 16        |
| 2.5 - Legislação e Regulamentação Aplicável                               | 17        |
| 2.6 - Horário de Trabalho                                                 | 19        |
| 2.7 - Controlo de Subcontratados                                          | 20        |
| 2.8 - Seguros de Acidentes de Trabalho                                    | 21        |
| <b>3 - CARACTERIZAÇÃO DA EMPREITADA</b>                                   | <b>23</b> |
| 3.1 - Características Gerais da Empreitada                                | 23        |
| 3.2 - Mapa de Quantidades Trabalho                                        | 24        |
| 3.3 - Condicionamentos Existentes no Local                                | 25        |
| 3.4 - Plano de Trabalhos                                                  | 25        |
| 3.5 - Plano e Cronograma da Mão-de-obra                                   | 26        |
| 3.6 - Trabalhos com Riscos Especiais                                      | 26        |
| 3.7 - Materiais com Riscos Especiais                                      | 28        |
| 3.8 - Fases de Execução da Empreitada                                     | 29        |
| 3.9 - Processos Construtivos e Métodos de Trabalho                        | 30        |
| <b>4 - AÇÕES PARA A PREVENÇÃO DE RISCOS</b>                               | <b>31</b> |
| 4.1 - Projeto do Estaleiro                                                | 31        |
| 4.2 - Plano de Acesso, Circulação e Sinalização                           | 38        |
| 4.3 - Controlo de Equipamentos de Apoio e Acessórios                      | 40        |
| 4.4 - Planos de Proteções Coletivas                                       | 41        |
| 4.5 - Controlo de Receção de Materiais e Equipamentos                     | 43        |

---

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.6 - Planos e Registos de Monitorização e Prevenção.....                     | 44        |
| 4.7 - Registos de Não conformidade e Ações Corretivas e Preventivas .....     | 49        |
| 4.8 - Identificação e Controlo da Saúde dos Trabalhadores.....                | 52        |
| 4.9 - Plano de Proteções Individuais.....                                     | 54        |
| 4.10- Formação e Informação dos Trabalhadores.....                            | 56        |
| 4.11- Plano de Registo de Acidentes e Índices de Sinistralidade Laboral ..... | 59        |
| 4.12- Plano de Visitantes .....                                               | 63        |
| 4.13- Plano de Emergência .....                                               | 64        |
| 4.14- Planos de Cofragens e Betonagens .....                                  | 65        |
| 4.15- Planos de Montagem de Estruturas Metálicas .....                        | 65        |
| 4.16- Planos de Montagem, de Utilização e de Desmontagem de Andaimos .....    | 66        |
| 4.17- Planos de Montagem de Elementos Prefabricados .....                     | 66        |
| <b>5 - MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO .....</b>                               | <b>69</b> |
| 5.1 - Monitorização mensal.....                                               | 69        |
| 5.2 - Comissão de Segurança e Saúde da Obra.....                              | 69        |
| 5.3 - Auditorias e Inspeções.....                                             | 70        |

**ANEXOS** (Vd. lista no início dos anexos)

## I - Introdução

O presente Plano de Segurança e de Saúde (PSS) respeita à empreitada designada por “INTERVENÇÕES URGENTES EM TRÊS CÂMARAS DA ATUAL ADUTORA ETA-MONTE CHÃOS - FASE I - INTERVENÇÃO NA CAIXA DE VALE MARIM” que integra, nomeadamente, trabalhos referidos nas alíneas a), b), c), d), e), g), i) e j) do número 2 do Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro (adiante designado abreviadamente por DL 273), tendo sido preparado atendendo ao estipulado nos números 1 e 2 do Artigo 6.º do mesmo Decreto-Lei. Corresponde ao Plano a que se refere a alínea a) do número 1 da Cláusula n.º 6 do caderno de encargos relativo a contratos de empreitadas de obras públicas, aprovado pela Portaria 959/2009 de 21 de agosto (adiante designada abreviadamente por Portaria 959), devendo o empreiteiro desenvolvê-lo nos termos da alínea i) do número 4 da Cláusula 6.ª, da mesma Portaria.

De acordo com o acima citado Decreto-Lei n.º 273/2003, utilizam-se aqui as expressões abreviadas de Coordenador de Segurança em Projeto (CSP) e Coordenador de Segurança em Obra (CSO). Os responsáveis pelo exercício da coordenação de segurança em projeto e em obra são aqui referenciados pelas abreviaturas R-CSP e CSO, respetivamente.

Sempre que se faça referência ao Empreiteiro (significando a Entidade Executante na aceção do DL 273), à Fiscalização ou a qualquer dos acima referidos coordenadores de segurança, pretende-se significar os respetivos representantes para a presente empreitada.

Por outro lado, sempre que se faça referência a Subcontratados pretende-se significar todos os subempreiteiros, subcontratados de cedência de mão-de-obra ou de equipamento, trabalhadores independentes, prestadores de serviços e, nos casos aplicáveis, as respetivas sucessivas cadeias de subcontratação.

Salvo nos casos expressamente indicados, os prazos estabelecidos em dias neste documento referem-se a dias úteis, excluindo-se, portanto, Sábados, Domingos e Feriados, independentemente de o Empreiteiro estar autorizado a trabalhar nestes dias. Por outro lado, sempre que o início da contagem dos prazos indicados neste documento seja a data da consignação da empreitada, pretende significar-se esta ou, se aplicável, a data da primeira consignação parcial.

### I.1 - ORGANIZAÇÃO DESTES PSS

O presente PSS é constituído por um Documento Base e por um Apêndice que inclui um conjunto de anexos. O documento base corresponde ao presente PSS elaborado na fase de projeto e apresentado no processo de concurso pelo dono da obra. O Apêndice, a elaborar e manter pelo Empreiteiro Adjudicatário, corresponde ao desenvolvimento a que se refere a alínea i) do número 4 da Cláusula 6.ª do caderno de encargos relativo a contratos de empreitadas de obras públicas aprovado pela Portaria 959/2009 de 21 de agosto, assim como ao número 1 do Artigo 11.º do DL 273, o qual deverá incluir no mínimo todos os documentos referidos neste documento base.

O presente documento base está organizado nas seguintes em cinco secções: Introdução (secção 1); Memória Descritiva (secção 2); Caracterização da Empreitada (secção 3); Ações para a Prevenção de Riscos (secção 4); Monitorização e Acompanhamento (secção 5).

Inclui também um conjunto de modelos referidos ao longo deste PSS e que se apresentam no anexo I deste documento que o Empreiteiro poderá utilizar como referência para o desenvolvimento dos seus próprios modelos, os quais deverão ter no mínimo a informação contida nos modelos aqui apresentados incluindo as posições neles referidas para as assinaturas ou rubricas para demonstração das ações implementadas.

A referência em qualquer momento durante a execução da empreitada ao PSS, deve sempre entender-se como significando este documento base com todas as alterações, desenvolvimentos/complementos e registos integrados até esse momento no Apêndice.

Independentemente da inclusão deste PSS na fase de concurso, o empreiteiro deverá apresentar a declaração modelo S04 incluído no anexo I deste documento, integrando-a no anexo 2.

## **1.2 - DESENVOLVIMENTO / COMPLEMENTO DO PSS**

Este PSS foi elaborado de forma a ter um caráter dinâmico e evolutivo durante a execução dos trabalhos da empreitada, devendo integrar os projetos, planos e registos de todas as medidas implementadas no âmbito da segurança e saúde.

Assim, todos os desenvolvimentos / complementos devem considerar a inclusão / integração dos elementos preparados nos prazos estabelecidos. As adaptações / complementos serão sempre feitas atendendo aos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados na execução dos trabalhos pelo Empreiteiro, aos condicionalismos existentes, à organização do estaleiro e ao planeamento dos trabalhos. Os documentos a integrar deverão estar redigidos em língua portuguesa ou ser acompanhados de tradução legalizada.

Para a integração dos elementos que constituem os desenvolvimentos / complementos resultante da implementação do preconizado neste PSS, deverá o Empreiteiro constituir os anexos referidos no texto com uma numeração sequencial (cuja lista se apresenta no início do Apêndice a este PSS, e que poderá e deverá ser complementada com outros anexos a criar durante a execução dos trabalhos) e acrescentar outros que durante a execução da empreitada, o Empreiteiro, a Fiscalização ou o Coordenador de Segurança em Obra venha a considerar necessários.

O desenvolvimento / complemento deste PSS consiste assim essencialmente na preparação e integração de projetos, planos e procedimentos referidos neste documento e na realização de registos das ações implementadas, demonstrativas destas, que no seu conjunto serão incluídos nos anexos e que farão parte integrante do PSS. A manutenção atualizada da documentação do PSS é responsabilidade do Empreiteiro.

Sempre que o volume de documentos a integrar num dado anexo justifique a criação de um arquivo próprio (*dossier*), deve o Empreiteiro proceder à sua preparação, identificação e organização nos moldes previstos e registar o facto no respetivo anexo.

Todos os arquivos do âmbito do PSS deverão permanecer no estaleiro arrumados de modo organizado em estantes durante toda a fase de construção. Caso seja necessário utilizar documentos noutros locais devem ser efetuadas cópias.

## I.3 - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS

As lombadas das pastas de arquivo que sejam criadas no âmbito do *Plano de Segurança e Saúde* devem ser de cor a definir pela Fiscalização por solicitação do Empreiteiro e identificar objetivamente o seu conteúdo conforme seguidamente se exemplifica, apresentando-se também algumas regras para a identificação de documentos e arquivos.

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <hr/> <i>Símbolo e<br/>designação<br/>do Dono da Obra</i> <hr/> |
| <i>Designação da Empreitada</i> <hr/>                           |
| <i>Símbolo e<br/>designação<br/>do Empreiteiro</i> <hr/>        |
| <b>Plano de<br/>Segurança<br/>e Saúde</b> <hr/>                 |
| <b>Anexo N.º</b> <hr/>                                          |
| <i>Designação do anexo</i> <hr/>                                |

- Todos os documentos que devam ser assinados e/ou datados não poderão ser integrados neste Plano de Segurança e Saúde sem as correspondentes assinaturas e/ou datas respetivas.
- Todos os projetos, planos, procedimentos e registos deverão referenciar o Empreiteiro e a designação da empreitada.
- Cada projeto, plano ou registo pode ser composto por várias páginas, indicando-se o *Número de página / Total de páginas* do documento. Eventuais anexos dos documentos serão objeto do mesmo tipo de paginação.
- Em cada pasta de arquivo os documentos serão organizados de acordo com os sistemas de codificação dos elementos estabelecidos pelo Empreiteiro e por numeração sequencial no caso dos registos, atendendo às datas da sua realização.
- Em todas as pastas de arquivo ou secção das mesmas os documentos mais recentes são arquivados sobrepondo-se aos mais antigos (números maiores sobre os menores).
- Todos os documentos substituídos serão mantidos em arquivo devendo ser mencionado sobre os mesmos a data da substituição e a referência do documento que os substituiu.
- No início de cada pasta haverá um índice com o conteúdo da pasta. Quando estas forem organizadas por secções estará patente no início da pasta o índice das secções e dentro de cada secção, uma folha para averbamento do seu conteúdo.
- Nas pastas de registos existirá cópia atualizada do Controlo de Assinaturas e Rubricas, onde estarão identificadas todas as pessoas autorizadas a assinar documentos do âmbito do PSS (elementos do Empreiteiro e da Fiscalização).

## I.4 - ALTERAÇÕES AO PSS

Qualquer dos intervenientes na execução da empreitada pode propor à Fiscalização as alterações ao presente PSS elaborado na fase de Projeto.

O conteúdo do PSS elaborado na fase de Projeto (documento base), quando considerado desadequado, pode ser adaptado, sendo para tal obrigatória a identificação dos pontos alterados e a nova descrição, que tem que ser validada pelo R-CSO e aprovada pela Fiscalização e pelo representante do Dono da Obra.

As propostas de alterações a este PSS deverão ser apresentadas pelo Empreiteiro no prazo de 11 (onze) dias da data da consignação, utilizando para o efeito o modelo S02 apresentado no anexo I deste documento. Competirá ao Empreiteiro também solicitar aos seus subempreiteiros e trabalhadores independentes, até 5 (cinco) dias antes da entrada de cada um destes na obra, as eventuais propostas destes de soluções alternativas às previstas no PSS, utilizando para o efeito o mesmo modelo e processo de arquivo com indicação de quem solicitou.

Compete ao Empreiteiro elaborar e manter o *Registo das alterações aprovadas*, para o que utilizará o modelo Mod. S03 incluído no anexo I deste documento. Após aprovação de nova situação, o Empreiteiro deverá assinalar no original do PSS em sua posse, as zonas alteradas na margem da página por traço vermelho e inscrição do termo "Alterado" e respetiva data e número do *Registo de Alteração*.

O Empreiteiro incluirá no Anexo 4, os registos das propostas de alterações, incluindo as alterações aprovadas nos termos acima referidos.

## I.5 - ENTREGA DO PLANO DE SEGURANÇA E DE SAÚDE

Concluídos todos os trabalhos da empreitada, incluindo o comissionamento, o Empreiteiro entregará, no ato da Receção Provisória (ou da última receção provisória, se aplicável) à Fiscalização, e esta ao Dono da Obra, o PSS organizado nos termos previstos, ficando com uma cópia para ser utilizada caso haja lugar a trabalhos durante o prazo de garantia. Este facto será registado no Auto da Receção Provisória, anexando-se declaração, conforme o modelo S05 incluído no anexo I deste documento, devidamente preenchida e assinada por todos os elementos previstos. Deverá ser incluída uma cópia dessa declaração no início do PSS.

Caso haja lugar à execução de trabalhos durante o prazo de garantia, o Empreiteiro obriga-se a proceder à sua realização de acordo com o estipulado no PSS e a planear e implementar as medidas necessárias, bem como a promover a integração dos elementos desenvolvidos no PSS sempre que se justifique. No final desses trabalhos deverá entregar à Fiscalização os complementos ao PSS elaborados, incluindo registos para ser anexados ao PSS da empreitada em poder do Dono da Obra.

## I.6 - ORGANOGRAMA FUNCIONAL E DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES

O Empreiteiro estabelecerá objetivamente o organograma funcional nominal identificando os meios humanos afetos à empreitada, com indicação sobre este das respetivas percentagens de afetação à empreitada em causa ou inclusão de uma nota nesse organograma referindo que nos casos em que não se especifica a percentagem de afetação de qualquer pessoa incluída no mesmo, significa que se encontra afeta a tempo inteiro na presente empreitada.

Cabe ao Empreiteiro identificar e integrar no organograma os meios humanos afetos à gestão e controlo da segurança e saúde no trabalho, atendendo ao estabelecido no Caderno de Encargos, incluindo o responsável a que se refere o número 8 da Cláusula 42.<sup>a</sup> do caderno de encargos relativo a contratos de empreitadas de obras públicas aprovado pela Portaria 959, os representantes dos trabalhadores e os socorristas. No conjunto, devem ser identificadas todas as pessoas necessárias para preparar e organizar os documentos a desenvolver / complementar o Plano de Segurança e Saúde e acompanhar e garantir a sua implementação, incluindo todo o pessoal de enquadramento até pelo menos ao nível de chefe de equipa.

É competência do Diretor Técnico da Empreitada definir, por escrito, as funções que cada posição do citado organograma desempenha na empreitada, incluindo nestas as relativas à segurança e saúde no trabalho tendo em conta o estabelecido no caderno de encargos e neste PSS. Sem prejuízo das responsabilidades legalmente conferidas ao Diretor Técnico da Empreitada, este assegurará toda e qualquer função relacionada com a segurança e saúde no trabalho que não seja cometida a outrem.

Nas funções dos representantes dos trabalhadores, incluem-se nomeadamente a auscultação periódica de outros trabalhadores (em particular, de Subcontratados), verificando as condições em que estes tomam as suas refeições, condições de habitabilidade e higiene, existência de salários em dia e condições de segurança nos trabalhos que lhes foram atribuídos.

A direção da empreitada deverá promover a realização de visitas periódicas destes representantes pelas diferentes frentes de trabalho fornecendo-lhes os meios para tal.

Relativamente aos Socorristas, o Empreiteiro deverá assegurar a existência destes, em permanência, designadamente nas frentes de trabalho, os quais poderão ser trabalhadores da empreitada. A direção da empreitada deverá disponibilizar os meios necessários para que estes possam prestar primeiros socorros a eventuais acidentados, incluindo meios de contacto rápido para poderem ser chamados e para contactar as unidades de socorro necessárias em qualquer situação de emergência.

O número de Socorristas deverá ser tal que qualquer trabalhador possa ser assistido, em caso de acidente, por um destes profissionais em menos de 5 (cinco) minutos.

Os projetos, planos e procedimentos relativos à segurança e saúde no trabalho devem ser preparados e verificados por técnicos com formação na área da construção, de acordo com as respetivas especialidades. Quanto aos registos de verificação do preconizado nos projetos, planos e procedimentos devem ser efetuados pelos encarregados responsáveis por cada frente de trabalho.

Os responsáveis por cada atividade devem possuir formação e experiência adequada de forma a garantir o bom desempenho das funções atribuídas.

No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignação, o Empreiteiro apresentará à Fiscalização o citado organograma funcional. Caso algum dos elementos desse organograma seja diferente do

apresentado na proposta, deverá o empreiteiro apresentar, nos termos do caderno de encargos, o processo de pedido de autorização de substituição, incluindo o respetivo currículo.

Durante todo o período da obra, o Empreiteiro deverá afixar no estaleiro de apoio, em local bem visível, o organograma funcional em vigor.

O Empreiteiro arquivará no anexo 5, cópias dos organogramas funcionais datados e aprovados para a realização da empreitada e bem assim a definição de funções.

## 1.7 - CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS

Todas as pessoas com tarefas de preparação, atualização, controlo, verificação ou aprovação de quaisquer documentos relativos ou com influência na segurança e saúde no trabalho, nomeadamente projetos (pormenores de execução, estruturas provisórias, etc.), planos, procedimentos ou instruções de trabalho, registos comprovativos das ações implementadas, entre outros, devem ser identificadas na ficha de registo de Controlo de Assinaturas e Rubricas de acordo com o modelo S06 incluído no anexo I deste documento e que se apresenta a seguir.

Essa lista de assinaturas e rubricas deverá ser preparada pelo Empreiteiro até à data da consignação, devendo ser mantida atualizada por este durante toda a empreitada até à receção provisória da empreitada (ou última receção provisória parcial, se for o caso), sempre que entrem novas pessoas e/ou se verifiquem novas atribuições de competências às pessoas incluídas nessa lista.

[illegible]

A verificação dessa ficha deverá ser feita pelo Diretor Técnico da Empreitada, competindo à Fiscalização aprová-la, sendo que esta poderá determinar alterações nomeadamente quanto aos documentos que cada um poderá assinar. Os elementos da Fiscalização e o R-CSO serão também identificados em registo separado, utilizando o mesmo modelo, devendo o Empreiteiro solicitar àqueles o seu preenchimento e manter atualizado esse registo sempre que a Fiscalização indicar alterações ocorridas durante a execução da obra.

O Empreiteiro deverá arquivar no anexo 5, os citados registos de Controlo de Assinaturas e Rubricas.

## **1.8 - PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA**

No prazo de 5 (cinco) dias a contar da consignação, o Empreiteiro (Entidade Executante) deverá elaborar o plano de segurança e saúde para a execução da obra a que se refere o n.º 2 do artigo 11.º do DL 273 devendo seguir obrigatoriamente a estrutura estabelecida no anexo II e incluir os elementos referidos no anexo III, ambos desse Decreto-Lei. Esse plano deverá ainda integrar o Apêndice referido no ponto 1.1 da presente secção com todos os anexos previstos criar neste PSS (excluindo, portanto, o anexo I por se encontrar já integrado no presente documento). A integração desse Apêndice, que contém o desenvolvimento / complemento do PSS referido no ponto 2.2, pretende responder à exigência contida na parte final do n.º 1 do Art.º 12.º do DL 273.

Por outro lado, o Empreiteiro deverá solicitar mensalmente por escrito à Fiscalização nos primeiros 5 (cinco) dias úteis de cada mês o registo das atividades de coordenação a que se refere o n.º 5 do anexo III do acima citado Decreto-Lei, a fim de o integrar nesse plano de segurança e saúde para a execução da obra. A Fiscalização deverá entregar esse registo ao Empreiteiro no prazo de 5 (cinco) dias úteis após recebida a respetiva solicitação.

Este plano de segurança e saúde para a execução da obra deverá ser organizado e mantido atualizado pelo Empreiteiro, sendo que o Dono da Obra, a Fiscalização e o R-CSO têm direito de acesso ao mesmo sempre que entenderem, podendo solicitar cópias no todo ou em parte em qualquer momento.

Em caso de divergência entre o presente PSS elaborado na fase de projeto, e o plano de segurança e saúde para a execução da obra aqui referido, prevalecerá o estipulado no presente PSS, salvo no que tenha merecido aprovação escrita da Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra.



## 2 - Memória Descritiva

### 2.1 - POLÍTICA DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

O Diretor Técnico da Empreitada procederá, antes do início dos trabalhos, à definição da Política da Segurança no Trabalho para a empreitada, a qual será escrita em folha de papel timbrado da entidade Adjudicatária, na qual deve constar para além dos itens da referida Política, a designação da empreitada e o título “Política da Segurança e Saúde no Trabalho”. Essa política deve ter em conta os objetivos e princípios de atuação a seguir referidos, e ser assinada e datada pelo Diretor Técnico da Empreitada, ao qual cabe também assegurar a transmissão da referida Política a todos os trabalhadores da empreitada, incluindo os dos Subcontratados. Deverá ser afixada na vitrina do Estaleiro juntamente com outros documentos que se referem adiante.

O Empreiteiro incluirá no anexo 5, essa declaração da Política da Segurança e Saúde no Trabalho, incluindo documentos que evidenciem a sua divulgação (por exemplo, cartas de envio a Subcontratados).

### 2.2 - OBJETIVOS DO PSS

O presente *Plano de Segurança e Saúde* referente à empreitada designada por “*INTERVENÇÕES URGENTES EM TRÊS CÂMARAS DA ATUAL ADUTORA ETA-MONTE CHÃOS - FASE I - INTERVENÇÃO NA CAIXA DE VALE MARIM*” pretende responder ao exigido na legislação em vigor com o objetivo de:

- Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores da obra condições de segurança e saúde adequadas;
- Executar os trabalhos nos prazos adequados tendo em conta boas condições de segurança e saúde e os níveis de produtividade considerados no planeamento aprovado que deverá ser cumprido;
- Minimizar os índices de sinistralidade laboral e os custos sociais e económicos que resultam de acidentes de trabalho ou doenças profissionais;
- Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaço adequadamente organizado, seguro e ambientalmente de acordo com o PGA.

### 2.3 - PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO

O alcance dos objetivos mencionados deve basear-se num conjunto de princípios de atuação que deverão ser assumidos pela Direção Técnica da Empreitada perante o Dono da Obra e a Fiscalização, nomeadamente:

- reconhecer a segurança e saúde no trabalho como parte influente do desempenho e que é um investimento e não um custo;
- cumprir toda a legislação e regulamentação do âmbito da segurança e saúde no trabalho;
- ter presente e aplicar diariamente os princípios gerais de prevenção consignados na legislação geral sobre segurança e saúde no trabalho;
- identificar os riscos e planear as medidas preventivas necessárias, para todas as atividades com riscos associados;

- empregar materiais de acordo com as suas características técnicas e as instruções dos respetivos fabricantes, privilegiando os que são menos perigosos ou isentos de perigo;
- utilizar os equipamentos de apoio adequados aos fins para que foram concebidos, seguindo rigorosamente as instruções e assegurando as manutenções dos respetivos fabricantes;
- adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere à conceção dos postos de trabalho, bem como à escolha dos equipamentos de trabalho e dos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados na produção;
- dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às de proteção individual;
- registar as ações implementadas por forma a evidenciar a sua preparação e execução;
- reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverão ser envolvidos na implementação das medidas preventivas planeadas;
- incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua própria segurança e pela dos colegas que possam ser afetados pelas suas ações;
- encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situações de perigo que detetem, mesmo que estas não interfiram diretamente com a sua segurança;
- promover as ações necessárias dando instruções adequadas aos trabalhadores, para que seja compreendido por todos as ações a implementar e assim assegurar a segurança no trabalho;
- alocar todos os recursos humanos e materiais necessários à implementação das ações planeadas para garantir a segurança e saúde no trabalho, tendo em conta o estado de evolução da técnica.

## 2.4 - COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHADORES IMIGRANTES

De acordo com o artigo 15.º do DL 273, o Dono da Obra deve comunicar à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) a abertura do estaleiro, tendo em conta o estipulado nesse artigo quanto ao conteúdo e declarações anexas obrigatórias.

Para isso, o Empreiteiro deverá enviar à Fiscalização, no prazo estipulado no caderno de encargos, a informação referida neste relativamente à Comunicação Prévia (CP), juntamente com a declaração nele incluída, de acordo com o modelo apresentado no anexo I deste PSS.

No mesmo prazo deverá também apresentar a declaração relativa a eventuais trabalhadores imigrantes utilizando o modelo S07 incluído no anexo I deste PSS. O empreiteiro deverá também exigir declarações idênticas a todos os seus Subcontratados.

Sempre que posteriormente houver qualquer alteração dos elementos constantes da Comunicação Prévia de abertura do estaleiro (com exceção do ponto 15 desse modelo relativo aos subempreiteiros), o Empreiteiro informará, por escrito, a Fiscalização sobre as alterações ocorridas, no prazo de um dia a contar dessa ocorrência. Relativamente ao citado ponto 15 da CP, o Empreiteiro deverá enviar à Fiscalização, mensalmente até ao terceiro dia do mês seguinte, a lista de subempreiteiros selecionados de acordo com o anexo CPI do modelo de Comunicação Prévia apresentado no anexo I deste PSS.

É competência da Fiscalização participar ao Dono da Obra as informações transmitidas pelo Empreiteiro e fornecer cópia a este da CP e alterações enviadas pelo Dono da Obra à ACT.

Durante todo o período da empreitada, o Empreiteiro garantirá a afixação na vitrina referida no ponto relativo ao projeto do estaleiro adiante apresentado, de cópia da última Comunicação Prévia

enviada à ACT pelo Dono da Obra, incluindo todas as declarações anexas a esta e bem assim as declarações do Dono da Obra e dos coordenadores de segurança em projeto e em obra.

O Empreiteiro incluirá no anexo 3, todas as cópias da Comunicação Prévia, incluindo anexo que lhe diz respeito, e das suas alterações posteriores, e bem assim, as listas mensais de subempreiteiros acima referida, as informações de alteração fornecidas à Fiscalização e as declarações relativas a eventuais trabalhadores imigrantes passadas pelo Empreiteiro e Subcontratados.

## 2.5 - LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

Na empreitada designada por “INTERVENÇÕES URGENTES EM TRÊS CÂMARAS DA ATUAL ADUTORA ETA-MONTE CHÃOS - FASE I - INTERVENÇÃO NA CAIXA DE VALE MARIM” aplica-se toda a regulamentação de segurança e de saúde que se encontre em vigor, destacando-se nomeadamente a seguinte:

- Decreto-lei n.º 41821 de 11 de agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil - RSTCC).
- Decreto-lei n.º 46427 de 10 de julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalações Provisórias do pessoal Empregado nas Obras - RIPPEO).
- Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro (Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão).
- Decreto-Lei n.º 118/2019, de 21 de agosto (revoga o Decreto-Lei n.º 128/93, de 22 de abril - Assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento (UE) 2016/425, relativo aos equipamentos de proteção individual).
- Decreto-lei n.º 330/93 de 25 de setembro (Transpõe a Diretiva n.º 90/269/CEE de 29 de maio relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde na movimentação manual de cargas).
- Decreto-lei n.º 347/93 de 1 de outubro (Transpõe a Diretiva n.º 89/654/CEE de 30 de novembro relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para os locais de trabalho).
- Decreto-lei n.º 348/93 de 1 de outubro (Transpõe a Diretiva n.º 89/656/CEE de 30 de novembro relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde na utilização de equipamentos de proteção individual).
- Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro (Estabelece as normas técnicas de execução do Decreto-lei n.º 347/93 de 1 de outubro).
- Portaria n.º 988/93 de 6 de outubro (Estabelece a descrição técnica do equipamento de proteção individual, de acordo com o art.º 7º do Decreto-lei n.º 348/93 de 1 de outubro).
- Decreto-lei n.º 362/93 de 15 de outubro (Estabelece as regras relativas à informação estatística sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais).
- Portaria n.º 1131/93 de 4 de novembro (Estabelece as exigências essenciais relativas à saúde e segurança aplicáveis aos equipamentos de proteção individual, de acordo com o art.º 2º do Decreto-lei n.º 128/93 de 22 de abril).
- Decreto-lei n.º 48/95 de 15 de março (Código Penal - Art.ºs 277º a 280º).
- Decreto-lei n.º 141/95 de 14 de junho (Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 92/58/CEE de 24 de junho, relativa a prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no trabalho).

- Decreto-lei n.º 214/95 de 18 de agosto (Estabelece as condições de utilização e comercialização de máquinas usadas visando eliminar riscos para a saúde e segurança das pessoas).
- Portaria n.º 1456-A/95 de 11 de dezembro (Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde no trabalho).
- Portaria n.º 101/96 de 3 de abril (Regulamenta o Decreto-Lei n.º 155/95 de 1 de julho relativo às prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis, mantido em vigor pelo Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro).
- Portaria n.º 109/96 de 10 de abril (Altera os anexos I, II, IV e V da Portaria 1131/93 de 4 de novembro).
- Portaria n.º 695/97 de 19 de agosto (Altera os anexos I e V da Portaria 1131/93 de 4 de novembro).
- Decreto Regulamentar n.º 22-A/98 de 1 de outubro (Regulamento de Sinalização do Trânsito).
- Decreto-lei n.º 374/98 de 24 de novembro (Altera os Decretos-Lei n.º 128/93 de 22/4, n.º 383/93 de 18/11, n.º 130/92 de 6/6, n.º 117/88 de 12/4 e n.º 113/93 de 10/4, relativos a EPI e marcação CE).
- Decreto-lei n.º 159/99 de 11 de maio (Regulamenta a Lei n.º 100/97 de 13/9, no que respeita ao seguro de acidentes de trabalho para os trabalhadores independentes).
- Lei n.º 113/99 de 3 de agosto (Desenvolve e concretiza o regime geral das contraordenações laborais em certos setores de atividade).
- Lei n.º 118/99 de 11 de agosto (Desenvolve e concretiza o regime geral das contraordenações laborais, através da tipificação e classificação das contraordenações correspondentes à violação dos diplomas reguladores do regime geral dos contratos de trabalho).
- Portaria n.º 172/2000 de 23 de março (Definição das máquinas usadas que pela sua complexidade e características revistam especial perigosidade).
- Decreto-lei n.º 4/2001 de 10 de janeiro (Estabelece as condições de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território português - Vd em especial o artigo 144.º).
- Decreto-lei n.º 103/2008 de 24 de junho (Transpõe a designada Diretiva Máquinas - Estabelece as regras a que deve obedecer a colocação no mercado e a entrada em serviço das máquinas quase-máquinas e componentes de segurança colocados no mercado isoladamente).
- Decreto Regulamentar n.º 41/2002 de 20 de agosto (Altera o Decreto Regulamentar n.º 22-A/98 relativo ao Regulamento de Sinalização de Trânsito).
- Decreto-lei n.º 34/2003 de 25 de fevereiro (Altera alguns artigos do D. L. N.º 4/2001 de 10 de janeiro - Vd em especial a alteração do artigo 144.º).
- Decreto-lei n.º 273/2003 de 29 de outubro (Altera o D. L. N.º 155/95 de 1 de julho - Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 92/57/CEE de 24 de junho, relativa a prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis).
- Decreto-lei n.º 12/2004 de 9 de janeiro (Estabelece o regime jurídico de ingresso e permanência na atividade da construção).
- Decreto-Lei n.º 50/2005 de 25 de fevereiro (transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 89/655/CEE, do Conselho, de 30 de novembro, alterada pela Diretiva n.º 95/63/CE, do Conselho, de 5 de dezembro, e pela Diretiva n.º 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho).

- Decreto-lei n.º 182/2006 de 6 de setembro (Transpõe a Diretiva n.º 2003/10/CE de 6 de fevereiro relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devido ao ruído).
- Decreto-Lei n.º 221/2006 de 8 de novembro (Estabelece as regras em matéria de emissões sonoras relativas à colocação no mercado e entrada em serviço de equipamento para utilização no exterior).
- Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro (Aprova o Regulamento Geral do Ruído).
- Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro (Aprova a revisão do Código de Trabalho).
- Declaração de Retificação n.º 21/2009 de 18 de março (Retifica a Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro).
- Lei n.º 98/2009 de 4 de setembro (Regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais, nos termos do artigo 284.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro).
- Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro - Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho (revoga o Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de novembro, o Decreto-Lei n.º 26/94, de 1 de fevereiro, o Decreto-Lei n.º 29/2002, de 14 de fevereiro e a Portaria n.º 1179/95, de 26 de setembro).
- Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto - Aprova os regimes de acesso e de exercício das profissões de técnico superior de segurança no trabalho e de técnico de segurança no trabalho (revoga o Decreto-Lei n.º 110/2000, de 30 de junho e altera a Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro).

## Diversos:

- Contrato Coletivo de Trabalho Vertical aplicável às empresas que se dedicam à atividade da construção civil e obras públicas.
- Regulamento n.º 27/99-R de 8 de novembro de 1999 do Instituto de Seguros de Portugal (Apólice uniforme do seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores por conta de outrem).

Até 11 (onze) dias após a consignação, o Empreiteiro deverá organizar uma compilação (*dossier*) devidamente identificado, que contenha de forma organizada um índice do seu conteúdo e cópia da legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a acima referida, mantendo esta atualizada e permanentemente disponível no estaleiro da empreitada para consulta sempre que necessário.

## 2.6 - HORÁRIO DE TRABALHO

Antes do início dos trabalhos, o Empreiteiro deverá submeter à aprovação da Fiscalização o horário de trabalho que pretende utilizar no decurso da empreitada.

Nos termos da legislação em vigor e de acordo com o previsto no Caderno de Encargos, o Empreiteiro deverá patentear no estaleiro, durante todo o período de intervenção na obra, em local bem visível, o horário de trabalho em vigor enviado à ACT.

No estabelecimento do horário de trabalho deverá o Empreiteiro ter em conta o período do ano em que os trabalhos decorrem, não devendo em caso algum ser permitido o trabalho em locais com um nível de iluminação insuficiente. O Empreiteiro tomará todas as medidas necessárias para impedir a laboração fora do referido horário e/ou sem as condições acima referidas, relativamente a todos os trabalhadores da empreitada (incluindo os dos Subcontratados), sendo da sua inteira responsabilidade o não cumprimento de tal por qualquer dos seus trabalhadores presentes no estaleiro, incluindo os dos seus Subcontratados.

O Empreiteiro arquivará no anexo 6, cópia de todos os horários de trabalho utilizados na empreitada incluindo os comprovativos da sua entrega ou envio à ACT, notando sobre os mesmos os períodos de validade e os pedidos de realização de trabalho suplementar e respetivas autorizações devidamente assinadas pela Fiscalização.

Sem prejuízo de o Empreiteiro ter de organizar em arquivo separado o registo previsto no n.º 1 do Art.º 21.º do DL 273 e assegurar e controlar que cada empregador organize o registo previsto no n.º 2 dos mesmos artigo e Decreto-Lei, o Empreiteiro deverá também, atendendo ao art.º 16.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, efetuar o controlo de todos os Subcontratados que permaneçam no estaleiro mais de 24 (vinte e quatro) horas, registando e mantendo permanentemente atualizado esse controlo utilizando para o efeito o modelo SII incluído no anexo I deste PSS e que se apresenta a seguir.

O Empreiteiro deverá incluir em todos os subcontratos, cláusulas específicas sobre o presente plano de segurança e saúde, e todas as obrigações decorrentes deste relativamente aos Subcontratados. Deverá em particular fazer referência nesses subcontratos à apresentação de toda a documentação exigida neste PSS, nomeadamente, especificação do alvará do subempreiteiro, caso aplicável,

(número, categoria e subcategorias que interessam em função do tipo de intervenção), apólices de seguros de acidentes de trabalho de acordo com o referido a seguir, exames médicos de todos os trabalhadores, clarificação sobre a quem compete o fornecimento aos trabalhadores dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de uso permanente e os de uso temporário (em particular, quando se trate de subcontratados de cedência de mão-de-obra), etc..

Em anexo ao modelo acima referido deverá também o Empreiteiro juntar o organograma da cadeia de subcontratação num formato do tipo do indicado em anexo a esse modelo S11 e respetivos alvarás (de construção ou outros) ou títulos de registo.

Esses registos relativos ao modelo S11 e seus anexos, deverão ser arquivados no anexo 7 deste PSS.

## 2.8 - SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO

Antes de iniciados os trabalhos e atendendo à legislação aplicável e ao estipulado no Caderno de Encargos, o Empreiteiro comprovará à Fiscalização, a existência, a adequabilidade e a validade das apólices de seguro exigidos contratualmente, nomeadamente, os seguros de acidentes de trabalho que deverão ter cobertura para obras públicas e para o território onde se localiza a obra. Estas apólices deverão conter cláusula pela qual a entidade seguradora se compromete a mantê-la válida até à conclusão da empreitada ou até ao final previsto da intervenção nesta empreitada, caso se trate de Subcontratados, que permaneçam no estaleiro em apenas alguns períodos.

Caso as apólices de seguro de acidentes de trabalho sejam do tipo sem nomes, o Empreiteiro deverá assegurar o controlo e registo mensal das folhas de vencimentos apresentadas à segurança social e à entidade seguradora onde constem os trabalhadores afetos à empreitada em causa.

É responsabilidade do Empreiteiro verificar e garantir que todos os trabalhadores da empreitada, incluindo os dos seus Subcontratados, estão cobertos por seguros de acidentes de trabalho válidos e com as mesmas coberturas de acordo com o acima referido.

Relativamente aos Subcontratados, o Empreiteiro poderá apresentar, em alternativa às apólices, declarações emitidas pelas respetivas entidades seguradoras desde que estas possuam data não anterior a 6 (seis) meses em qualquer momento, estejam devidamente assinadas por pessoa da entidade seguradora cujo nome e cargo deverão ser explicitamente indicados e contenham toda a informação acima referida (tipo de seguro, validade, coberturas, etc.), incluindo a expressão no final “O signatário possui poderes bastantes para prestar esta declaração em nome de <<entidade seguradora>>”.

O Empreiteiro procederá ao controlo e registo das apólices de seguros de acidentes de trabalho pela utilização do modelo S12 incluído no anexo I deste PSS que se apresenta a seguir.

(\*) E = Empreiteiro; S = Subempreiteiro /Tarefeiro; TI = Trabalhador independente; (\*\*) PF-CN = Prémio fixo com nomes; PF-SN = Prémio Fixo sem nomes; PV = Prémio Variável

O Empreiteiro arquivará no anexo 8, toda a informação que comprove que todos os trabalhadores presentes no estaleiro estão cobertos por seguro de acidentes de trabalho válido, nomeadamente, os modelos acima referidos devidamente preenchidos, incluindo cópias das apólices (ou declarações acima referidas), os comprovativos de pagamento ou validade e, caso aplicável, as cópias das folhas de vencimentos acima referidas.

## 3 - Caracterização da empreitada

Na presente secção do PSS inclui-se uma caracterização genérica dos trabalhos da empreitada, identificam-se condicionantes e riscos especiais e registam-se algumas situações sobre a realização da empreitada.

Os elementos aqui incluídos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de preparação, planeamento e execução da empreitada, que deverão avaliar e implementar as medidas de prevenção consideradas necessárias e adequadas.

### 3.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA EMPREITADA

A Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos tem início na cisterna de água industrial da estação de tratamento (Nível máximo =  $\approx 74.0$  m e cota de soleira  $\approx 70.0$  m) e término na Casa de Águas (Nível máximo =  $\approx 59.0$  m e cota de soleira  $\approx 53$  m) do Reservatório de Monte Chãos.

A conduta é constituída por tubos de betão armado pré-esforçado longitudinalmente, cintados com espiras de aço. Os troços de tubo instalados em câmaras e túneis são em aço. Os equipamentos e acessórios mecânicos, nomeadamente, válvulas, ventosas, juntas de montagem, são em ferro fundido.

A conduta encontra-se em serviço contínuo desde 1980. O estado de conservação dos equipamentos mecânicos e acessórios metálicos em aço existentes, em câmara de válvulas, de descargas de fundo e de ventosas, bem como, em travessias, é deficiente, existindo reservas quanto à sua operacionalidade.

O estado de conservação da conduta em betão armado propriamente dita é desconhecida, não se conhecendo o seu real estado de conservação atual. Sabe-se apenas que a proteção catódica está fora de serviço há algum tempo, que justifica em parte o estado que as partes da tubagem em aço apresentam fugas sugerindo que a tubagem em betão armado também possa apresentar uma degradação anormal.

O projeto visa resolver os problemas das fugas na conduta adutora, que apresenta neste momento uma deficiência estrutural com perda de água, e possibilidade de colapso da conduta em três caixas.

Um colapso da infraestrutura corresponde a uma interrupção do fornecimento da água industrial ao Polo Industrial de Sines, e respetiva paragem das unidades industriais, onde se destaca a Petrogal, Repsol e Indorama, com consequências graves para a Águas de Santo André, S.A. (AdSA) e para o PIB do País.

A solução prevista pela AdSA passa por um reforço estrutural da infraestrutura existente (que deverá decorrer nos próximos anos), com a condicionante de que a conduta adutora não pode ser colocada fora de serviço, e está sujeita a uma pressão de serviço de 6 bar. Não sendo possível colocar a conduta fora de serviço, a execução dos trabalhos prevê medidas excecionais e o respetivo faseamento.

O projeto de execução para “Intervenções urgentes em três câmaras da atual Adutora ETA-Monte Chãos” consiste na definição de um projeto das intervenções urgentes a realizar em três câmaras da atual Adutora e ainda na definição de um plano de contingência para a atual caixa de Vale Marim.

A presente empreitada corresponde à Fase I – Intervenção na Caixa de Vale Marim.

Os trabalhos desta obra encontram-se devidamente especificados na memória descritiva do projeto de execução da presente empreitada, bem como no mapa de quantidades de trabalho.

A empreitada envolve a realização dos seguintes trabalhos:

- montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro;
- estudo e planificação da execução das obras e das montagens;
- piquetagem e implantação topográfica das obras;
- escoramentos e suportes que garantam a total estabilidade da câmara e dos acessos existentes, assim como a segurança de trabalhadores e equipamentos;
- desmatção, limpeza e regularização da zona de implantação das microestacas;
- execução dos movimentos de terra;
- execução das fundações indiretas, com recurso a microestacas;
- execução das demolições e aberturas indicadas, incluindo o transporte dos produtos sobrantes desde a origem até depósitos intermédios ou definitivos devidamente autorizados;
- remoção e transporte a operador licenciado dos produtos sobrantes das escavações, demolições e limpezas;
- execução das estruturas de betão armado previstas no projeto;
- trabalhos com perfis em aço;
- execução de revestimentos interiores, pinturas e impermeabilizações;
- fornecimento e montagem de tubagens e acessórios em aço para ventilação;
- fornecimento e montagem de juntas tipo Arpol;
- execução de telas finais.
- realização das Inspeções e Ensaios.

Consideram-se ainda fazendo parte integrante da presente empreitada, todos os trabalhos necessários para a correta execução das obras tal como definidas no projeto, ainda que não explicitamente referenciados na lista anterior.

## 3.2 - MAPA DE QUANTIDADES TRABALHO

Os trabalhos incluídos na presente empreitada são os que estão definidos no projeto e no Mapa de Quantidades de Trabalho (MQT) que serve de base ao concurso, onde se listam de uma forma organizada os tipos e principais características dos trabalhos a realizar constituindo uma boa ajuda para uma melhor perceção e identificação dos riscos envolvidos, e assim definirem-se os trabalhos que deverão merecer maior atenção nomeadamente para efeitos de preparação dos planos de monitorização e prevenção referidos na secção seguinte deste PSS.

O Empreiteiro, a Fiscalização e o R-CSO deverão efetuar a análise desse MQT e avaliar os trabalhos e materiais que oferecem maiores riscos, quer pela própria natureza, quer pelo efeito de repetitividade ou outro, em complemento do definido neste PSS.

### 3.3 - CONDICIONALISMOS EXISTENTES NO LOCAL

Sem prejuízo de outros que o Empreiteiro, a Fiscalização e o R-CSO deverão verificar, identificam se desde já como maiores condicionalismos existentes no local e no meio envolvente que, direta ou indiretamente, podem prejudicar ou condicionar os trabalhos no estaleiro, os seguintes:

- Infraestrutura existente em funcionamento;
- Proximidade de via rodoviária (EN 261-3);
- Passagem hidráulica;
- Declives do terreno;
- Redes técnicas (nomeadamente rede elétrica);
- Vegetação.

### 3.4 - PLANO DE TRABALHOS

É responsabilidade do Empreiteiro preparar e apresentar o Plano de Trabalhos para a empreitada, conforme previsto no Projeto de Execução e no Caderno de Encargos, no prazo aí indicado.

Nos períodos de maior concentração de trabalhos o risco de ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças profissionais é mais elevado. O Plano de Trabalhos deve ser preparado para que não sejam realizados simultaneamente trabalhos que se considerem incompatíveis ou que a sua execução em paralelo seja geradora de riscos acrescidos aos que estão associados à sua execução em separado.

Sem prejuízo do previsto no Projeto de Execução e no Caderno de Encargos, o Plano de Trabalhos deve ser submetido à apreciação da Fiscalização, não podendo o mesmo ser aprovado sem parecer favorável desta através da aposição de assinatura e data de aprovação.

O Plano de Trabalhos deve ser alterado / ajustado sempre que por questões de segurança e/ou saúde dos trabalhadores se considere justificável. A Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra pode solicitar ao Empreiteiro, sempre que entenda conveniente, as alterações e/ou ajustes ao Plano de Trabalhos que entenda necessárias, nomeadamente as que se justifiquem pela realização de trabalhos no âmbito de outras empreitadas da mesma obra ou empreendimento.

Sempre que se justifique, deverão ser elaborados planos parciais (mensais, quinzenais, semanais, ou outros períodos) que, extraídos do plano de trabalho geral, permitam uma pormenorização mais adequada para a sua realização e identificação e prevenção de riscos.

O Empreiteiro arquivará no anexo 10 todos os Planos de Trabalhos aprovados (incluindo os parciais) ou incluirá nesse anexo, uma referência do arquivo onde se encontram.

### 3.5 - PLANO E CRONOGRAMA DA MÃO-DE-OBRA

Conjuntamente com o Plano de Trabalhos, o Empreiteiro apresentará, atendendo ao previsto no Caderno de Encargos, o cronograma de mão-de-obra que indique por semana os valores previstos das cargas de mão-de-obra expressas em Pessoas (Plano de mão-de-obra) e Pessoas×hora (cronograma de mão-de-obra), assim como os valores acumulados.

O Plano de mão-de-obra deve ser apresentado em gráfico de barras verticais com escala à esquerda, sendo o comprimento das barras proporcional ao valor da carga de mão-de-obra da semana correspondente. O Cronograma de mão-de-obra deverá ser apresentado sobre o mesmo gráfico de barras, mas em gráfico de linha com escala à direita.

O planeamento dos trabalhos deve ser feito evitando, tanto quanto possível, grandes variações nas cargas de mão-de-obra. Os períodos a que correspondam maiores afetações de mão-de-obra devem ser objeto de análise e de um maior controlo de forma a garantir condições adequadas de segurança no trabalho.

A Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra poderá também solicitar ao Empreiteiro a elaboração de planos e cronogramas de mão-de-obra por categorias profissionais e/ou frentes de trabalho, devendo estes serem apresentados no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a solicitação.

Para além dos planos e cronogramas de mão-de-obra realizados com base no Plano de Trabalhos aprovado, o Empreiteiro registará e apresentará à Fiscalização mensalmente até ao último dia útil da semana seguinte, de modo equivalente e sobre aqueles planos e cronogramas, as cargas de mão-de-obra reais (Pessoas e Pessoas×hora) verificados nos meses anteriores em cor diferente do traçado correspondente ao previsto.

O Empreiteiro arquivará esses registos no anexo I0, conjuntamente com os planos de trabalhos.

### 3.6 - TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

A empreitada designada por “INTERVENÇÕES URGENTES EM TRÊS CÂMARAS DA ATUAL ADUTORA ETA-MONTE CHÃOS - FASE I - INTERVENÇÃO NA CAIXA DE VALE MARIM” inclui diversos trabalhos com riscos especiais para a segurança e saúde dos trabalhadores, particularmente os previstos nas alíneas a), b), e), i) e j) do Art.º 7.º do DL 273.

Sem prejuízo de outros que o Empreiteiro, a Fiscalização / Coordenador de Segurança da Obra venham a identificar, apresenta-se no quadro seguinte uma lista não exaustiva de trabalhos que envolvem riscos especiais para a segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo uma identificação destes e avaliação do nível de risco em causa (entendido como a probabilidade de ocorrência de um fator causador de danos para a saúde e considerando a severidade das suas consequências).

## LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

| LISTA NÃO EXAUSTIVA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |   |   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| N.º                                                   | Trabalhos                                             | Riscos potenciais                                                                                                                                                                                                                                            | Risco (*) |   |   |
|                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | B         | M | A |
| 1                                                     | Movimentação de Terras / Entivações                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soterramentos</li> <li>- Esmagamento</li> <li>- Lesões por interferência com redes técnicas (electrizações, etc.)</li> <li>- Queda de pessoas</li> <li>- Queda de materiais</li> <li>- Afogamento</li> </ul>        | X         | X | X |
| 2                                                     | Movimentação de Máquinas                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lesões sono traumáticas resultantes do ruído</li> <li>- Atropelamentos e capotamentos</li> <li>- Eletrocussão/Eletrização</li> <li>- Quedas</li> <li>- Incêndio</li> </ul>                                          |           | X | X |
| 3                                                     | Movimentação Manual de Cargas                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entorses e outras lesões músculo-esqueléticas</li> <li>- Queda de materiais</li> <li>- Esmagamentos</li> </ul>                                                                                                      |           | X | X |
| 4                                                     | Desmatações                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cortes</li> <li>- Projeções</li> <li>- Esmagamentos</li> </ul>                                                                                                                                                      |           | X | X |
| 5                                                     | Execução de Elementos em Betão Armado e Revestimentos | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silicoses</li> <li>- Riscos associados à armação de ferro (cortes, perfurações, esmagamentos, etc.)</li> <li>- Intoxicações pela via respiratória</li> </ul>                                                        |           | X | X |
| 6                                                     | Trabalhos em Altura                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Queda de pessoas</li> <li>- Queda de materiais</li> </ul>                                                                                                                                                           | X         |   | X |
| 7                                                     | Trabalhos de Montagem de Elementos Pré-fabricados     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entorses</li> <li>- Cortes e perfurações</li> <li>- Quedas</li> <li>- Esmagamentos/entalamentos</li> <li>- Lesões sono-traumáticas</li> <li>- Elettrização / Eletrocussão</li> </ul>                                | X         | X | X |
| 8                                                     | Trabalhos com Eletricidade                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elettrização/Eletrocussão</li> <li>- Queimaduras</li> <li>- Incêndio</li> </ul>                                                                                                                                     |           | X | X |
| 9                                                     | Demolição e Reconstrução de Pequenas Estruturas       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desabamentos de estruturas vizinhas</li> <li>- Esmagamentos</li> <li>- Quedas de materiais</li> <li>- Intoxicações, causadas nomeadamente pela projeção de materiais</li> </ul>                                     | X         | X | X |
| 10                                                    | Execução de Pinturas e Outros Revestimentos           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dermatoses</li> <li>- Intoxicações</li> <li>- Queimaduras</li> <li>- Quedas</li> <li>- Entorses</li> </ul>                                                                                                          |           | X | X |
| 11                                                    | Ensaio de Pressão de Condutas                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soterramentos</li> <li>- Afogamentos</li> <li>- Cortes e perfurações</li> <li>- Desabamentos de estruturas vizinhas</li> <li>- Quedas de materiais</li> <li>- Lesões várias resultantes de rebentamentos</li> </ul> | X         | X | X |
| 12                                                    | Desinfecção de Condutas - Cloro                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intoxicações pelas vias respiratórias</li> <li>- Irritações dos olhos, nariz e garganta</li> <li>- Incêndio.</li> </ul>                                                                                             |           | X | X |

| LISTA NÃO EXAUSTIVA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |   |   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| N.º                                                   | Trabalhos                       | Riscos potenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risco (*) |   |   |
|                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B         | M | A |
| 13                                                    | Trabalhos em espaços confinados | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deficiência de oxigénio</li> <li>- Exposição a agentes químicos (gases e vapores) e/ou biológicos</li> <li>- Exposição a agentes físicos (ruído, vibração, pressão, temperatura, humidade)</li> <li>- Explosão e incêndio, em condições especiais</li> <li>- Riscos combinados (ex. riscos elétricos)</li> </ul> | X         | X |   |

(\*) Avaliação dos riscos: **B** = Baixo, **M** = Médio, **A** = Alto

Como medidas para prevenir estes riscos especiais, preconiza-se a preparação para cada um desses trabalhos de planos de monitorização e prevenção (de acordo com o previsto na secção seguinte), os quais deverão ser elaborados pelo Empreiteiro tendo em conta o processo construtivo e métodos de trabalho que venha a empregar. Na elaboração desses planos, os riscos especiais acima identificados e bem assim o nível de avaliação associado, deverão ser tidos em conta na definição das medidas preventivas. A Fiscalização deverá aprovar esses planos antes de iniciados os respetivos trabalhos.

### 3.7 - MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

A utilização de materiais, produtos substâncias e preparações perigosas (genericamente aqui designados por materiais) deve ser objeto de uma adequada avaliação dos riscos e definidas as respetivas medidas preventivas.

A empreitada de “INTERVENÇÕES URGENTES EM TRÊS CÂMARAS DA ATUAL ADUTORA ETA-MONTE CHÃOS - FASE I - INTERVENÇÃO NA CAIXA DE VALE MARIM” inclui também materiais com riscos especiais para a segurança e saúde dos trabalhadores. Sem prejuízo de outros que o Empreiteiro, a Fiscalização / Coordenador de Segurança da Obra venha(m) a identificar, apresenta-se no quadro seguinte uma lista não exaustiva de materiais que envolvem riscos especiais para a segurança e saúde dos trabalhadores.

| LISTA NÃO EXAUSTIVA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS |                                                                                    |                                                                                                                                                                  |           |             |   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---|
| N.º                                                   | Materiais / Equipamentos                                                           | Riscos potenciais                                                                                                                                                | Risco (*) |             |   |
|                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                  | B         | M           | A |
| 1                                                     | Aços / Ferro Fundido (perfis, tubagem de ventilação, armaduras, serralharias, etc) | - Perfurações / Cortes                                                                                                                                           |           | X           |   |
| 2                                                     | Betões e Argamassas                                                                | - Dermatoses<br>- Efeitos sobre os olhos e mucosas, nomeadamente devido à projeção de materiais                                                                  |           | X           | X |
| 3                                                     | Aditivos para betões e argamassas                                                  | - Dermatoses                                                                                                                                                     |           | X           |   |
| 4                                                     | Cimento                                                                            | - Dermatoses<br>- Problemas respiratórios                                                                                                                        |           | X<br>X      |   |
| 5                                                     | Inertes e material para aterros                                                    | - Silicoses<br>- Inflamações dos olhos                                                                                                                           |           | X<br>X      |   |
| 6                                                     | Resinas Epoxídicas                                                                 | - Dermatoses<br>- Intoxicações respiratórias<br>- Inflamações nos olhos                                                                                          |           | X<br>X<br>X |   |
| 7                                                     | Tintas e revestimentos                                                             | - Efeitos alergizantes e/ou irritantes, para a pele e aparelho respiratório<br>- Ação irritante sobre as mucosas das vias respiratórias, conjuntiva ocular, etc. |           | X<br>X      |   |
| 8                                                     | Poeiras metálicas                                                                  | - Lesões nos órgãos viscerais<br>- Toxicidade (incluindo cancro e alterações do sistema nervoso central)                                                         | X         | X           |   |

(\*) Avaliação dos riscos: **B** = Baixo, **M** = Médio, **A** = Alto

Na execução dos trabalhos, nomeadamente na implantação da conduta adutora, prevê-se a interferência com as infraestruturas existentes das diferentes redes, as quais serão em parte mantidas enterradas e intactas. No entanto, quando se verificar que é necessário cortar ou mover algumas dessas tubagens, deverá proceder-se em conformidade com as regras de segurança para manuseamento das mesmas.

Para os materiais referidos e para todos os outros que o Empreiteiro, a Fiscalização / Coordenador de Segurança da Obra venham a identificar, o Empreiteiro definirá, atendendo às características dos materiais e aos processos de manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, integrando estas medidas nos respetivos planos de monitorização e prevenção adiante referidos.

Genericamente, para todos os materiais e equipamentos incorporáveis, o Empreiteiro terá em consideração as características dos mesmos e atenderá às indicações contidas nos rótulos das embalagens e nas respetivas fichas técnicas e fichas de segurança, que deverão sempre solicitar aos respetivos fabricantes ou fornecedores antes da receção dos materiais ou dos equipamentos no estaleiro.

Nota-se que não pode ser descurada a atenção a produtos perigosos de utilização indireta, como sejam os combustíveis, tanto no que se refere ao seu acondicionamento, como na sua utilização.

### 3.8 - FASES DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA

O Empreiteiro deverá planear os trabalhos da empreitada por forma a assegurar que a mesma seja executada em condições de segurança, para o que deve identificar previamente as fases de execução e as prioridades das mesmas, assim como as incompatibilidades de execução simultânea face aos riscos que daí decorrem.

Com a definição prévia das fases de execução da empreitada pretende-se identificar objetivamente, e eliminar os potenciais riscos resultantes de um incorreto planeamento dos trabalhos.

Todos os trabalhos, particularmente os previstos na subsecção acima relativa aos trabalhos com riscos especiais, devem ser planeados e executados para que o faseamento da execução dos mesmos não seja gerador de situações de risco potencial de acidentes de trabalho e/ou de situações desfavoráveis à saúde dos trabalhadores.

O Empreiteiro arquivará os documentos relativos à definição das fases de execução da empreitada no anexo 10.

### 3.9 - PROCESSOS CONSTRUTIVOS E MÉTODOS DE TRABALHO

O Empreiteiro antes da realização de qualquer trabalho, identificará os processos construtivos e métodos de trabalho que vai utilizar, os riscos associados e as medidas preventivas que prevê implementar.

Quando os processos construtivos e/ou métodos de trabalho a utilizar não sejam os tradicionais, apresentem níveis de complexidade não habitual ou de risco elevado, ou ainda quando a Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra solicitar, o Empreiteiro para além dos Planos de Monitorização e Prevenção (referidos na secção seguinte), preparará previamente *Instruções de Trabalho* (também designados por *procedimentos de trabalho* ou *procedimentos de execução*) que submeterá à aprovação da Fiscalização.

As *Instruções de Trabalho* são documentos que devem especificar para cada atividade o seu modo operativo, isto é o modo como é realizada, devendo conter no corpo do mesmo ou em anexo, sempre que necessário, fluxogramas do processo de execução com identificação dos pontos de controlo e ainda elementos desenhados esclarecedores desse processo de execução. Pretendem servir de base à identificação e avaliação de riscos envolvidos na sua execução e à definição das medidas preventivas a implementar para eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho e/ou doenças profissionais.

O Empreiteiro arquivará todas as *Instruções de Trabalho* preparadas no anexo 11.

## 4 - Ações para a prevenção de riscos

As ações a empreender na realização dos trabalhos da empreitada designada por “*INTERVENÇÕES URGENTES EM TRÊS CÂMARAS DA ATUAL ADUTORA ETA-MONTE CHÃOS - FASE I - INTERVENÇÃO NA CAIXA DE VALE MARIM*” para a prevenção de riscos devem ser objeto de planeamento prévio que resultará na preparação de um conjunto de projetos, planos e procedimentos relativos à segurança e saúde.

Nesta secção são definidas as regras / especificações a atender para essa preparação, que se considera necessário desenvolver e implementar na fase de execução da empreitada para a prevenção dos riscos associados à realização dos trabalhos.

### 4.1 - PROJETO DO ESTALEIRO

O Empreiteiro deverá elaborar o *Projeto do Estaleiro* atendendo ao previsto no Projeto de Execução e no Caderno de Encargos do qual este PSS faz parte integrante, apresentando-o para aprovação da Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra no prazo previsto no Caderno de Encargos.

Por Estaleiro entende-se os locais onde se efetuam os trabalhos de construção propriamente ditos, bem como os locais onde se desenvolvem atividades de apoio direto àqueles trabalhos.

Na elaboração desse Projeto deverá ser seguida a legislação e regulamentação específica aplicável, nomeadamente a indicada na secção 2, e no caso de o Estaleiro ocupar total ou parcialmente vias públicas, deverá também ser tido em conta o *Regulamento de Sinalização de Trânsito*, incluindo eventuais regulamentos municipais existentes que o Empreiteiro deverá verificar da sua existência.

Sem prejuízo da legislação e regulamentação aplicável que estabelecem valores limite inferiores ou superiores, o *Projeto do Estaleiro* tem que cumprir as regras indicadas neste PSS, assim como outras que a Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra determine.

O *Projeto do Estaleiro* deverá identificar e definir objetivamente através de peças escritas e desenhadas, a implantação e características das instalações de apoio à execução dos trabalhos incluindo os cálculos (estabilidade ou outros), quando necessário ou exigido pela Fiscalização, dos equipamentos de apoio fixos, das infraestruturas provisórias e de todos os outros elementos que as características dos trabalhos, os processos construtivos e métodos de trabalho a utilizar determinarem.

Devem ser identificados e definidos, todos os elementos necessários instalar e planear a sua organização e arrumação de forma a reduzir ao mínimo os percursos internos e otimizar a operacionalidade.

Sem prejuízo do regulamentado, o(s) *Projeto(s) do(s) Estaleiro(s)* deverá(ão) respeitar, quando aplicável, os aspetos a seguir referidos, considerando-se para todos os efeitos os respetivos custos de preparação e implementação incluídos no preço da proposta do empreiteiro.

Caso não seja possível garantir todas as características descritas em algum local da empreitada, a vedação poderá ser constituída por redes ou barreiras (metálicas, polietileno ou outras) de cor aberta (laranja, vermelho) com altura mínima de 1,00 m, não sendo permitido a utilização de “fitas” para este efeito e devendo as entradas nessas áreas ser devidamente protegidas e fechadas para

evitar o acesso de pessoas não autorizadas. Esse fecho deverá ser efetuado de forma a não permitir a sua abertura fácil, designadamente no final de cada dia de trabalho e dias de não laboração. Essa vedação deverá ainda ser reforçada nos pontos onde haja o risco de choque de veículos contra a mesma (designadamente, na proximidade de curvas). Esse reforço deverá ser constituído por elementos físicos com massa suficiente aos eventuais choques dos veículos (por exemplo, recorrendo a PMB - perfis móveis de betão, ou outros). Ao longo de toda a vedação deverá ser prevista sinalização adequada tendo em conta o plano de sinalização adiante referido.

### VEDAÇÕES

Nos termos da alínea i) do Art.º 20.º do DL 273, o Empreiteiro obriga-se a tomar as medidas necessárias para que o acesso a todas as áreas do Estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas, devendo para tal cumprir e fazer cumprir pelos seus Subcontratados com toda a legislação aplicável e no presente PSS, seguindo ainda as indicações que a Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra venham a determinar.

O *Projeto do Estaleiro* identificará a implantação das vedações e as respetivas características, tendo em conta que, sempre que possível, deverão impedir fisicamente a entrada de pessoas não autorizadas.

Sempre que o Estaleiro se situe numa área urbana onde haja circulação pedonal, as vedações devem ter pelo menos 2 (dois) metros de altura e serem constituídas por material opaco devidamente pintado à cor a indicar em cada caso pela Fiscalização por solicitação do Empreiteiro. Essas vedações deverão satisfazer eventuais regulamentos municipais aplicáveis, podendo ser dotadas de aberturas, com o objetivo de permitir aos transeuntes a observação da obra do exterior, as quais terão dimensão, espaçamento e localização adequadas para o efeito, e constituídas de forma a não apresentarem riscos de ferimentos para os transeuntes. Essas aberturas deverão ser aprovadas pela Fiscalização.

Tratando-se de trabalhos “lineares” (por exemplo, redes de águas, esgotos, elétricas, telecomunicações, etc.), onde haja ou se preveja circulação pedonal e/ou automóvel, a vedação poderá ser constituída por redes ou barreiras (metálicas, polietileno, ou outras) de cor aberta (laranja, vermelho) com altura mínima de 1,00 m, não sendo permitido a utilização de “fitas” para este efeito e devendo as entradas nessas áreas ser devidamente protegidas e fechadas para evitar o acesso de pessoas não autorizadas, quando tal for aplicável. Esse fecho deverá ser efetuado de forma a não permitir a sua abertura fácil, designadamente no final de cada dia de trabalho e dias de não laboração. Essa vedação deverá ainda ser reforçada nos pontos onde haja o risco de choque de veículos contra a mesma (designadamente, na proximidade de curvas). Esse reforço deverá ser constituído por elementos físicos com massa suficiente aos eventuais choques dos veículos (por exemplo, recorrendo a PMB - perfis móveis de betão, ou outros). Ao longo de toda a vedação deverá ser prevista sinalização adequada tendo em conta o plano de sinalização adiante referido.

Em qualquer dos casos, todas as entradas do Estaleiro deverão obrigatoriamente conter a sinalização de segurança de acordo com o Plano de Acesso, circulação e sinalização adiante referido. Sempre que estiverem abertas deverá existir no local, Guarda que proceda ao controlo das entradas, de forma a assegurar que o acesso ao Estaleiro seja reservado apenas a pessoas autorizadas.

## DORMITÓRIOS

Os dormitórios a instalar no Estaleiro, quando existentes, deverão dispor de meios de combate a incêndios adequados e em número suficiente, e respeitar as seguintes condições:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume mínimo                  | → 10 m <sup>3</sup> por ocupante                                                                                                                                                                                                                   |
| Pé-direito mínimo              | → 3 m, podendo o Empreiteiro propor e a Fiscalização aceitar outro pé-direito desde que satisfeitas as restantes condições.                                                                                                                        |
| Área mínima das janelas        | → 1/10 da área do pavimento, devendo permitir a sua abertura, dispor de estores e ter um raio livre mínimo no exterior de 2,00 m medido a partir do eixo de cada janela.                                                                           |
| Afastamento mínimo entre camas | → 1 m para camas simples e 1,5 m para beliches que não poderão ter mais de 2 camas, devendo o espaço livre acima de cada cama ser no mínimo de 1,00 m; ao nível do piso as camas deverão ter altura mínima de 0,50 m na parte superior do colchão. |

No interior dos compartimentos de dormitório não é permitido a existência de aparelhos elétricos de queima do ar, nomeadamente aquecedores, fogões, etc..

A utilização de contentores metálicos para dormitórios poderá vir a ser aceite pela Fiscalização desde que sejam garantidas adequadas condições de sombreamento pelo menos nos meses de março a setembro de cada ano.

Se na obra existir guarda permanente, deverá ser prevista uma construção para lhe servir exclusivamente de local de repouso, com uma área não inferior a 6 m<sup>2</sup> e com um pé-direito mínimo de 2,15 m.

## INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

O Empreiteiro deverá disponibilizar instalações sanitárias adequadas, separadas por sexos se necessário, devidamente resguardadas das vistas e mantidas permanentemente em bom estado de limpeza e arrumação.

Caso exista dormitório no Estaleiro, deverão prever-se instalações sanitárias em zona contígua aos mesmos, sendo obrigatório que o acesso dos dormitórios às instalações sanitárias contíguas seja feito através de zona coberta. Estas instalações sanitárias respeitarão as seguintes condições, considerando como ocupantes todos os trabalhadores deslocados que pernoitam no estaleiro:

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pé-direito mínimo                                             | → 2,60 m                                              |
| Lavatórios                                                    | → 1 unidade por 5 ocupantes                           |
| Chuveiros                                                     | → 1 unidade por 10 ocupantes (com água quente e fria) |
| Urinóis                                                       | → 1 unidade por 20 ocupantes                          |
| Retretes                                                      | → 1 unidade por 10 ocupantes                          |
| Altura mínima das divisórias entre chuveiros e entre retretes | → 1,70 m                                              |

No Estaleiro de apoio deverão ser previstas ainda instalações sanitárias com as mesmas características e elementos acima referidos, considerando uma relação de 1:20 trabalhadores em simultâneo no Estaleiro. Deverá ainda considerar-se vestiários com área mínima de 1,00 m<sup>2</sup> por cada 10 trabalhadores em

simultâneo no Estaleiro e de um cacifo por cada um desses trabalhadores. Na ausência de registo e justificação por parte do Empreiteiro do número de trabalhadores em simultâneo no Estaleiro, considerar-se-á o número máximo indicado na Comunicação Prévia, excluindo destes os ocupantes do dormitório registados.

Nas frentes de trabalho, o Empreiteiro terá que montar instalações sanitárias adequadas para utilização dos trabalhadores, podendo as mesmas ser amovíveis. Estas instalações sanitárias devem dispor de água permanente e no mínimo de retrete e lavatório (integradas ou em separado) em número proporcional ao acima referido para o Estaleiro de apoio. Devem ser localizadas para que a distância a pé entre os locais de trabalho e as instalações sanitárias seja no máximo de 5 minutos.

Para a Fiscalização, deverão ser consideradas instalações sanitárias separadas e em local a decidir por esta, com as características e elementos acima referidos na relação de 1:10 pessoas da Fiscalização em permanência na empreitada, com o mínimo de uma instalação sanitária reunindo essas condições.

### **REFEITÓRIO E COZINHA**

Todos os trabalhadores terão que dispor diariamente de condições para tomar as suas refeições, em locais e ambiente adequados, podendo adotar-se uma ou mais das seguintes soluções: proporcionar condições para os trabalhadores tomarem as suas refeições em restaurantes nas proximidades (1.<sup>a</sup> opção); instalar refeitórios e respetivas cozinhas (2.<sup>a</sup> opção); criar espaços para toma de refeições com condições adequadas (3.<sup>a</sup> opção).

O Empreiteiro deverá indicar e registar o número de trabalhadores para cada uma das opções adotadas de entre as acima indicadas (N1, N2 e N3, respetivamente para trabalhadores que tomam refeições em restaurantes, nos refeitórios do Estaleiro e outros espaços criados para o efeito), cobrindo o número máximo de trabalhadores indicados na Comunicação Prévia e tendo em conta as interrupções para refeições de acordo com o horário de trabalho aprovado e a simultaneidade de trabalhadores para tomarem as refeições (Ns). Na ausência de indicação do número indicado para Ns, ou não aceitação de justificação por parte da Fiscalização, considera-se Ns igual ao número máximo de trabalhadores indicado na Comunicação Prévia.

A criação de espaços para toma de refeições (3.<sup>a</sup> opção) poderá ser considerada apenas em casos devidamente justificados pelo Empreiteiro e aceites pela Fiscalização, designadamente, a pedido de grupos de trabalhadores apresentado por escrito pelos representantes dos trabalhadores na empreitada, ou quando a distância das frentes de trabalho aos refeitórios não permita dispor de no mínimo 30 minutos de permanência dos trabalhadores nestes, tendo em conta o período de descanso previsto no horário de trabalho para a refeição e a deslocação dos trabalhadores em viaturas a disponibilizar pelo Empreiteiro. A criação desses espaços será, contudo, obrigatória quando não for exigível a instalação de refeitórios de acordo com as condições a seguir referidas para estes.

Esses espaços para toma de refeições deverão ser sempre cobertos e, sempre que necessário, protegidos das intempéries pelo menos nos lados de ventos predominantes, designadamente nos em períodos de chuvas. Deverão dispor de mesas e assentos em número igual ao dos trabalhadores que em simultâneo os utilizam, e deverão ser dotados de condições e meios para os trabalhadores prepararem as suas refeições, designadamente água em quantidade suficiente.

A instalação de refeitórios e respetivas cozinhas é obrigatória sempre que  $(N_s - N_I - N_3) > 50$  trabalhadores, devendo estes ser cobertos e abrigados das intempéries, dotados de água potável e dispor de mesas e bancos em quantidade adequada ao número de trabalhadores que tomem as suas refeições em simultâneo. Junto aos refeitórios deverá existir uma zona de cozinhas com chaminés e pias com água potável em quantidade adequada ao número de trabalhadores, onde estes possam preparar e/ou apenas tomar as suas refeições. Tanto os refeitórios como as cozinhas, devem dispor de portas de abrir para o exterior e meios de combate a incêndios adequados e em número suficiente.

Os refeitórios e as cozinhas a instalar no Estaleiro respeitarão as seguintes condições, considerando como utilizadores todos os trabalhadores que tomam as suas refeições nos refeitórios:

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pé-direito mínimo               | → 2,60 m                                                                                                            |
| Lavatórios                      | → 1 unidade por 10 utilizadores                                                                                     |
| Urinóis                         | → 1 unidade por 20 utilizadores                                                                                     |
| Retretes                        | → 1 unidade por 20 utilizadores                                                                                     |
| Área mínima de portas e janelas | → 1/10 da área do pavimento com um raio livre mínimo no exterior de 2,00 m medido a partir do eixo de cada abertura |

As cozinhas deverão dispor de meios para preparação das refeições. Caso se instalem botijas de gás industrial estas devem ser localizadas no exterior em compartimento devidamente protegido e fechado (com chave) mas devidamente arejados, por exemplo, com portas de rede metálica. Quando estes compartimentos sejam construídos “colados” a outras instalações deverá interpor-se uma “barreira” constituída por material com massa adequada para absorver impactos resultantes de eventuais explosões. O Empreiteiro deverá ainda inspecionar estas instalações pelo menos mensalmente, registando o resultado de tais inspeções.

### ARMAZÉNS DE MATERIAIS

Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensão e/ou que possam deteriorar-se ao ar livre devem ser adequadamente organizados e arrumados em zonas de armazenamento fechadas. Os materiais perigosos devem ser separados dos restantes e devidamente resguardados e identificados. Poderão ainda ser consideradas áreas específicas para materiais e/ou equipamentos segregados

### FERRAMENTARIA

As ferramentas e equipamentos de pequena dimensão devem ser guardados diariamente em zonas destinadas para o efeito e devidamente fechadas.

## **ESTALEIRO DE PREPARAÇÃO DE ARMADURAS**

No Estaleiro de preparação de armaduras, caso exista, devem ser previstas áreas organizadas para: depósito dos varões de aço, organizado por baias para separação de varões por diâmetros; corte dos varões de aço; depósito de desperdícios; dobragem dos varões de aço; depósito de varões de aço dobrados; área de prefabrico de armaduras.

## **ESTALEIRO DE PREPARAÇÃO DE COFRAGENS**

No Estaleiro para preparação de cofragens, caso exista, devem ser previstas áreas organizadas para: depósito de materiais para cofragens; depósito de painéis de cofragem prefabricados; área para execução e reparação de cofragens; depósito de cofragens fabricadas; depósito para cofragens usadas.

## **PARQUES DE PREFABRICADOS E ELEMENTOS METÁLICOS**

No Estaleiro devem ser previstas áreas para colocação de prefabricados e elementos metálicos, as quais devem ser planeadas de forma que as peças prefabricadas e os elementos metálicos, sejam arrumadas por tipos. Essas áreas devem ser acessíveis aos veículos utilizados no seu transporte, carga e descarga.

Na área dos parques de prefabricados e elementos metálicos devem ser definidos caminhos de acesso de forma a possibilitar a carga e descarga de peças com segurança tendo em conta o referido no Plano de Acesso, Circulação e Sinalização adiante referido, devendo evitar-se grandes deslocções dos elementos prefabricados, principalmente os de maior dimensão.

Caso os mesmos sejam descarregados junto das áreas onde vão ser aplicados, a sua deposição não poderá ser feita próxima de valas ou cristas de taludes que apresente riscos de queda, soterramento ou interferência com as vias em exploração.

Na organização destes parques, o Empreiteiro deverá considerar áreas específicas para armazenamento de material rodoviário específico de separação (New Jersey/PMB, PMP) e de sinalização (sinais de trânsito).

## **PARQUE DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS**

No Estaleiro deverá, sempre que necessário, ser prevista área de parque de equipamentos móveis destinada a estacionamento de equipamentos de apoio sempre que não estejam a ser utilizados.

Caso seja montado no Estaleiro cisterna para combustível esta deverá ser montada junto ao parque de equipamentos e disporá de meios de combate a incêndios e sinalização adequada, incluindo a proibição de fumar e foguear.

O estacionamento de equipamentos em locais de resguardo não integrados no Estaleiro e pertencentes ao Dono da Obra requer a prévia autorização da Fiscalização e tem que ser sempre feita cumprindo todas as disposições regulamentares aplicáveis.

## **PARQUE DE VIATURAS DE PASSAGEIROS**

O parque para estacionamento de viaturas de passageiros, se existir, será separado do parque de equipamentos de apoio e deverá ser próximo da área social do Estaleiro e junto a um acesso.

## **PARQUES DE MATERIAIS**

Os materiais destinados a aplicação posterior deverão ser depositados em locais do Estaleiro devidamente arrumados e organizados tendo em conta as suas características e serão transportados para os locais de aplicação pelos meios mais adequados.

## REDE PROVISÓRIA DE ÁGUA

O Empreiteiro deverá elaborar o projeto da rede de água potável e respetivos pontos de abastecimento e de distribuição (incluindo cálculos tendo em conta as captações adequadas às necessidades, traçado, características da montagem, tipo de tubagem e acessórios), devendo ser acompanhado de uma memória descritiva e justificativa das soluções adotadas.

Caso o abastecimento seja feito a partir da rede pública, deverá ser objeto de pedido junto da entidade da área competente para o efeito. Em caso contrário, deverá assegurar o controlo mensal da potabilidade da água através das análises apropriadas realizadas de acordo com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de agosto efetuados por laboratório acreditado, registando e afixando os resultados dos mesmos. Sempre que aplicável, deverá ser afixado junto aos pontos de distribuição e de forma bem visível, informação indicando “Água imprópria para consumo”, sendo que nos balneários e cantina não poderá ser utilizada água imprópria para consumo.

O Empreiteiro tem que garantir que no Estaleiro de apoio e em todas as frentes de trabalho em laboração existe água potável em quantidade suficiente à disponibilidade dos trabalhadores.

## REDE PROVISÓRIA DE ESGOTOS

O Empreiteiro deverá elaborar o projeto do sistema de rede de águas residuais (incluindo cálculos tendo em conta as captações adequadas às necessidades, traçado, características da montagem, tipo de tubagem e acessórios) e respetivos pontos de destino, devendo ser acompanhado de uma memória descritiva e justificativa das soluções adotadas. Caso necessário, deverá obter a aprovação das entidades competentes.

## REDE PROVISÓRIA DE ELETRICIDADE

O Empreiteiro deverá elaborar o projeto das instalações elétricas (incluindo cálculos tendo em conta as necessidades, traçado, características da montagem - enterrado e/ou aéreo, tipo de rede e acessórios) e respetivos pontos de abastecimento e distribuição, devendo ser acompanhado de uma memória descritiva e justificativa das soluções adotadas. Deverá submeter esse projeto à aprovação das entidades competentes e à Fiscalização

Para os trabalhos que se realizarem em período noturno ou em áreas interiores sem iluminação natural suficiente, o projeto das instalações elétricas deverá definir qual o sistema de iluminação a utilizar nas frentes de trabalho e nos caminhos de acesso e circulação de viaturas e de trabalhadores, devendo ter em conta os valores mínimos de Níveis de Iluminação (NI) das diferentes áreas de trabalho indicados no quadro a seguir.

| <b>Espaços exteriores</b>        | <b>NI<br/>(lux)</b> | <b>Espaços interiores</b>                                | <b>NI<br/>(lux)</b> |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Áreas e vias de circulação       | 10                  | Vias de circulação                                       | 40                  |
| Áreas de realização de trabalhos | 40                  | Escadas e áreas de armazenagem                           | 60                  |
|                                  |                     | Áreas de trabalho em geral, vestiários, sanitários, etc. | 120                 |
|                                  |                     | Áreas fechadas afetadas a trabalho permanente            | 200                 |

O empreiteiro deverá efetuar o registo das medições efetuadas nas diferentes áreas de trabalho para comprovar os valores mínimos indicados, utilizando para o efeito um luxímetro calibrado.

## **VITRINA PARA AFIXAÇÃO DE INFORMAÇÃO**

O Empreiteiro deverá obrigatoriamente montar no Estaleiro pelo menos uma vitrina, em local bem visível e acessível a todos os trabalhadores, destinada a afixar documentação sobre segurança e saúde, nomeadamente, a exigida na legislação, neste PSS e no Caderno de Encargos.

## **LIMPEZA E RECOLHA DE LIXOS**

O Empreiteiro deverá dar especial atenção às condições de trabalho dos trabalhadores, prevendo os meios necessários para manutenção e conservação de todas as instalações sociais e para uma adequada limpeza de todas as zonas de passagem ou permanência dos trabalhadores, incluindo as áreas de trabalho.

Deverá também prever a recolha dos lixos em recipientes hermeticamente fechados e providenciar a sua remoção diária. A remoção deverá, sempre que possível, ser feita pelos serviços camarários devendo o Empreiteiro diligenciar, junto dos mesmos, tal serviço.

## **CIRCULAÇÕES INTERNAS**

O *Projeto de Estaleiro* integrará a definição dos caminhos de circulação internos, devendo ser considerado o faseamento dos trabalhos e a necessidade de acesso de viaturas pesadas.

## **ARQUIVO**

O Empreiteiro arquivará no anexo 12, os *Projetos de Estaleiro* e alterações que sejam efetuadas.

## **4.2 - PLANO DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO**

Nos termos da legislação em vigor devem adotar-se as medidas para garantir as condições de acesso, deslocação e circulação necessárias à segurança de todos os trabalhadores no Estaleiro, incluindo os elementos da Fiscalização e eventuais visitantes, e transeuntes nas imediações do Estaleiro tendo em conta a natureza, características, dimensão e localização do Estaleiro.

Conjuntamente com o *Projeto do Estaleiro*, o Empreiteiro deverá preparar esse *Plano de Acesso, Circulação e Sinalização* tendo em conta toda a legislação aplicável e as indicações a seguir referidas.

O *Plano de Acesso, Circulação e Sinalização* integrará plantas que identifiquem o Estaleiro (incluindo todas as áreas de trabalho), incluindo vias de acesso e outras vias rodoviárias, ferroviárias, caminhos pedonais, etc. que eventualmente existam na proximidade ou interferindo com o próprio Estaleiro.

Na preparação desse Plano deverá ser considerado o seguinte:

- Identificar todos os acessos ao Estaleiro (viaturas e pessoas);
- Tomar as medidas necessárias para que o acesso ao Estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas, não devendo ser permitido em caso algum o atravessamento do Estaleiro por pessoas estranhas à obra;
- Prever a colocação dos dispositivos necessários para garantir a segurança na entrada e saída de viaturas no Estaleiro;
- Na definição dos caminhos de circulação deve ser considerada a movimentação de todos os materiais e equipamentos utilizados no Estaleiro;
- Os caminhos de circulação de veículos pesados devem, antes de utilizados, ser regularizados e compactados de forma a possuírem a capacidade portante necessária, sem que apresentem deformações excessivas;

- Os caminhos de terra batida no tempo seco devem ser regularmente regados de forma a evitar o levantamento de pó, e no tempo de chuvas, devem ser espalhados materiais adequados para evitar a criação de lamas;
- Todas as entradas no Estaleiro têm que ser sinalizadas proibindo a entrada a pessoas estranhas à obra e indicação do Equipamento de Proteção Individual de utilização obrigatória dentro do Estaleiro (no mínimo, capacete e botas com palmilha e biqueira de aço);
- No Estaleiro a delimitação das áreas de circulação pedonal deverá ser feita, sempre que possível e necessário, através de redes de polietileno cor laranja com o mínimo de 1,00 m de altura, sendo que a utilização de “fitas” apenas poderão ser aplicadas quando expressamente autorizados pela Fiscalização;
- Tratando-se de trabalhos em, ou junto a, vias de circulação de viaturas automóveis, a delimitação poderá ser feita com as redes referidas no ponto anterior ou outro método equivalente, devendo no entanto recorrer-se a PMB (Perfis Móveis de Betão) ou PMP (Perfis Móveis de Plástico) cheios de água, caso haja o risco de proximidade e perigosidade de eventual contacto com trabalhadores (velocidade dos veículos, zona de curvas, etc.); a utilização dos designados *Flat Cones* apenas deverá ser admitida em zonas afastadas de circulação de viaturas ou de reduzida perigosidade de contacto com trabalhadores;
- Os caminhos pedonais externos devem ser identificados, protegidos e sinalizados de forma a proporcionar adequadas condições de segurança aos transeuntes.

A sinalização do Estaleiro deve identificar:

- Zonas perigosas ou interditas, com identificação dos perigos;
- A obrigação de uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), com os sinais apropriados;
- Caminhos pedonais para circulação de trabalhadores;
- Sinalização da localização dos meios de combate a incêndios;
- Localização das instalações do estaleiro de apoio.

A sinalização de zonas públicas terá que ser submetida à aprovação da Fiscalização e também à aprovação das entidades competentes para o efeito.

Sempre que as intervenções o justifiquem, deve ser preparado um plano de sinalização específico para o caso, definindo a sinalização necessária para garantir a segurança nos trabalhos a realizar. Estes planos de sinalização respeitarão a regulamentação aplicável, e serão sempre sujeitos a aprovação prévia da Fiscalização, nos termos definidos no Caderno de Encargos.

O *Plano de Acesso, Sinalização e Circulação* deve ser estabelecido tendo em conta, nomeadamente, o estipulado no *Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de junho*, relativo às prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no trabalho.

Os sinais de segurança e de saúde a empregar no Estaleiro devem ser os previstos na *Portaria 1456-A/95 de 11 de dezembro* e no *Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 10 de outubro*, devendo o Empreiteiro privilegiar a utilização de sinais que possuam marcação do fabricante (na frente ou no verso) contendo o nome do fabricante, o modelo e o ano de fabrico, e bem assim incluir no anexo abaixo referido a declaração de conformidade desses sinais com a legislação vigente ou, caso se trate de sinais não previstos na legislação, indicação das normas utilizadas. Essa declaração deverá ser passada pelo respetivo fabricante e conter em anexo o catálogo desses sinais onde se identifiquem os modelos aplicados.

Nos casos gerais, os sinais devem ser colocados à altura da visão, não devendo ser colocados mais do que (3) três sinais juntos.

O Empreiteiro arquivará no anexo 13, cópias de todos os elementos que constituem o *Plano de Acesso, Circulação e Sinalização*, exceto os Planos de Sinalização Temporária a que se refere o Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 10 de outubro, que deverão ser incluídos no anexo 14.

### 4.3 - CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO E ACESSÓRIOS

O empreiteiro deverá assegurar que todos os equipamentos de apoio existentes no estaleiro e acessórios não ligados ao equipamento estejam em bom estado de funcionamento, utilizando para o efeito o modelo S13 incluído no anexo I deste documento, que a seguir se apresenta.

[illegible]

Notas: (1) Placa de fabricante / identificação deverá incluir nome e endereço do fabricante, marca, modelo, n.º série e ano de fabrico; (2) Marcação CE no equipamento e possuir declaração CE de conformidade de acordo com D.L. 320/2001(Directiva Máquinas) e declaração CE de conformidade complementar de acordo com o D.L. 76/2002 (RES- Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no Exterior ), e ainda, nos casos aplicáveis, marcação no equipamento do nível de potência sonora garantida (Lwa) de acordo com este último DL; (3) Cumprimento da legislação aplicável a máquinas usadas (DL 214/95) e a equipamentos de trabalho (DL 50/2005).

Na utilização corrente desta ficha deverá ter-se em conta a legislação específica aplicável, nomeadamente a referida nas notas insertas na parte inferior dessa ficha. Importa ter em conta que a *Marcação CE* e a respetiva *Declaração CE de Conformidade* (Decreto-Lei n.º 103/2008 de 24 de junho) é exigível para os equipamentos e para acessórios não ligados ao equipamento (por exemplo, lingas) utilizados na construção. Porém, alguns equipamentos (designadamente, equipamentos móveis e de elevação de cargas como por exemplo gruas fixas ou móveis, elevadores de obra para pessoas, equipamento de terraplenagem, etc.) com data de fabrico anterior a 1999 (vd. Decreto-Lei n.º 214/95 de 18 de agosto e Portaria n.º 172/2000 de 23 de março) poderão não possuir as referidas marcação e declaração CE, devendo apresentar um certificado de conformidade passado por organismo competente notificado de acordo com a legislação em vigor.

Por outro lado, importa ter em conta que o Decreto-Lei n.º 221/2006 de 8 de novembro, que revoga o Decreto-Lei n.º 76/2002 de 26 de março (Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior), obriga também à existência de uma declaração CE de conformidade que contém outras indicações complementares à declaração atrás referida e bem assim a

indicação do nível de potência sonora garantido ( $L_{WA}$ ). Tal aplica-se a diversos equipamentos da construção incluindo gruas-torre, equipamentos de terraplenagens, martelos demolidores e perfuradores, compressores, etc..

Esse controlo deverá ser feito semanalmente se outra periodicidade não vier a ser definida pela Fiscalização por solicitação do Empreiteiro. Caso venham a ser definidas periodicidades diferentes para distintos equipamentos, deverão reunir-se na mesma ficha de controlo os equipamentos com as mesmas periodicidades, facilitando assim a utilização destas fichas e o respetivo controlo.

Todas as fichas deverão ser numeradas sequencialmente (1, 2, 3, ...) para cada empreitada (Posição indicada na ficha com *Número*), e arquivadas sobrepondo as mais recentes às mais antigas e assim o maior número corresponderá ao número de fichas preparadas para a empreitada em causa. Na posição indicada por *Número de página / Total de páginas* deverá inscrever-se, para cada uma das fichas, essas indicações e assim para uma ficha constituída por 2 páginas ter-se-ão as páginas 1/2 e 2/2.

Sempre que um equipamento não tenha a revisão em dia ou seja observado qualquer anomalia grave no todo ou em algum dos seus componentes que possa por em risco o operador desse equipamento e/ou outros trabalhadores, deverá o Empreiteiro tomar as medidas necessárias para evitar a utilização desse equipamento, através da sua imobilização, remoção do local de utilização, caso possível, ou colocação sobre esse equipamento em local bem visível, de um autocolante com a inscrição a vermelho de “AVARIADO” ou outra indicação equivalente. Nestes casos, deverá ser aberta uma ficha de não-conformidade, utilizando-se o modelo SI7 incluído no anexo I deste documento e inscrevendo-se o número dessa não conformidade na posição (Não Conf. N.º) prevista para o efeito na acima apresentada.

O Empreiteiro deverá explicitar na definição de funções que acompanha o organograma referido na secção I deste PSS, a responsabilidade por este *Controlo dos Equipamentos de Apoio*, que poderá ser o técnico do Empreiteiro Responsável pela Segurança e Saúde (ou pessoa com categoria profissional equivalente ou superior), ao qual cabe assegurar a realização do citado controlo geral que terá de incidir sobre todos os equipamentos que envolva riscos para os trabalhadores, incluindo acessórios não integrados naqueles (por exemplo, lingas).

É responsabilidade do Empreiteiro:

- Criar condições e incentivar os manobreadores/operadores dos equipamentos a zelarem pelo bom funcionamento destes e a comunicarem toda e qualquer anomalia que detetem;
- Proceder ao controlo de todos os equipamentos de Estaleiro (próprios e dos seus Subcontratados) com a periodicidade acima referida;
- Efetuar prontamente as correções das anomalias detetadas.

O Empreiteiro arquivará os Registos do Controlo dos Equipamentos de Apoio no anexo 15.

#### 4.4 - PLANOS DE PROTEÇÕES COLETIVAS

A Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, determina a necessidade de o empregador aplicar, entre outras, as medidas necessárias de proteção coletiva visando a redução de riscos profissionais. Nesse diploma legal prevê-se também como princípio de prevenção geral que o empregador deve dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às de proteção individual.

O *Plano de Proteções Coletivas* a desenvolver pelo Empreiteiro deverá definir objetivamente os equipamentos de proteção coletiva a empregar que deverão ser devidamente dimensionados e especificados, e identificar claramente os respetivos locais de implantação, em função dos riscos que os trabalhadores poderão estar expostos (risco de queda em altura, risco de queda de objetos, risco de eletrização / eletrocussão, risco de atropelamento, risco de afogamento, etc.). Os locais de implantação devem ser marcados sobre plantas do Estaleiro (incluindo áreas de trabalho), indicando-se ainda o tipo de proteção a utilizar em cada caso, incluindo, nos casos aplicáveis, as respetivas características técnicas e dimensionais, método de fixação, cálculos, processo de aplicação, etc..

Sem prejuízo de outras proteções que o Empreiteiro entenda necessário, ou que a Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra determine, na elaboração destes planos, o Empreiteiro deve atender ao seguinte:

- Montar, em todos os trabalhos junto a vias com circulação de viaturas motorizadas (ou junto de linhas férreas com comboios em circulação, se for o caso), vedações provisórias de resguardo entre áreas de trabalho e essas vias, devendo as referidas vedações ser constituídas por forma a estabelecer um impedimento físico adequado para impossibilitar a aproximação dos trabalhadores e máquinas a essas vias. Estas vedações têm que ser montadas afastadas o máximo possível das vias de circulação (e, no caso de linhas férreas, no mínimo 2,00 m do carril mais próximo) e serem constituídas, por exemplo, por redes de polietileno cor laranja com o mínimo de 1,00 metro de altura ou New Jerseys de betão, nos casos em que o risco de aproximação de veículos seja mais elevado.
- Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas adequadas, nomeadamente, guarda-corpos, etc..
- Todas as áreas com risco de queda de objetos para vias de circulação rodoviária ou pedonal devem ser protegidas com sistemas de proteção coletiva adequadas, através da utilização de redes de proteção com malha suficientemente fechada.
- Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos horizontais (barra superior a  $1,10 \pm 0,10$  metros acima da plataforma de trabalho, barra intermédia a meia altura  $\pm 0,05$  metros acima da mesma plataforma e rodapé com  $0,20 \pm 0,05$  metros de altura) e elementos verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser constituídos por material que resista a uma força horizontal de 1,50 kN/m, e os elementos verticais por material que resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os rodapés e os pavimentos respetivos não poderão existir folgas superiores a 0,05 m.
- As lingas para a movimentação de cargas deverão estar devidamente identificadas e documentadas com tipo (cordões de aço, correntes), características (simples, múltiplas), secção, capacidade de carga das lingas e dos anéis de ligação (no caso de lingas múltiplas), etc.. No caso de lingas múltiplas deverão os anéis onde se ligam estar devidamente marcados. Deverão ser selecionadas tendo em conta a capacidade de carga indicada pelo fabricante, devendo privilegiar-se os cabos de aço com laços executados com braçadeiras prensadas com marcação da carga visível. As lingas com laços executados com cerra-cabos apenas deverão ser utilizados quando se demonstre não ser possível utilizar as de laços com braçadeiras prensadas. As lingas não deverão ser utilizadas com ângulos superiores a 90°. Os ganchos onde as lingas irão ser utilizadas devem sempre dispor de patilha de segurança.

Os *Planos de Proteções Coletivas* devem ser suportados sempre que aplicável por elementos desenhados, designadamente relativamente ao local onde as proteções serão instaladas (sobre plantas do Estaleiro ou do projeto), incluindo tipo e características das mesmas. Estes Planos deverão ser mantidos atualizados competindo ao Empreiteiro proceder à sua revisão / atualização face à evolução dos trabalhos.

O Empreiteiro incluirá no anexo 16, os *Planos de Proteções Coletivas* preparados e implementados, devendo ser notado sobre os mesmos as fases a que cada um deles respeita.

#### 4.5 - CONTROLO DE RECEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais ou equipamentos com riscos envolvidos no seu manuseamento e/ou transporte deverão ser objeto de acompanhamento através da elaboração de uma ficha de Controlo de Receção na entrada no estaleiro, utilizando-se para o efeito o modelo SI4 incluído no anexo I deste documento que a seguir se apresenta.

Todas as fichas de Registo de Controlo de Receção de Materiais e Equipamentos deverão ser numeradas sequencialmente (Posição indicada na ficha com *Número*) e arquivadas sobrepondo as mais recentes às mais antigas. Na posição indicada por *Número de página / Total de páginas* deverá inscrever-se essas indicações para cada controlo efetuado.

[illegible]

O Empreiteiro deverá apresentar à Fiscalização até 5 (cinco) dias após a consignação da empreitada uma lista de materiais e equipamentos que serão objeto deste controlo, podendo a Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra determinar em qualquer momento a inclusão nessa lista de outros materiais ou equipamentos que o Empreiteiro deverá também controlar. Deverá também no prazo de 11 (onze) dias antes do fornecimento desses materiais ou equipamentos, apresentar à Fiscalização para aprovação a respetiva ficha de Controlo de Receção de Materiais e Equipamentos. Competirá à Fiscalização determinar os Pontos de Paragem (PP), caso em que no Registo de Controlo de Receção, o Empreiteiro deverá solicitar a presença da Fiscalização para proceder à verificação em causa, incluindo as condições de armazenamento.

Nessa lista incluem-se todos os materiais ou substâncias perigosos (combustíveis incluindo o equipamento de armazenamento destes, tintas e vernizes com riscos envolvidos na manipulação ou utilização, explosivos, etc.). Deverão ser delimitadas e organizadas zonas específicas de armazenamento para cada um desses casos incluindo a colocação de extintores em número e características adequados e sinalização de proibição de fumar ou foguear.

O Empreiteiro incluirá no anexo 17, a lista de materiais e equipamentos acima referida e as respetivas fichas de registo do Controlo de Receção.

#### 4.6 - PLANOS E REGISTOS DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO

Os Planos de Monitorização e Prevenção visam estabelecer para os elementos / operações de construção com riscos associados, as medidas preventivas a adotar face a esses riscos, assim como estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a execução das medidas previstas.

### **PLANOS DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO (PMP)**

Nestes Planos pretende-se identificar os riscos e planear as respetivas medidas preventivas associadas à execução de cada elemento / operação de construção. Para tal, deverá ser utilizado o modelo S15, incluído no anexo I deste documento, que a seguir se apresenta, ou outro que o Empreiteiro entenda propor e a Fiscalização aceite, desde que não diminua a informação referida neste modelo.

Todas as fichas deverão ser numeradas sequencialmente (1, 2, 3, ...) para cada empreitada (Posição indicada na ficha com *Número*), e arquivadas sobrepondo as mais recentes às mais antigas e assim o maior número corresponderá ao número de fichas preparadas para a empreitada em causa. Na posição indicada por *Número de página / Total de páginas* deverá inscrever-se, para cada uma das fichas, essas indicações e assim para uma ficha constituída por 2 páginas ter-se-ão as páginas 1/2 e 2/2.

[illegible]

Na utilização sistemática desta ficha, dever-se-á ter em conta o seguinte:

**Elemento / Operação de construção:** Descrição do elemento / operação de construção a que a ficha respeita.

**Código:** Código da ficha a que corresponde a operação / elemento de construção, conforme codificação refletindo a estrutura organizacional das operações e elementos de construção a definir pelo Empreiteiro.

**Verificações / tarefas:** Relação das verificações e/ou tarefas a realizar para controlar os riscos e respetivas medidas preventivas da operação ou elemento de construção a que a ficha se refere. O conjunto de verificações / tarefas deverá ser ordenado atendendo à sequência lógica de execução dos trabalhos e deverão conter, sempre que aplicável, valores quantificáveis que facilitem o processo de verificação.

**Riscos:** Nesta posição dever-se-ão identificar e descrever sucintamente os riscos correspondentes a cada verificação / tarefa listada na coluna anterior.

**Documentos de referência:** Para cada risco identificado na coluna anterior, registar-se-ão, sempre que aplicável, os documentos de apoio de cada verificação / tarefa listada, e que deverão ser tomados como referência para a definição das respetivas medidas corretivas / preventivas a considerar. Estes documentos podem ser regulamentos, normas (nacionais, europeias, internacionais), especificações técnicas (gerais ou referenciadas no Projeto), documentos de homologação, bibliografia técnica, entre outros, devendo indicar-se o artigo, cláusula, etc. do documento aplicável.

**Ações de corretivas / preventivas:** Registam-se nesta posição as respetivas ações ou medidas de prevenção e/ou proteção a aplicar, tendo em conta os documentos de referência aplicáveis a cada risco identificado. Essas medidas podem ser de proteção coletiva, individual ou outra, sendo que no que respeita às proteções coletivas dever-se-á indicar apenas aquelas que não constam do *Plano de Proteções Coletivas* atrás referido. Para cada risco poderão determinar-se várias ações de prevenção / proteção.

**Resp.:** Designação do responsável pela verificação em causa (em geral, o encarregado ou chefe de equipa da frente de trabalho). Em caso algum se deve indicar mais de um responsável pela mesma verificação.

**Frequência de inspeção:** Posição destinada ao registo da periodicidade com que deve ser efetuada cada verificação / tarefa e controlados os riscos e respetivas medidas preventivas que lhe estão associados.

**PP:** Nesta coluna da responsabilidade exclusiva da Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra deverá esta assinalar com uma cruz (x) se a verificação em causa, pela sua importância, deva constituir um *Ponto de Paragem* (PP) dos trabalhos. Nesses casos, os trabalhos só poderão ser retomados com a intervenção dos elementos indicados na definição de funções com qualificações e competência para avaliar e autorizar o prosseguimento dos mesmos, isto é, no Registo de Monitorização e Prevenção que a seguir se refere, para além do responsável pela verificação indicado deverá também assinar/rubricar este Registo outra pessoa do Empreiteiro, hierarquicamente superior, e bem assim a Fiscalização. As verificações não assinaladas como PP constituirão os designados Pontos de Verificação corrente.

**Preparado por:** Espaço destinado à rubrica e data do elemento do Empreiteiro responsável pela preparação da ficha em causa de acordo com a definição de funções.

**Verificado por:** Espaço destinado à rubrica e data do Diretor Técnico da Empreitada.

**Aprovado por:** Espaço destinado à rubrica e data da Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra.

Sempre que se justifique, dever-se-á elaborar uma *Instrução de Trabalho* e um fluxograma do processo operatório em causa (Vd. Processos Construtivos e Métodos de Trabalho).

Até 11 (onze) dias antes de iniciado qualquer *trabalho relevante*, deverá o Empreiteiro submeter à aprovação da Fiscalização o respetivo *Plano de Monitorização e Prevenção*.

Consideram-se *relevantes*, nomeadamente, os trabalhos identificados na lista não exaustiva incluída no anexo I deste documento, a qual deverá ser complementada ao longo da obra, quer por iniciativa do Empreiteiro, quer por determinação da Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra. Nenhum trabalho relevante deverá ser iniciado sem que esteja aprovada pela Fiscalização a respetiva ficha, sendo o Empreiteiro responsável por qualquer situação decorrente do início de qualquer trabalho relevante não aprovado.

O Empreiteiro deverá arquivar no anexo 18 essa lista de trabalhos relevantes devidamente numerada, complementando-a com outros de acordo com o referido, seguida de todas as fichas de *Planos de Monitorização e Prevenção* da empreitada devidamente elaboradas, assinadas e datadas.

## **REGISTO DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO (RMP)**

A implementação durante a execução dos trabalhos dos *Planos de Monitorização e Prevenção* é responsabilidade do Empreiteiro e traduz-se em evidenciar que as verificações previstas nesses Planos são efetuadas, devendo assim registarem-se as ações realizadas e respetivos resultados das inspeções, medições e ensaios efetuados no âmbito de cada verificação.

Tal registo poderá ser feito nos mesmos *Planos de Monitorização e Prevenção*, através de transformação dessas fichas para acomodar esses registos que o Empreiteiro poderá propor, ou utilizando o modelo SI6 incluído no anexo I deste documento, que a seguir se apresenta. A aceitação de proposta do Empreiteiro para a transformação das referidas fichas poderá vir a ser aceite pela Fiscalização caso não diminua a informação referida, quer na ficha relativa aos Planos de Monitorização e Prevenção (Modelo SI5), quer na de Registo de Monitorização e Prevenção (Modelo SI6).

[illegible]

<sup>(1)</sup> A definição dos Portos de Paragem é da competência da Fiscalização, caso em que esta tem que intervir obrigatoriamente no controlo

A preparação desta ficha de Registo para cada caso deverá ser efetuada pelo Empreiteiro em paralelo ou imediatamente após a aprovação do correspondente *Plano de Monitorização e Prevenção*, tendo em conta que as “verificações / tarefas” de um e outro deverão ser as mesmas, sem prejuízo de no Registo poderem ser adicionadas informações particulares relativamente a dada verificação/tarefa e dado elemento/operação de construção, caso em que esta ficha de Registo deverá também ser submetida à aprovação da Fiscalização em conjunto com o respetivo *Plano de Monitorização e Prevenção*.

Todas as fichas deverão ser numeradas sequencialmente (1, 2, 3, ...) para cada empreitada (Posição indicada na ficha com *Número*), e arquivadas sobrepondo as mais recentes às mais antigas e assim o maior número corresponderá ao número de fichas preparadas para a empreitada em causa. Na posição indicada por *Número de página / Total de páginas* deverá inscrever-se, para cada uma das fichas, essas indicações e assim para uma ficha constituída por 2 páginas ter-se-ão as páginas 1/2 e 2/2.

Na utilização sistemática desta ficha, dever-se-á ter em conta o seguinte:

**Elemento / Operação de construção:** Descrição do elemento / operação de construção a que o registo respeita. Deverá inscrever-se a mesma descrição que consta na correspondente ficha do *Plano de Monitorização e Prevenção*.

**Código:** Código da ficha a que corresponde o elemento / operação de construção a que respeita o registo, isto é, o mesmo do correspondente *Plano de Monitorização e Prevenção*.

**Localização / Atividade:** Espaço destinado a registar a localização do elemento / operação de construção a que o registo respeita. Tal indicação resulta do facto de um dado elemento ou operação construção poder repetir-se várias vezes numa empreitada, utilizando-se sempre o mesmo *Plano de Monitorização e Prevenção*. Porém, cada vez que esse elemento ou operação construção é executado deverá ser efetuado o correspondente *Registo de Monitorização e Prevenção* (por exemplo, na colocação de

tubagens por troços com as mesmas características, haverá em princípio apenas um *PMP* e tantos *RMP* quantos os troços).

**Verificações / tarefas:** Relação das verificações e/ou tarefas que constam da correspondente ficha do *Plano de Monitorização e Prevenção*.

**PP:** Coluna destinada a assinalar com uma cruz (×), as verificações / tarefas que constituem *Pontos de Paragem*, exigindo paragem do trabalho em causa e a intervenção adicional de outra pessoa do Empreiteiro e da Fiscalização, conforme definido nos respetivos *Planos de Monitorização e Prevenção*.

**Controlo do Empreiteiro:** Para cada verificação / tarefa deverá registar-se a sua conformidade ou não com as especificações constantes do respetivo *Plano de Monitorização e Prevenção*. No caso de ser observada uma conformidade, assinala-se essa situação com uma cruz (×) na coluna (*Conf.*). Caso contrário, inscreve-se o número da não conformidade na coluna “N.º NC”. Neste último caso será então aberta uma ficha de não conformidade seguindo-se o procedimento referido no ponto a seguir. Em qualquer dos casos, o responsável pelo controlo e verificação em causa deve assinar / rubricar na coluna reservada para o efeito e inscrever a data respetiva.

**Controlo da Fiscalização:** Sempre que a Fiscalização entenda poderá também registar as verificações / tarefas na coluna indicada para o efeito. Essas verificações / tarefas são obrigatórias quando se trate de uma posição assinalada com Ponto de Paragem (PP), devendo neste caso o Empreiteiro não prosseguir com o trabalho e solicitar a presença da Fiscalização. A forma de utilização desta coluna é em tudo idêntico ao descrito na posição anterior.

**Preparado por:** Espaço destinado à rubrica e data do elemento do Empreiteiro responsável pela preparação da ficha em causa de acordo com a definição de funções.

**Verificado por:** Espaço destinado à rubrica e data do Diretor Técnico da Empreitada, apenas no caso de esta ficha conter elementos não incluídos no correspondente *PMP*.

**Aprovado por:** Espaço destinado à rubrica e data da Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra, apenas no caso de esta ficha conter elementos não incluídos no correspondente *PMP*.

É responsabilidade do Empreiteiro:

- Proceder ao controlo conforme as verificações / tarefas previstas nos *Planos de Monitorização e Prevenção*. O controlo correspondente às verificações identificadas como Ponto de Paragem (PP) tem que ser objeto de reverificação por elemento do Empreiteiro com posição hierárquica superior ao responsável referido no referido *PMP*.
- Efetuar os registos das ações de controlo desenvolvidas.
- Registar todas as não conformidades que ocorram.

Cabe à Fiscalização a responsabilidade de acompanhar / certificar o cumprimento das ações desenvolvidas pelo Empreiteiro confirmando no mínimo as verificações identificadas como Pontos de Paragem (PP). A Fiscalização sempre que considere justificável, pode ordenar que o Empreiteiro proceda à elaboração de Registos de Não Conformidade. Em caso de dúvida, a Fiscalização poderá elaborar esses registos, obrigando-se o Empreiteiro a juntá-los ao processo e tomar as ações correspondentes.

Cada elemento ou operação de construção a controlar dará origem a tantas fichas quantas as vezes esse elemento ou operação de construção se repetir, podendo no entanto considerar-se grupos de

operações ou elementos de construção, quando executados em conjunto (por exemplo, colocação de tubagens por troços).

Os *Registos de Monitorização e Prevenção* deverão ser arquivados pelo Empreiteiro no anexo 19, organizado de acordo com o sistema de codificação dos elementos / operações de construção estabelecido pelo Empreiteiro e aceite pela Fiscalização.

#### **4.7 - REGISTOS DE NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS**

O Empreiteiro deverá registar como não conformidade todos os casos que apresentem gravidade significativa (requerendo ações corretivas / preventivas importantes), que embora de menor gravidade correspondam a uma situação de reincidência ou cujas correções não possam ser resolvidas de imediato.

Tais não conformidades deverão ser registadas em fichas de acordo com o modelo SI7, incluído no anexo I deste documento, que a seguir se apresenta, ou outro que o Empreiteiro entenda propor e a Fiscalização aceite, desde que não diminua a informação referida neste modelo.

Caso o Empreiteiro não registo uma não conformidade que no critério da Fiscalização / Coordenador de Segurança da Obra deva ser considerado como tal, esta deverá registar essa não conformidade obrigando-se o Empreiteiro a incluir no anexo de não conformidades adiante referido e a cumprir com a ordem dada. Nesta situação, a Fiscalização deverá levar essa situação para a reunião de obra que se lhe seguir, registando-se na respetiva ata as medidas tomadas para esclarecer e evitar situações similares.

Todas as fichas deverão ser numeradas sequencialmente (1, 2, 3, ...) para cada empreitada (Posição indicada na ficha com *Número*), e arquivadas sobrepondo as mais recentes às mais antigas e assim o maior número corresponderá ao número de fichas preparadas para a empreitada em causa. Na posição indicada por *Número de página / Total de páginas* deverá inscrever-se, para cada uma das fichas, essas indicações e assim para uma ficha constituída por 2 páginas ter-se-ão as páginas 1/2 e 2/2.

No caso das não conformidades levantadas pela Fiscalização deverá seguir-se o mesmo processo de numeração (iniciando em 1) para cada empreitada, adicionado “/F”, isto é, tratando-se por exemplo, da 3.<sup>a</sup> não conformidade levantada pela Fiscalização, na posição “Número” inscrever-se-á: “3/F”.

|                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>REGISTO DE NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS</b>                           |                                | Número<br>_____                                                                                                                                                                                                   | Página<br>____/____ |
| Empreitada:                                                                                    |                                | Código:                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Dono da Obra:                                                                                  | Fiscalização:                  |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Projectista:                                                                                   | Empreiteiro:                   |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Descrição da não conformidade:                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Localização:                                                                                   |                                | Documentos de referência:                                                                                                                                                                                         |                     |
| Descrito por: ____-____-____                                                                   | Verificado por: ____-____-____ |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Descrição das ações: <input type="checkbox"/> correctivas <input type="checkbox"/> preventivas |                                | <input type="checkbox"/> Aceite a ação proposta<br><input type="checkbox"/> Aceite nas condições em anexo<br><input type="checkbox"/> Rejeitado<br><input type="checkbox"/> _____<br>Corrigir até: ____-____-____ |                     |
| Proposto por: ____-____-____                                                                   | Verificado por: ____-____-____ | Decidido por: ____-____-____                                                                                                                                                                                      |                     |
| Execução das ações correctivas / preventivas:                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Executado por: ____-____-____                                                                  | Verificado por: ____-____-____ | Aprovado por: ____-____-____                                                                                                                                                                                      |                     |

Na utilização sistemática desta ficha, dever-se-á ter em conta o seguinte:

**Descrição da não conformidade:** Espaço destinado à descrição da não conformidade, que deverá ser sucinta, precisa e clara de forma a não haver dúvidas sobre a sua interpretação. Nesta posição inclui-se:

**Localização:** Espaço destinado a registar o local onde se verificou a não conformidade.

**Documentos de referência:** Espaço destinado a registar os documentos de referência infringidos e que deu origem à não conformidade (regulamento, caderno de encargos, PSS, projeto, etc.), devendo indicar-se o artigo, ponto ou elemento que não foi cumprido. Não sendo registado nenhum documento de referência considera-se tratar-se de uma oportunidade de melhoria do processo ou sistema.

**Descrito por:** Espaço destinado à rubrica e data do elemento do Empreiteiro ou da Fiscalização que levantou a não conformidade.

**Verificado por:** Espaço destinado à rubrica e data do elemento do Empreiteiro ou da Fiscalização que verificou a descrição da não conformidade, devendo ser pessoa hierarquicamente superior a quem a descreveu, exceto quando a não conformidade é levantada pelo Diretor Técnico da Empreitada ou pelo Chefe da Fiscalização.

**Descrição das ações corretivas e/ou preventivas:** Espaço destinado à descrição das ações corretivas e/ou preventivas a implementar para, respetivamente, corrigir a não conformidade, ou para prevenir a sua ocorrência. Nesta posição inclui-se:

**Proposto por:** Espaço destinado à rubrica e data do elemento do Empreiteiro ou da Fiscalização que propõe as ações corretivas e/ou preventivas.

**Verificado por:** Espaço destinado à rubrica e data do elemento do Empreiteiro ou da Fiscalização que verificou a proposta das ações corretivas e/ou preventivas a implementar, devendo ser pessoa hierarquicamente superior a quem a propõe, exceto quando a não conformidade é levantada pelo Diretor Técnico da Empreitada ou pelo Chefe da Fiscalização.

**Decidido por:** Espaço destinado à rubrica e data do elemento da Fiscalização que decide sobre as ações corretivas e/ou preventivas propostas pelo Empreiteiro. Neste processo de aprovação deverá assinalar-se uma das situações: aceite a ação proposta; aceite nas condições em anexo devidamente identificado (devendo anexar-se essas condições que passam a fazer parte integrante da não conformidade); rejeitado, caso em que se deverá abrir uma nova não conformidade seguindo a numeração existente, não se anulando a anterior. Deverá também indicar-se a data até à qual as ações descritas devem ser implementadas.

**Execução das ações corretivas e/ou preventivas:** Espaço destinado a confirmar a execução das ações realizadas. Nesta posição inclui-se:

**Executado por:** Espaço destinado à rubrica e data do elemento do Empreiteiro responsável pela execução das ações corretivas e/ou preventivas aprovadas.

**Verificado por:** Espaço destinado à rubrica e data do Diretor Técnico da Empreitada.

**Aprovado por:** Espaço destinado à rubrica e data da Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra.

É responsabilidade do Empreiteiro:

- Identificar e descrever as não conformidades;
- Propor e acordar com a Fiscalização as ações corretivas e/ou preventivas a implementar;
- Desenvolver dentro do prazo acordado as ações corretivas e/ou preventivas;
- Verificar a eficácia das ações corretivas e/ou preventivas;
- Analisar as causas das não conformidades e providenciar a implementação de ações para eliminar essas e/ou outras causas potenciais em futuros casos.

É responsabilidade da Fiscalização:

- Decidir sobre as ações corretivas e/ou preventivas a implementar e/ou determinar condições de aceitação ou outras ações em substituição ou suplementares das propostas. Quando justificável, a Fiscalização deverá comunicar ao Dono da Obra as ocorrências, que deverá pronunciar-se determinando as medidas que entenda adequadas.
- Verificar ações corretivas e/ou preventivas executadas;
- Analisar a eficácia das ações corretivas e/ou preventivas, designadamente, tratando-se de não conformidades de gravidade significativa.

Os Registos de Não conformidade e Ações Corretivas e Preventivas deverão ser arquivados pelo Empreiteiro no anexo 20, que deverá conter no início uma lista numerada com todas as não conformidades levantadas pelo próprio Empreiteiro (qualquer pessoa com funções para tal, desde o chefe de equipa até ao Diretor Técnico da Empreitada, passando por encarregados, técnicos de segurança do Empreiteiro, etc.). As não conformidades levantadas pela Fiscalização deverão também ser arquivadas no mesmo anexo, mas com separador identificando estas e contendo uma lista numerada de acordo com o acima referido.

### 4.8 - IDENTIFICAÇÃO E CONTROLO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES

#### **IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES**

É responsabilidade do Empreiteiro identificar todos os trabalhadores ao serviço da empreitada, incluindo os dos Subcontratados.

Todos os trabalhadores referidos terão que, antes de iniciarem funções, preencher uma ficha de identificação individual em modelo à escolha do Empreiteiro, a qual deve conter os principais dados de identificação pessoal, incluindo toda a informação referida no n.º 2 do Art.º 21.º do DL 273.

Tratando-se de trabalhadores estrangeiros, o Empreiteiro deverá assegurar-se ainda que estes possuem vistos de trabalho e autorização de residência ou permanência, identificando e registando também o (s) idioma(s) que falam e/ou escrevem.

#### **CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES**

O Empreiteiro deverá fornecer a cada trabalhador, um cartão de identificação contendo na frente deste no mínimo o seguinte: designação do empreiteiro, designação da empreitada de forma resumida, nome do trabalhador, profissão, empregador. No verso desse cartão deverá conter no mínimo os EPI de uso permanente (incluindo os inerentes à profissão de cada trabalhador) e telefones relevantes (Estaleiro de apoio, emergência, etc.).

#### **APTIDÃO FÍSICA E PSÍQUICA DOS TRABALHADORES**

Nos termos da legislação vigente constitui obrigação da entidade empregadora assegurar a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores em função dos riscos a que se encontram expostos, devendo para tal promover a realização de exames de saúde, tendo em vista verificar a aptidão física e psíquica dos trabalhadores, bem como a repercussão do trabalho e das suas condições na saúde do trabalhador.

É assim obrigação do Empreiteiro assegurar que cada trabalhador da empreitada possui essa aptidão física e psíquica para o exercício das suas funções. Na ficha individual de cada trabalhador atrás referida terá que ser notada a data do último exame médico a que o trabalhador foi sujeito e o resultado da inspeção médica (apto ou não apto), devendo ser anexada a cada ficha individual declaração assinada pelo Médico do Trabalho atestando a aptidão do trabalhador tendo em conta as funções que desempenha nesta empreitada e a data da próxima inspeção médica. Nos casos aplicáveis, essa declaração poderá incluir informação sobre a aptidão para apenas alguns trabalhos ou a execução destes em determinadas condições (por exemplo, em alturas não superiores a dado valor). Esta declaração do Médico do Trabalho para cada trabalhador poderá ser substituída pela lista de trabalhadores que a seguir se refere atestando em conjunto a respetiva aptidão sem condições e outras agregando os trabalhadores com aptidão mas com as mesmas restrições.

O Empreiteiro deverá também organizar uma lista com todos os trabalhadores da empreitada (incluindo os dos Subcontratados), constituída pelo menos pelas seguintes colunas de informação: número de ordem, nome do trabalhador, número do Bilhete de Identidade ou do Passaporte, número da segurança social, entidade empregadora e indicação se trata de trabalhador do empreiteiro, de subcontratado ou de trabalhador independente, categoria profissional, data da última inspeção médica, data da próxima inspeção médica. No final desta lista deverá ser declarado que todos os trabalhadores incluídos nesta estão aptos para as funções que lhes estão destinadas na presente empreitada (devendo indicar-se a designação desta). Todas as folhas desta lista deverão ser assinadas e datadas pelo Médico do Trabalho e pelo Diretor Técnico da Empreitada, ou no caso de se constituir um fascículo indecomponível poderão essas assinaturas ser feitas apenas na primeira página.

Os trabalhadores que sofram acidentes resultando em incapacidade temporária por um período superior a 30 dias seguidos devem, antes de regressar ao trabalho ser sujeitos a inspeção médica.

É responsabilidade do Empreiteiro proceder à verificação das fichas individuais de todos os trabalhadores na primeira semana de cada mês de forma a garantir que todos os trabalhadores têm as inspeções médicas válidas. Nenhum trabalhador poderá permanecer no Estaleiro sem a correspondente indicação de apto com ou sem condições.

No anexo 21 deve ser arquivada essa lista com todos os trabalhadores incluídos e contendo todos os dados mencionados e devidamente assinadas pelo Médico do Trabalho, podendo ser utilizado para efeitos de controlo o modelo S09 incluído no anexo I deste documento, que a seguir se apresenta dispensando indicações para a sua utilização, complementado com a outra documentação acima referida.

[illegible]

## 4.9 - PLANO DE PROTEÇÕES INDIVIDUAIS

Por Equipamento de Proteção Individual (EPI) entende-se qualquer equipamento ou seu acessório destinado a uso pessoal do trabalhador para proteção contra riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde no desempenho das tarefas que lhe estão atribuídas. O Decreto-Lei n.º 348/93 de 1 de outubro e a Portaria 988/93 de 6 de outubro, definem regras de utilização dos equipamentos de proteção individual.

Os EPI devem ser utilizados sempre que os riscos identificados não puderem ser evitados de forma satisfatória por meios técnicos de proteção coletiva ou por medidas, métodos ou processos de organização do trabalho. Os EPI devem ser utilizados também como medidas preventivas complementares de outras sempre que se considere justificável.

Na definição dos EPI que cada trabalhador deverá utilizar, deverão distinguir-se:

- EPI de uso permanente;
- EPI de uso temporário.

Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a permanência de qualquer trabalhador no Estaleiro, considerando-se no mínimo o capacete de proteção e botas com palmilha e biqueira de aço. Tratando-se de obras em ou na proximidade de vias públicas (rodoviárias, ferroviárias e outras) ou particulares (incluindo nestas últimas o próprio Estaleiro), considera-se também como de uso permanente mínimo o vestuário de alta visibilidade na cor laranja ou verde, conforme for definido pela Fiscalização a pedido do Empreiteiro.

Os segundos serão utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa que desempenha (por exemplo, uso de protetores auriculares quando em ambientes com elevada intensidade sonora) e dependendo das condições de trabalho excecionais a que este possa vir a estar sujeito (por exemplo, uso de arneses de segurança na execução de trabalhos em altura em complemento de outras medidas de proteção coletiva).

O Empreiteiro registará a distribuição dos EPI a todos os trabalhadores da empreitada, incluindo os dos Subcontratados. Para tal utilizará o modelo S10 incluído no anexo I deste documento que se apresenta a seguir em formato reduzido e dispensando indicações dada a fácil utilização.

|                                                                                                                 |                                                      |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                 | <b>DISTRIBUIÇÃO DE EPI e INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS</b> | Número: _____    | Pág.: _____ |
| Dono da Obra: _____<br>Empreitada: _____<br>Empreiteiro: _____                                                  |                                                      |                  |             |
| <b>Nome do Trabalhador</b>                                                                                      |                                                      | <b>Categoria</b> | <b>N.º</b>  |
| (Tratando-se de trabalhador independente assinalar aqui <input type="checkbox"/> )                              |                                                      |                  |             |
| Empregador: <input type="checkbox"/> Empreiteiro <input type="checkbox"/> Outro, incl. Trab. Ind. (Nome: _____) |                                                      |                  |             |

| Ref.* | Designação do EPI | Riscos (1) | Recepção (2)                        | Devolução final (3)                 |
|-------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                   |            | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ |
|       |                   |            | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ |
|       |                   |            | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ |
|       |                   |            | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ |

(1) Indicar códigos de acordo com a tabela abaixo      (2) Data e assinatura do trabalhador      (3) Data e assinatura de quem recebe

| <b>RISCOS A PROTEGER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – Quedas em altura<br>2 – Quedas ao mesmo nível<br>3 – Queda de objectos<br>4 – Queda por escorregamento<br>5 – Objectos pontiagudos ou cortantes<br>6 – Esmagamento do pé<br>7 – Torção do pé<br>8 – Choque ao nível dos maleiros<br>9 – Choque ao nível do metatarso<br>10 – Choque ao nível da perna | 11 – Pancadas na cabeça<br>12 – Cortes<br>13 – Estilhaços<br>14 – Entalamentos<br>15 – Electrocussão<br>16 –<br>17 –<br>18 –<br>19 –<br>20 – |

**DECLARAÇÃO**

Declaro que recebi os Equipamentos de Protecção Individual (EPI) acima mencionados e que fui informado dos respectivos riscos que pretendem proteger, comprometendo-me a utilizá-los correctamente de acordo com as instruções recebidas, a conservá-los e mantê-los em bom estado, e a participar ao meu superior hierárquico todas as avarias ou deficiências de que tenha conhecimento.

Mais declaro que fui informado estar coberto por seguro de acidentes de trabalho através da apólice n.º \_\_\_\_\_ da Companhia de Seguros \_\_\_\_\_ em nome de \_\_\_\_\_.

Trabalhador Ass.: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

|                                                                             |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável do Empreiteiro pela SST<br><br>Data: ____/____/____ Ass.: _____ | Director Técnico da Empreitada / Obra<br><br>Data: ____/____/____ Ass.: _____ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Na utilização corrente desta ficha, dever-se-á ter em conta o seguinte:

- Antes da utilização de qualquer EPI, a direção técnica da empreitada terá que assegurar que são transmitidas ao trabalhador que vai utilizar o EPI todas as instruções necessárias para o correto uso do equipamento e os riscos que esses EPI pretendem proteger face às tarefas que cada trabalhador irá desempenhar. Ao trabalhador caberá a responsabilidade de respeitar as instruções de utilização e participar todas as anomalias ou defeitos que detete no equipamento.

- No ato da entrega de Equipamentos de Proteção Individual, cada trabalhador deverá assinar a sua receção, competindo ao empregador, nos termos da legislação em vigor, informar aquele dos riscos que cada EPI visa proteger. Nesse ato o trabalhador deverá também tomar conhecimento das suas obrigações assinando a declaração que consta nas fichas de Distribuição de EPI e Informação sobre Riscos.

Os registos de Distribuição de EPI e Informação sobre Riscos deverão ser arquivados pelo Empreiteiro no anexo 22.

## CONTROLO DE ALCOOLEMIA

O Empreiteiro deverá organizar um Procedimento sobre o controlo de alcoolemia e submetê-lo à aprovação da Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra no prazo de 11 dias a contar da data de consignação. Nesse Procedimento o Empreiteiro deverá estabelecer: o responsável pela realização do controlo de alcoolemia através de exame de pesquisa de álcool no ar expirado; a periodicidade de realização deste controlo de forma a abranger todos os trabalhadores na empreitada sendo que cada trabalhador deverá ser sujeito a esse controlo no mínimo trimestralmente; as ações de informação e de sensibilização que deverão preceder o referido controlo de alcoolemia; a taxa de alcoolemia que determinará a suspensão de prestação do trabalho na empreitada, a qual não poderá ser superior a 0,50 g/l (gramas por litro); a forma de registo dos resultados do controlo; e bem assim outros elementos que o Empreiteiro, a Fiscalização / Coordenador de Segurança na Obra considerarem necessários.

Os resultados do controlo de alcoolemia deverão ser arquivados pelo Empreiteiro no mesmo anexo 22.

## CAPACETES DE PROTEÇÃO

Para permitir a identificação de cada trabalhador em função da sua categoria profissional, o Empreiteiro utilizará na obra o sistema de cores de capacetes que se indica no quadro a seguir, podendo propor à Fiscalização outro sistema no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de consignação. Na frente do capacete deverá ser aposto por colagem adequada (impermeável) a identificação da entidade empregadora.

Tratando-se de trabalhos que envolvam o risco de queda em altura de mais de 10 (dez) metros de qualquer trabalhador e em qualquer ponto do local de trabalho, os capacetes deverão dispor de francalete competindo ao empreiteiro instruir todos os trabalhadores para a sua utilização permanente sempre que estejam nesses locais de trabalho.

| CORES DE CAPACETES | CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Branco             | Fiscalização, Direção Técnica, encarregados; arvorados; capatazes; visitantes |
| Verde              | Pedreiros, montadores de tubagens, canalizadores                              |
| Vermelho           | Carpinteiros; montadores de cofragens                                         |
| Castanho           | Armadores de ferro                                                            |
| Azul               | Eletricistas                                                                  |
| Amarelo            | Serventes; auxiliares; aprendizes; praticantes                                |
| Laranja            | Condutores manobreadores                                                      |
| Cinzentos          | Apontadores; controladores; medidores; ferramenteiros                         |

## 4.10 - FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS TRABALHADORES

Nos termos da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, constitui obrigação do empregador assegurar a formação e informação dos trabalhadores tendo em conta as funções que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.

Atendendo às características dos trabalhos a realizar, ao prazo de execução da empreitada, às condicionantes existentes e aos processos construtivos e métodos de trabalho, o Empreiteiro deverá preparar até 11 (onze) dias após a data da consignação, um *Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores*.

O *Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores* poderá incluir ações de diversos tipos, nomeadamente:

- ações de sensibilização da generalidade dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho, tendo em conta a eventual existência de trabalhadores imigrantes e respetivos idiomas;
- afixação de informações gerais sobre a segurança e saúde no trabalho, realçando aspetos essenciais;
- incluir a calendarização de reuniões periódicas por grupos de trabalhadores, em função dos trabalhos específicos de cada equipa e/ou tendo em conta a eventual existência de trabalhadores imigrantes e respetivos idiomas;
- proporcionar formação adequada a trabalhadores com tarefas específicas no âmbito da segurança e saúde, como: técnico de segurança, socorrista, representantes dos trabalhadores, equipas específicas

afetas à execução de equipamentos de proteção coletiva (guarda-corpos, redes de proteção, etc.), entre outros.

Todas as ações do âmbito da Formação e Informação dos Trabalhadores devem ser registadas, incluindo nomeadamente, registos de presenças, tema abordado, duração, número e grupo de trabalhadores envolvidos, idioma da ação, etc..

## **AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO**

As ações de sensibilização deverão ter lugar: num dos primeiros dias da abertura do Estaleiro; durante a execução dos trabalhos com periodicidade previamente definida; sempre que entre no Estaleiro novo trabalhador, grupo de trabalhadores ou subcontratado incluindo a sucessiva cadeia de subcontratação. Estas ações de sensibilização deverão se previamente programadas com vista a ocuparem o tempo estritamente necessário tendo em conta o número e tipo de destinatários.

O Diretor Técnico da Empreitada deverá transmitir ao coletivo dos trabalhadores (incluindo os dos Subcontratados), a política da segurança e saúde no trabalho que definiu para a empreitada; os principais riscos e respetivas medidas previstas na empreitada; as causas e consequências de acidentes de trabalho que tenham eventualmente ocorrido na empreitada; o procedimento de controlo de alcoolemia e informação sobre limite da taxa de alcoolemia que determina a suspensão do trabalho, etc.. Deverá também apresentar de forma sucinta, outros aspetos essenciais contidos no PSS da empreitada e que interessem à generalidade dos trabalhadores.

Sempre que, no decurso da execução da obra, um novo trabalhador seja integrado no Estaleiro, o Diretor Técnico da Empreitada deverá também garantir que lhe sejam fornecidas informações gerais sobre segurança e saúde nesta empreitada.

## **FOLHETO DE ACOLHIMENTO**

A todos os trabalhadores da empreitada, o Empreiteiro deverá entregar no momento de entrada, um *Folheto de Acolhimento*, em formato tão reduzido quanto possível mas legível, contendo informação, nomeadamente, sobre:

- Mensagem de boas vindas subscrita pelo Diretor Técnico da Empreitada;
- Política de segurança e saúde para esta empreitada;
- Organograma nominal da obra (preferencialmente incluindo fotografias);
- Comunicação Prévia (parte geral);
- Principais características da empreitada (incluindo quantidades de trabalho mais significativas);
- Plantas do estaleiro de apoio reduzidas com indicação expressa das diferentes instalações;
- Principais telefones de emergência (incluindo do Estaleiro de apoio);
- Equipamento de proteção individual de uso permanente por todos os trabalhadores;
- Regras a seguir em caso de acidente.

## **AFIXAÇÃO DE INFORMAÇÕES**

O Empreiteiro deverá instalar uma vitrina específica afixação de informação sobre segurança e saúde no trabalho separada da vitrina prevista no ponto referente ao Projeto do Estaleiro. Essa vitrina deverá ser colocada em local bem visível pela generalidade dos trabalhadores da empreitada, não sendo admissível a sua colocação no interior de escritórios. Nessa vitrina da segurança e saúde no trabalho, o Empreiteiro deverá afixar no mínimo:

- Comunicação Prévia, incluindo as declarações referidas na secção 2 deste PSS;
- Organograma nominal;
- Horário de trabalho;
- Tabela de salários mínimos;
- Quadro com registo de telefones de emergência;
- Quadro de registo de acidentes e índices de sinistralidade laboral,
- Extrato do plano de formação e informação que inclua temas, datas e locais de realização e destinatários.

Poderá ainda prever nessa vitrina a colocação de figuras com referências a aspetos específicos sobre a realização de trabalhos em curso e informações relativas às ações de formação e informação que decorrerão no Estaleiro sobre segurança e saúde.

Deverá ainda afixar noutros locais de grande visibilidade pelos trabalhadores (designadamente, refeitórios), alguma da informação atrás referida para a vitrina, para além de informações gerais realçando aspetos essenciais do PSS da empreitada, incluindo figuras com situações de risco e prevenção relativas aos trabalhos em curso em cada momento, devendo nestes casos substituir-se periodicamente as informações afixadas de forma a evitar a habituação do trabalhador e o excessivo número de informações afixadas.

### **REUNIÕES PERIÓDICAS POR GRUPOS DE TRABALHADORES**

Para além das ações de sensibilização dirigidas a todos os trabalhadores da empreitada, o Empreiteiro deverá também organizar reuniões periódicas com grupos de trabalhadores, preferencialmente nos próprios locais de trabalho. Em particular, tratando-se de trabalhos junto a vias em operação (rodoviárias ou ferroviárias), o Empreiteiro terá que organizar uma ação com todos os trabalhadores intervenientes na intervenção em causa antes de iniciado qualquer trabalho e no próprio local.

Consoante as características dos trabalhos e número de trabalhadores existentes no Estaleiro, estes grupos poderão ser constituídos por categorias profissionais ou por tipos de trabalho que executam, tendo em conta a eventual existência de trabalhadores imigrantes e respetivos idiomas. Nestas reuniões deverão ser analisadas os Planos de Monitorização e Prevenção aplicáveis aos trabalhos que o grupo de trabalhadores irá executar. A duração destas reuniões dependerá da complexidade de cada tipo de trabalho, devendo em regra cingir-se ao mínimo necessário.

O Empreiteiro incluirá no anexo 23 todos os documentos desenvolvidos no âmbito do *Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores*, nomeadamente calendarizações de ações, assim como os registos comprovativos da realização das mesmas.

## 4.11 - PLANO DE REGISTO DE ACIDENTES E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL

Sempre que ocorra um acidente de trabalho envolvendo qualquer trabalhador ao serviço do empreiteiro (incluindo os da sucessiva cadeia de subcontratação e fornecedores), e que tenha que ser participado à Companhia de Seguros deve ser efetuado um inquérito registando-se todas as informações relevantes que permitam uma análise detalhada desse acidente, incluindo as medidas preventivas adequadas para evitar a ocorrência de um mesmo tipo de acidente.

Tratando-se de acidente grave ou mortal deverá também o empreiteiro proceder à sua comunicação, nos termos da legislação em vigor, às entidades competentes (Autoridade para as Condições do Trabalho). O Empreiteiro deverá submeter à aprovação da Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra no prazo de 11 (onze) dias a contar da data da consignação, um Procedimento sobre a classificação de um acidente de trabalho como grave, sendo que no mínimo se deverá considerar como grave: o acidente de que resulte o internamento do sinistrado e este não obtenha “alta” nas 20 (vinte) horas seguintes à ocorrência desse acidente; a “rotura” total ou parcial, a perfuração profunda ou a amputação de qualquer membro do corpo; sempre que se preveja que o trabalhador permaneça mais de um mês de baixa.

Sem prejuízo de outros modelos que o empreiteiro utilize quer internamente quer por obrigação das entidades a quem o acidente de trabalho deva ser comunicado, o Empreiteiro registará esses acidentes utilizando o modelo S18 incluído no anexo I deste documento.

### COMUNICAÇÃO E REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Sem prejuízo de outras comunicações estabelecidas legalmente, o Diretor Técnico da Empreitada é responsável por comunicar por escrito à Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra todos os acidentes de trabalho acima referidos comunicados às Companhias de Seguros, de acordo com o seguinte:

- Essa comunicação deverá ser feita prazo máximo de 24 horas após o acidente. Essas comunicações são feitas pelo envio do **Registo de Acidente de Trabalho** de acordo com o modelo S18 incluído no anexo I deste documento, o qual deve conter todos os dados disponíveis à data do acidente.
- No prazo máximo de 5 (cinco) dias após a data do acidente, o Empreiteiro terá que enviar o **Relatório de Investigação do Acidente**. Esse relatório deve conter no mínimo as causas do acidente e as medidas de prevenção implementadas, destinadas a evitar a ocorrência de acidentes do mesmo tipo, e deverão ser anexados pelo Empreiteiro aos respetivos *Registos de Acidente de Trabalho*.
- Caso o trabalhador acidentado permaneça de baixa por um longo período, o Empreiteiro obriga-se a enviar até ao quinto dia útil de cada mês, informação sobre a evolução do estado de saúde do(s) acidentado(s) e previsão do seu regresso ao trabalho. Caso o trabalhador sinistrado tenha que ficar internado e permaneça como tal, essa informação deverá ser prestada no primeiro dia útil de cada semana, durante um período de pelo menos quatro semanas seguidas, a menos que termine entretanto esse internamento.
- No prazo máximo de 5 (cinco) dias após o regresso ao trabalho do acidentado ou após a data do apuramento (efetivo) de eventual grau de desvalorização, o Empreiteiro terá que enviar o

**Relatório Final** que integrará obrigatoriamente o *Registo de Acidente de Trabalho* completamente preenchido e o *Relatório de Investigação do Acidente*.

Mensalmente, o Empreiteiro deverá elaborar a ficha modelo SI9 incluída no anexo I deste documento, onde se pretende resumir os acidentes de trabalho ocorridos no mês e todos os sinistrados em meses anteriores que ainda se encontrem de baixa ou que tenham regressado ao trabalho durante esse mês.

[illegible]

○ Empreiteiro deverá elaborar essas fichas até ao 5.º dia de cada mês, arquivando-as no anexo 24.

A ocorrência de quaisquer *Incidentes*, isto é, situações ocorridas das quais não resultou lesão corporal de qualquer pessoa mas com elevado potencial de poder vir a resultar em acidente grave, deverão também ser comunicados à Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra no prazo de 2 (dois) dias seguintes ao acontecimento acompanhado de um relato da ocorrência e respectivas medidas tomadas para evitar a sua recorrência. Estes relatos deverão também ser arquivados no anexo 24.

## INDICADORES DE SINISTRALIDADE LABORAL

O Empreiteiro registrará todos os dados necessários para realçar os principais Indicadores de Sinistralidade Laboral, utilizando para o efeito o modelo S20 incluído no anexo I deste documento ou outro contendo no mínimo a informação que a seguir se apresenta.

[illegible]

Na utilização desse quadro, o Empreiteiro deverá considerar o seguinte:

- a) Consideram-se todos os acidentes de trabalho comunicados às Companhias de Seguros;
- b) No caso de acidente envolvendo mais do que um trabalhador, o número de acidentes de trabalho são tantos quantos os trabalhadores sinistrados.
- c) Na contagem do número de dias de trabalho perdidos não se considera o dia da ocorrência do acidente nem o do regresso ao trabalho. Note-se que se consideram dias de trabalho e não dias de calendário.
- d) Tratando-se de acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores de Subcontratados, no número de dias perdidos serão contabilizados todos os dias de trabalho até ao final do contrato desse subcontratado. Em qualquer dos casos, o limite para a contagem do número de dias de trabalho perdidos termina na data de receção provisória da empreitada ou, caso aplicável, da última receção provisória parcial.

A informação contida nesse quadro possui o significado que se apresenta a seguir:

- (1) Ano a que respeita a informação.
- (2) Mês a que respeita a informação.
- (3) N.º médio de pessoas na empreitada, incluindo técnicos e administrativos, trabalhadores dos Subcontratados. É calculado pela média aritmética do número de trabalhadores existente em cada um dos dias desse mês.

- (4) N.º total de pessoas-hora trabalhadas no mês, determinado a partir de folhas diárias de permanência de cada trabalhador em obra (folhas de controlo de assiduidade). Trata-se de registar o número total de horas de exposição a risco de todos os trabalhadores existentes no Estaleiro.
- (5) N.º de acidentes mortais ocorridos no mês.
- (6) N.º de acidentes não mortais sem baixa.
- (7) N.º de acidentes não mortais com 1 ou mais dias de baixa.
- (8) N.º de acidentes não mortais com mais de 3 dias de baixa.
- (9) N.º total de acidentes de trabalho ocorridos, mortais e não mortais (M+NM).
- (10) N.º de dias de trabalho perdidos nos acidentes com 3 ou menos dias de baixa.
- (11) N.º de dias de trabalho perdidos nos acidentes com mais 3 de dias de baixa.
- (12) N.º total de dias de trabalho perdidos com todos os acidentes não mortais, com baixa.
- (13) Índice de Incidência dos acidentes mortais e não mortais.
- (14) Índice de Incidência dos acidentes mortais e não mortais com 1 ou mais dias de baixa.
- (15) Índice de Incidência dos acidentes mortais e não mortais com mais de 3 dias de baixa.
- (16) Índice de Frequência dos acidentes mortais e não mortais.
- (17) Índice de Frequência dos acidentes mortais e não mortais com 1 ou mais dias de baixa.
- (18) Índice de Frequência dos acidentes mortais e não mortais com mais de 3 dias de baixa.
- (19) Índice de Gravidade dos acidentes mortais e não mortais.
- (20) Índice de Gravidade dos acidentes mortais e não mortais com mais de 3 dias de baixa.
- (21) Índice de Duração de todos os acidentes não mortais com mais de 1 dia de baixa.
- (22) Índice de Duração dos acidentes não mortais com mais de 3 dias de baixa.

O *Índice de Incidência (II)* é o número de acidentes ocorridos num dado período por cada mil pessoas expostas a risco no mesmo período. É calculado pela seguinte expressão:

$$II = \frac{N.º \text{ acidentes} \times 1\,000}{N.º \text{ Trabalhadores}}$$

O *Índice de Frequência (IF)* é o número de acidentes ocorridos num dado período em cada milhão de pessoas-hora trabalhadas no mesmo período, traduzindo a probabilidade de ocorrência de acidentes. É calculado pela seguinte expressão:

$$IF = \frac{N.º \text{ acidentes} \times 1\,000\,000}{N.º \text{ Pessoas hora trabalhadas}}$$

O *Índice de Gravidade (IG)* é o número de dias de trabalho perdidos pelo conjunto de trabalhadores acidentados num dado período em cada mil pessoas-hora trabalhadas nesse mesmo período, traduzindo as consequências dos acidentes. É calculado pela seguinte expressão, considerando-se que cada acidente mortal equivale a uma perda de 7500 dias de trabalho (penalização estatística):

$$IG = \frac{(N.^{\circ} \text{dias perdidos} + N.^{\circ} \text{Acid. mortais} \times 7500) \times 1\,000}{N.^{\circ} \text{Pessoas hora trabalhadas}}$$

O *Índice de Duração (ID)* dos acidentes de trabalho é o número médio de dias de trabalho perdidos por cada acidente de trabalho com baixa (não considerando os acidentes de trabalho mortais e os correspondentes dias perdidos de penalização estatística), realçando a gravidade dos acidentes com baixa ocorridos. É calculado pela seguinte expressão:

$$ID = \frac{N.^{\circ} \text{dias perdidos}}{N.^{\circ} \text{acidentes com baixa}}$$

Os resultados obtidos deverão ser objeto de análise em reuniões da Comissão de Segurança e Saúde de Obra que se refere na secção 5 deste PSS, procurando-se determinar as causas dos acidentes ocorridos e, sempre que a situação recomende, melhorar as técnicas de segurança e de saúde a aplicar visando evitar ou eliminar potenciais riscos.

O Empreiteiro atualizará no final de cada mês um ficheiro (formato *Excel*) com os dados relativos aos acidentes e índices de sinistralidade laboral (modelo S20 atrás referido), que deverá solicitar à Fiscalização em CD ou o envio por *email*. Após cada atualização, o Empreiteiro procederá à entrega ou envio por *email* do referido ficheiro à Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra até ao 5.º dia de cada mês, juntamente com a Monitorização que se refere adiante. Deverá também no mesmo prazo afixar esse quadro na vitrina referida no ponto relativo à Formação e Informação dos Trabalhadores, conjuntamente com gráficos dele extraídos mostrando a evolução desses indicadores.

O Empreiteiro arquivará no anexo 24 esses quadros, os Registos dos Acidentes de Trabalho ocorridos, incluindo os relatórios das investigações dos acidentes e comunicações às Companhias de Seguros e/ou à ACT, assim como toda a documentação relacionada a cada acidente.

### 4.12 - PLANO DE VISITANTES

A entrada no Estaleiro de pessoas estranhas à realização da empreitada requer autorização específica para cada caso. O pedido de autorização deverá ser sempre dirigido à Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra, que em determinados casos poderá ter de obter consentimento também do Dono da Obra, nomeadamente tratando-se de visitas de grupos (por exemplo, visitas de estudo), podendo ainda consultar o Diretor Técnico da Empreitada sobre o assunto.

Esse pedido deverá ser instruído com informação sobre dia e hora pretendida, número de pessoas envolvidas (devendo evitar-se grupos superiores a 20) e respetivo responsável do grupo, formação dessas pessoas (técnicos da construção, estudantes, etc.) e objetivo da visita (aspectos que pretendem ser tratados e parte do Estaleiro a visitar), entre outros. Após autorização da visita, a Fiscalização comunicará ao Diretor Técnico da Empreitada, o qual deverá assegurar:

- Disponibilização de uma pessoa para acompanhar os visitantes que seja conhecedora do Estaleiro e competente para dar as informações necessárias tendo em conta o objetivo da visita;

- Entrega a cada visitante de cópia do Folheto de Acolhimento referido na secção relativa à Formação e Informação dos Trabalhadores deste PSS e, de planta geral do Estaleiro elucidando os percursos a seguir com indicação de zonas de proibição e/ou de perigo;
- Distribuição do Equipamento de Proteção Individual obrigatório (de uso permanente), incluindo na frente do capacete de proteção a inscrição "Visitante" que o empreiteiro deverá dispor em permanência e em bom estado, no mínimo de 20.

O *Plano de visitantes* e todos os documentos relativos a visitas efetuadas, deverão ser arquivados no anexo 25.

### 4.13 - PLANO DE EMERGÊNCIA

Nos termos da legislação em vigor, constitui obrigação do empregador o estabelecimento das medidas a adotar em caso de ocorrência de acidentes.

O Empreiteiro deverá preparar até 11 (onze) dias após a data da consignação um *Plano de Emergência* estabelecendo as medidas a aplicar em caso de emergência, o qual deve prever, nomeadamente, o seguinte:

- Afixação na vitrina e junto aos telefones que existam no Estaleiro, lista de telefones de entidades locais, nomeadamente, Bombeiros, Polícia, Hospital, entidades concessionárias de serviços afetados, Serviços Camarários, Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra, Diretor da Técnico da Empreitada, Encarregado Geral.
- Sinalização de segurança identificando, nomeadamente os meios de combate a incêndios e o posto de primeiros socorros (fixo ou móvel).
- Identificação de elementos com formação em prestação de primeiros socorros (socorristas do trabalho) e respetivos meios disponibilizados a estes para rápida comunicação.
- Sistema de comunicação eficaz entre o Estaleiro de apoio e as diferentes frentes de trabalho, identificando os trabalhadores envolvidos na operacionalidade do sistema de comunicação. Esses trabalhadores têm que possuir meio de comunicação rápida e lista de meios de socorro e respetivos contactos para poderem solicitar a intervenção rápida em situação de emergência.
- O Empreiteiro possuirá no Estaleiro em permanência e em perfeito estado de utilização pelo menos uma viatura automóvel de tração às quatro rodas (no caso de haver frentes de trabalho a mais de 200 metros do Estaleiro de apoio).
- Deve evitar-se trabalhadores isolados, sendo as equipas de trabalho constituídas no mínimo por 2 trabalhadores.
- Caminhos e sinalização adequada de acesso a todas as frentes de trabalho para evacuação de sinistrados em caso de acidente de trabalho, e de todo o pessoal da empreitada, em caso de ocorrência de catástrofe (por exemplo, incêndio, explosão, inundação).

No caso de obras com frentes de trabalho em locais não servidos diretamente por vias públicas e outros de difícil referência à sua localização exata, deverá o empreiteiro promover os contactos necessários com os bombeiros locais entregando-lhes uma cópia do Plano de Emergência e sempre que possível acompanhar estes numa visita a essas frentes de trabalho determinando-se em conjunto as placas de sinalização necessárias para se chegar às frentes de trabalho, incluindo a colocação de Pontos de Encontro devidamente sinalizados em planta e no terreno. A realização de simulacro

deverá também ser prevista em conjunto e seguindo as indicações dos Bombeiros ou Proteção Civil locais.

Os documentos preparados no âmbito do *Plano de Emergência* deverão ser arquivados pelo Empreiteiro no anexo 26.

### 4.14 - PLANOS DE COFRAGENS E BETONAGENS

Antes de iniciada a montagem de cofragens e executada qualquer betonagem, o Empreiteiro, sem prejuízo de outros aspetos que a Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra considerem relevantes, submeterá a esta para aprovação, até 11 (onze) dias antes do início dos trabalhos em causa, um Plano de Cofragens e Betonagens, identificando:

- A estrutura de apoio da cofragem (prumos, cavaletes / cimbres) a utilizar, incluindo os travamentos, os sistemas de apoio e as inspeções e verificações sistemáticas a efetuar (listas de verificação);
- As cofragens a utilizar, incluindo escoramento e travamento das mesmas e respetivas medidas preventivas de proteção coletiva a integrar para prevenir os riscos associados à operação, nomeadamente plataformas de trabalho com o mínimo de 0,60 metros de largura livre e guarda-corpos ou outros dispositivos adequados à prevenção de quedas em altura; caso sejam utilizados óleos descofrantes deverão privilegiar-se óleos de base vegetal em vez dos de base mineral por estes conterem solventes orgânicos voláteis eventualmente tóxicos, evitando-se assim o eventual risco de irritação cutânea e de ataque dos pulmões;
- Método de colocação do betão, equipamento utilizado, seu posicionamento e meios humanos a envolver;
- A sequência de execução das betonagens dos elementos a betonar;
- O faseamento de execução dos mesmos, identificando as juntas de betonagem;
- Métodos de proteção das pontas de varões de aço caso se situem a altura que possam originar lesões aos trabalhadores.

O Empreiteiro deverá arquivar no anexo 30, esses *Planos de Cofragens e Betonagens* e eventuais alterações.

### 4.15 - PLANOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Antes de iniciado qualquer trabalho de montagem de estruturas metálicas, sem prejuízo de outros aspetos que a Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra considerem relevantes, o Empreiteiro submeterá a esta para aprovação, até 11 (onze) dias antes do início dos trabalhos, um *Plano de Montagem das Estruturas Metálicas*, identificando:

- A sequência das montagens dos elementos da estrutura metálica a executar e ordem de realização das ligações, incluindo os respetivos métodos e técnicas a utilizar;
- Identificação dos locais de descarga e posicionamento inicial dos elementos a montar;
- Meios humanos e equipamentos a utilizar e respetivas características técnicas;
- Formação adequada dos trabalhadores intervenientes na montagem da estrutura metálica;
- Posicionamento dos equipamentos e movimentos que irão executar isoladamente ou em conjunto, e métodos de controlo de movimentação dos elementos a transportar;

- Faixas de circulação dos equipamentos e definição de zonas interditas a trabalhadores e máquinas em cada fase das operações de montagem;
- Definição das medidas de proteção coletiva e de proteção individual a empregar / utilizar face aos riscos associados às operações a executar, nomeadamente plataformas de trabalho, guarda-corpos, redes, “linhas de vida” ou outros dispositivos adequados à prevenção de quedas em altura.

O Empreiteiro deverá arquivar no anexo 31, esses *Planos de Montagem das Estruturas Metálicas* e eventuais alterações.

### 4.16 - PLANOS DE MONTAGEM, DE UTILIZAÇÃO E DE DESMONTAGEM DE ANDAIMES

Prevendo-se a execução de andaimes, incluindo escadas de acesso a mais de 3 metros de altura, o Empreiteiro submeterá à aprovação da Fiscalização até 11 (onze) dias antes do início da execução dessas estruturas provisórias, o respetivo plano de montagem, de utilização e de desmontagem incluindo, nomeadamente:

- Documentos de referência utilizados (certificação, homologação, etc.);
- Características do andaime, incluindo altura e extensão do andaime, largura da plataforma, forma de apoio a estruturas existentes, rede de proteção, forma de acesso vertical (que deverá ser consoante os casos a partir do pavimento servido ou pelo interior da estrutura devendo ser interdita a circulação vertical pelo exterior), etc.;
- Cálculos de resistência e estabilidade, quando necessário ou a Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra o exija, incluindo termo de responsabilidade por técnico competente e legalmente aceite;
- Marca e modelo do andaime proposto, incluindo as características técnicas dos seus componentes (tubos, plataformas, acessórios, etc.)
- Classe do andaime incluindo a especificação das cargas e respetiva justificação;
- Tipo e condições de apoio;
- Desenhos de pormenor em número suficiente;
- Ensaios a realizar ao terreno para garantir as tensões especificadas no projeto;
- Listas de verificação (receção no estaleiro, apoio no terreno, verificação após montagem, etc.).

O Empreiteiro deverá arquivar no anexo 32, esses *Planos de Montagem, de Utilização e de Desmontagem de Andaimes* e eventuais alterações.

### 4.17 - PLANOS DE MONTAGEM DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

Antes de iniciado qualquer trabalho de montagem de elementos prefabricados e sem prejuízo de outros aspetos que a Fiscalização ou o Coordenador de Segurança da Obra considerem relevantes, o Empreiteiro apresentará à Fiscalização para aprovação prévia, até 11 dias antes do início dos trabalhos, um Plano de Montagem de Elementos Prefabricados, identificando:

- a sequência das montagens dos elementos, incluindo e respetivos métodos e técnicas a utilizar.
- identificação dos locais de descarga e posicionamento inicial dos elementos a montar.

- meios humanos e equipamentos a utilizar e respetivas características técnicas.
- posicionamento dos equipamentos e movimentos que irão executar isoladamente ou em conjunto, e métodos de controlo de movimentação dos elementos a transportar.
- faixas de circulação dos equipamentos e definição de zonas interditas a trabalhadores e máquinas em cada fase das operações de montagem.
- definição das medidas de proteção coletiva e de proteção individual a empregar / utilizar face aos riscos associados às operações a executar.

O Empreiteiro deverá arquivar no anexo 33, esses *Plano de Montagem de Elementos Prefabricados* e eventuais alterações.



## 5 - Monitorização e Acompanhamento

Sem prejuízo das ações diárias e/ou periódicas que deverão ser realizadas por todos os intervenientes nesta empreitada, quer em cumprimento das obrigações legais aplicáveis, quer por exigência do caderno de encargos do qual este Plano de Segurança e Saúde faz parte integrante, referem-se as seguintes ações específicas para verificar o desempenho do Empreiteiro na implementação da segurança e saúde no trabalho nesta empreitada:

- Monitorização mensal;
- Comissões de Segurança e Saúde;
- Auditorias e Inspeções.

### 5.1 - MONITORIZAÇÃO MENSAL

O Empreiteiro atualizará no final de cada mês, um ficheiro (formato *Word*) com dados relativos à monitorização (modelo S21 incluído no anexo I deste PSS) que deverá solicitar à Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra, em CD ou o envio por *email*, conforme for acordado. Após cada atualização, o Empreiteiro procederá à entrega, ou envio por *email*, do referido ficheiro à Fiscalização até ao 5.º dia de cada mês, acompanhado dos documentos nele indicados.

Compete à Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra, analisar o conteúdo do mencionado ficheiro e avaliar a implementação do preconizado no PSS, assim como os acidentes e indicadores de sinistralidade laboral.

Sempre que requerido, é responsabilidade da Fiscalização enviar o referido ficheiro devidamente atualizado ao Dono da Obra ou seu representante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a solicitação.

O Empreiteiro deverá arquivar no anexo 27 os relatórios de Monitorização enviados à Fiscalização.

Para além dessa monitorização, o empreiteiro deverá promover e criar as condições, fornecendo os meios necessários, para que os representantes dos trabalhadores dentro do horário de trabalho possam periodicamente (no mínimo mensalmente) percorrer as frentes de trabalho para auscultar diferentes trabalhadores do empreiteiro ou dos seus Subcontratados, com vista a recolher informação sobre as condições de trabalho e bem-estar destes no estaleiro em causa, incluindo condições de segurança no trabalho que desempenham, garantia de salários em dia, condições de habitabilidade no Estaleiro (dormitórios, caso aplicável), condições em que tomam as suas refeições, etc..

### 5.2 - COMISSÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA OBRA

Com o objetivo de acompanhar e avaliar a implementação do *Plano de Segurança e Saúde* será constituída uma Comissão de Segurança da Obra composta, em princípio, pelas pessoas com as seguintes funções ou representações:

- Representante do Dono da Obra (Gestor de Obra ou um seu representante);
- Representante da Fiscalização (Engenheiro Residente);

- Responsável pelo exercício da coordenação de segurança em obra;
- Diretor Técnico da Empreitada;
- Responsável do Empreiteiro pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e pela correta aplicação, manutenção, atualização e organização deste PSS;
- Representante(s) dos trabalhadores da empreitada.

No prazo de 11 (onze) dias a contar da data da consignação da empreitada, o Empreiteiro deve informar a Fiscalização dos elementos que lhe compete designar para integrar a Comissão de Segurança e Saúde da Obra acima referida, incluindo-se também os representantes dos trabalhadores da empreitada cujo número deverá ser o referido no n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro. Salvo casos excecionais, estes representantes não poderão ser trabalhadores da equipa dirigente da empreitada (direção técnica, administrativos, encarregados, arvorados, chefes de equipa). Nos 5 (cinco) dias seguintes a essa designação, o Empreiteiro obriga-se a colocar este PSS à disposição dos representantes dos trabalhadores da empreitada, explicando o seu conteúdo, assegurando o mesmo e no mesmo prazo sempre que haja alterações de algum destes representantes.

| N.º de trabalhadores na empreitada (n) | N.º de representantes |
|----------------------------------------|-----------------------|
| $n < 61$                               | 1 (um)                |
| $61 \leq n < 151$                      | 2 (dois)              |
| $151 \leq n < 301$                     | 3 (três)              |
| $301 \leq n < 501$                     | 4 (quatro)            |
| $n > 501$                              | 5 (cinco)             |

A Comissão de Segurança da Obra deve reunir periodicamente (em princípio, mensalmente ou outra periodicidade que venha a ser definida pelo Dono da Obra) para analisar o estado de implementação do Sistema; apoiar as tarefas da Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra; identificar as alterações que se mostrarem necessárias para a melhoria das condições de segurança e saúde no trabalho e analisar eventuais acidentes e índices de sinistralidade laboral registados na empreitada, e as medidas preventivas implementadas.

No fim de cada reunião, a Fiscalização promoverá a elaboração da respetiva ata e assegurará a sua distribuição pelos intervenientes nesta Comissão no prazo de 11 (onze) dias.

O Empreiteiro deverá arquivar no anexo 28 as atas das reuniões da Comissão da Segurança da Obra.

### 5.3 - AUDITORIAS E INSPEÇÕES

O Empreiteiro obriga-se a efetuar auditorias internas no mínimo trimestralmente, devendo a primeira dessas auditorias ser realizada até dois meses após a consignação da empreitada. Essas auditorias deverão ser efetuadas seguindo a metodologia da ISO 19011 tendo em conta a área em causa (segurança e saúde) e poderão ser efetuadas com meios internos do próprio empreiteiro ou recorrendo a meios externos, sendo que no primeiro caso a equipa auditora não poderá conter elementos ligados à empreitada objeto da auditoria.

Esse prazo é de um mês para o Empreiteiro realizar uma primeira inspeção específica às instalações do estaleiro de apoio (instalações sociais).

Sem prejuízo de responsabilidades e direitos estabelecidos legalmente, o Dono da Obra reserva-se o legítimo direito de, com meios próprios ou através de entidades externas que contrate para o efeito, efetuar também Auditorias ao *Sistema da Segurança e Saúde no Trabalho* preconizado no presente *Plano de Segurança e Saúde* e na legislação e regulamentação vigentes. Nos processos de Auditoria, o Empreiteiro prestará todas as informações que lhe sejam solicitadas, participará nas reuniões da Auditoria com todos os elementos a quem tal seja solicitado, e disponibilizará à Equipa Auditora as instalações do estaleiro e toda a documentação do âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, incluindo as cópias necessárias.

O Empreiteiro deverá arquivar no anexo 29 os Planos e Relatórios de Auditorias e Inspeções, quer internas (efetuadas pelo Empreiteiro), quer externas de 2.ª Parte (efetuadas por iniciativa da Fiscalização / Coordenador de Segurança em Obra ou do Dono da Obra).

Deverão também ser arquivadas neste anexo, os Planos de Ações Corretivas e/ou Preventivas resultantes dessas auditorias ou inspeções e bem assim os documentos relativos a eventuais Inspeções (autos de notícia, notificações, autos de suspensão de trabalhos) que venham a ser realizadas à obra pela **Autoridade para as Condições do Trabalho**.



## Apêndice

---



## LISTA DE ANEXOS

| ANEXO N.º | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Lista e Modelos de Fichas;<br>Lista de Trabalhos Relevantes.                                                                                                                                                       |
| 2         | Receção do PSS pelo empreiteiro; Registo de Distribuição do PSS;<br>Entrega do PSS pelo empreiteiro ao representante do dono da obra.                                                                              |
| 3         | Comunicações Prévias e Declaração relativa a eventuais trabalhadores imigrantes                                                                                                                                    |
| 4         | Alterações a cláusulas do PSS                                                                                                                                                                                      |
| 5         | Organograma do Empreiteiro; Definição de Funções; Política da Segurança e Saúde no Trabalho do Empreiteiro; Controlo de Assinaturas e Rubricas.                                                                    |
| 6         | Horários de Trabalho (Empreiteiro e sucessiva cadeia de subcontratação)                                                                                                                                            |
| 7         | Controlo de subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratação                                                                                                                                                   |
| 8         | Registo de apólices de seguro de acidentes de trabalho (Empreiteiro e sucessiva cadeia de subcontratação), incluindo apólices e comprovativos da validade e cópias das folhas de remunerações da Segurança Social. |
| 9         | Condicionalismos existentes no local                                                                                                                                                                               |
| 10        | Plano de Trabalhos, incluindo Planos e Cronogramas de Mão-de-Obra; Fases de execução de trabalhos.                                                                                                                 |
| 11        | Instruções de Trabalho                                                                                                                                                                                             |
| 12        | Projeto do Estaleiro                                                                                                                                                                                               |
| 13        | Planos de Acessos, Circulação e Sinalização interna no estaleiro.                                                                                                                                                  |
| 14        | Planos de Sinalização Temporária na via pública                                                                                                                                                                    |
| 15        | Registos de Controlo dos Equipamentos de Apoio                                                                                                                                                                     |
| 16        | Planos de Proteções Coletivas                                                                                                                                                                                      |
| 17        | Controlo de Receção de Materiais e Equipamentos                                                                                                                                                                    |
| 18        | Planos de Monitorização e Prevenção                                                                                                                                                                                |
| 19        | Registos de Monitorização e Prevenção                                                                                                                                                                              |
| 20        | Registos de Não conformidade e Ações Corretivas / Preventivas                                                                                                                                                      |
| 21        | Plano de Identificação e Saúde de Trabalhadores                                                                                                                                                                    |
| 22        | Registos de Controlo de Distribuição de EPI                                                                                                                                                                        |
| 23        | Formação e Informação dos Trabalhadores                                                                                                                                                                            |
| 24        | Registo de Acidentes e Índices de Sinistralidade                                                                                                                                                                   |
| 25        | Planos para Visitantes                                                                                                                                                                                             |
| 26        | Planos de Emergência e Evacuação de Trabalhadores                                                                                                                                                                  |

**NOTA:** O Empreiteiro deverá constituir os anexos referidos nesta lista, seguindo o modelo do anexo I já constituído, integrando neles todos os elementos que constituirão as adaptações / complementos resultante da implementação do preconizado neste PSS. Todos os anexos que contenham mais do que um registo, deverá o Empreiteiro elaborar um índice que colocará no início do respetivo anexo.

## LISTA DE ANEXOS (CONT.)

| ANEXO N.º | DESCRIÇÃO                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 27        | Relatórios da Monitorização Mensal                             |
| 28        | Atas das Reuniões da Comissão de Segurança da Obra             |
| 29        | Relatórios de Auditorias e Inspeções                           |
| 30        | Planos de Cofragens e Betonagens                               |
| 31        | Planos de Montagem de Estruturas Metálicas                     |
| 32        | Planos de Montagem, de Utilização e de Desmontagem de Andaimos |
| 33        | Planos de Montagem de Elementos Pré-fabricados                 |
| 34        |                                                                |
| 35        |                                                                |
| 36        |                                                                |
| 37        |                                                                |
| 38        |                                                                |
| 39        |                                                                |
| 40        |                                                                |
| 41        |                                                                |
| 42        |                                                                |
| 43        |                                                                |
| 44        |                                                                |
| 45        |                                                                |
| 46        |                                                                |
| 47        |                                                                |
| 48        |                                                                |
| 49        |                                                                |
| 50        |                                                                |
| 51        |                                                                |
| 52        |                                                                |
| 53        |                                                                |
| 54        |                                                                |
| 55        |                                                                |
| 56        |                                                                |
| 57        |                                                                |
| 58        |                                                                |
| 59        |                                                                |
| 60        |                                                                |

## LOMBADA TIPO PARA ARQUIVOS DO PSS

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
|                                                     |
| <i>Símbolo e<br/>designação do<br/>Dono da Obra</i> |
|                                                     |
| <i>Designação da Empreitada</i>                     |
|                                                     |
| <i>Símbolo e<br/>designação<br/>do Empreiteiro</i>  |
|                                                     |
| <b>Plano de<br/>Segurança<br/>e Saúde</b>           |
|                                                     |
| <b>Anexo N.º</b>                                    |
| <i>Designação do anexo</i>                          |
|                                                     |



## Anexo I

---

### LISTA E MODELOS DE FICHAS E LISTA DE TRABALHOS RELEVANTES



## LISTA DE MODELOS

| MODELO | DESCRIÇÃO                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| S01    | Registo de distribuição de documentos                               |
| S02    | Proposta de alterações de documentos                                |
| S03    | Registo das alterações aprovadas de documentos                      |
| S04    | Declaração de receção do PSS pelo Empreiteiro                       |
| S05    | Declaração de entrega do PSS na Receção Provisória pelo Empreiteiro |
| S06    | Controlo de assinaturas e rubricas                                  |
| S07    | Declaração relativa a eventuais trabalhadores imigrantes            |
| S08    | Comunicação Prévia                                                  |
| S09    | Registo de identificação dos trabalhadores e inspeção médica        |
| S10    | Distribuição de EPI e informação sobre riscos                       |
| S11    | Controlo de subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratação     |
| S12    | Registo de apólices de seguro de acidentes de trabalho              |
| S13    | Controlo de equipamentos de apoio e acessórios                      |
| S14    | Controlo de receção de materiais e equipamentos                     |
| S15    | Planos de monitorização e prevenção                                 |
| S16    | Registos de monitorização e prevenção                               |
| S17    | Registo de não conformidade e ações corretivas / preventivas        |
| S18    | Registo de ocorrência de acidente de trabalho                       |
| S19    | Resumo mensal da situação dos acidentes de trabalho                 |
| S20    | Registo de acidentes e índices de sinistralidade laboral            |
| S21    | Monitorização da segurança e saúde no trabalho                      |
| S22    |                                                                     |
| S23    |                                                                     |
| S24    |                                                                     |
| S25    |                                                                     |
| S26    |                                                                     |
| S27    |                                                                     |

**NOTA:** O Empreiteiro deverá utilizar como referência os modelos referidos nesta lista e integrados no PSS ou na CT, consoante os casos, podendo no entanto propor as alterações que entender, as quais apenas se tornam efetivas após aprovação do Dono da Obra. Poderá também criar novos modelos que proporá ao Dono da Obra a sua aprovação e integração no Sistema.

Inclui-se também no anexo I do PSS a lista inicial de trabalhos relevantes elaborada na fase de projeto, que o empreiteiro deverá complementar em cópia que introduzirá no anexo I8 (Planos de Monitorização e Prevenção).

## LISTA DE TRABALHOS RELEVANTES

[illegible]

|                                     |                                              |  |         |         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------|---------|
| <i>Logotipo do<br/>Dono da Obra</i> | <b>REGISTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS</b> |  | Número: | Pág.:   |
|                                     | Dono da Obra:                                |  | _____   | __ / __ |
|                                     | Obra:                                        |  |         |         |
|                                     | Empreiteiro:                                 |  |         |         |

|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DOCUMENTO</b>                                                                                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Plano de Segurança e Saúde (PSS); <input type="checkbox"/> Compilação Técnica da Obra (CT); <input type="checkbox"/> _____; |  |
| <input type="checkbox"/> _____; <input type="checkbox"/> _____; <input type="checkbox"/> _____                                                       |  |

| REF. <sup>a</sup> | NOME DO DETENTOR DO PSS | ENTIDADE | DATA | RUBRICA | OBSERV. |
|-------------------|-------------------------|----------|------|---------|---------|
| 1                 |                         |          |      |         |         |
| 2                 |                         |          |      |         |         |
| 3                 |                         |          |      |         |         |
| 4                 |                         |          |      |         |         |
| 5                 |                         |          |      |         |         |
| 6                 |                         |          |      |         |         |
| 7                 |                         |          |      |         |         |
| 8                 |                         |          |      |         |         |
| 9                 |                         |          |      |         |         |
| 10                |                         |          |      |         |         |
| 11                |                         |          |      |         |         |
| 12                |                         |          |      |         |         |
| 13                |                         |          |      |         |         |
| 14                |                         |          |      |         |         |
| 15                |                         |          |      |         |         |
| 16                |                         |          |      |         |         |
| 17                |                         |          |      |         |         |
| 18                |                         |          |      |         |         |
| 19                |                         |          |      |         |         |
| 20                |                         |          |      |         |         |
| 21                |                         |          |      |         |         |
| 22                |                         |          |      |         |         |
| 23                |                         |          |      |         |         |
| 24                |                         |          |      |         |         |
| 25                |                         |          |      |         |         |
| 26                |                         |          |      |         |         |
| 27                |                         |          |      |         |         |
| 28                |                         |          |      |         |         |
| 29                |                         |          |      |         |         |
| 30                |                         |          |      |         |         |

**Nota:** Este quadro deverá ser mantido atualizado pelo Empreiteiro à medida que o PSS ou a CT for sendo distribuído pelos subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratação.







|                                     |                                                       |  |         |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| <i>Logotipo do<br/>Dono da Obra</i> | <b>REGISTO DAS ALTERAÇÕES APROVADAS DE DOCUMENTOS</b> |  | Número: | Pág.:     |
|                                     | Dono da Obra:                                         |  | _____   | ___ / ___ |
|                                     | Obra:                                                 |  |         |           |
|                                     | Empreiteiro:                                          |  |         |           |

|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DOCUMENTO</b>                                                                                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Plano de Segurança e Saúde (PSS); <input type="checkbox"/> Compilação Técnica da Obra (CT); <input type="checkbox"/> _____; |  |
| <input type="checkbox"/> _____; <input type="checkbox"/> _____; <input type="checkbox"/> _____                                                       |  |

| REF. <sup>a</sup> | CLÁUSULAS ALTERADAS | RESUMO DA ALTERAÇÃO APROVADA | DATA DE ENTRADA EM VIGOR |
|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |
|                   |                     |                              |                          |



***Papel timbrado  
do adjudicatário***

## **DECLARAÇÃO**

Adjudicatário da empreitada de "...", declara ter recebido o *Plano de Segurança e Saúde* (PSS) para a mencionada empreitada comprometendo-se a cumprir o preconizado nesse PSS com proficiência tendo em conta a legislação em vigor e a propor as alterações que se revelarem necessárias face aos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados no estaleiro.

Mais declara ter recebido também dois ficheiros em suporte informático relativos a dados de acidentes de trabalho e índices de sinistralidade laboral (Modelo S20 em suporte *Excel*) e a dados de Monitorização (Modelo S21 em suporte *Word*), comprometendo-se a entregar esses ficheiros à Fiscalização no mesmo suporte (ou enviar por email confirmando a sua receção) com toda a informação neles requerida até ao quinto dia útil de cada mês.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

O Representante do Adjudicatário

\_\_\_\_\_



**Papel timbrado  
do adjudicatário**

## DECLARAÇÃO

*(a anexar ao Auto de Receção Provisória da Obra)*

E..., adjudicatário da (*designação da empreitada/obra*), declara que, todos os elementos preparados e utilizados no âmbito do *Plano de Segurança e Saúde* da empreitada acima referida, se encontram integrados de forma organizada no conjunto de ... pastas referido no anexo a esta declaração e que se entrega nesta data ao representante do Dono da Obra neste ato.

*O Empreiteiro*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*A Fiscalização*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*O Representante do Dono da Obra*

**Recebi os documentos mencionados**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

[illegible]

|                                     |                                           |               |                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Logotipo do<br/>Dono da Obra</i> | <b>CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS</b> |               | Número<br><br>_____ | Página<br><br>____/____ |
|                                     | Empreitada:                               |               | Código:             |                         |
|                                     | Dono da Obra:                             | Fiscalização: |                     |                         |
|                                     | Projetista:                               | Empreiteiro:  |                     |                         |

[illegible]

|                                           |                                            |                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Preparado por:                   __/__/__ | Verificado por:                   __/__/__ | Aprovado por:                   __/__/__ |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|



|                             |                                                                            |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Logotipo do<br>Dono da Obra | <b><i>Declaração relativa a eventuais<br/>Trabalhadores Imigrantes</i></b> | PÁGINA<br><b>1 / 1</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|

***Papel timbrado  
do adjudicatário***

## DECLARAÇÃO

E..., adjudicatário da empreitada (*designação da empreitada/obra*), declara, (\*) nos termos e para os efeitos dos n.ºs 4 e 5 do Art.º 144.º do Decreto-Lei n.º 244/98 de 8 de agosto, com as alterações decorrentes da Lei n.º 97/99 de 26 de julho, do Decreto-Lei n.º 4/2001 de 10 de janeiro e do Decreto-Lei n.º 34/2003 de 25 de fevereiro, que cumprem as obrigações decorrentes da lei relativamente a todos os trabalhadores imigrantes eventualmente contratados para a execução desta empreitada, assegurando também esse cumprimento por parte dos seus subcontratados (subempreiteiros, empresas de prestação de serviços, empresas de cedência de trabalhadores em regime de trabalho temporário, empresas de aluguer ou fornecedoras de equipamento com manobrador, trabalhadores independentes), e bem assim da sucessiva cadeia de subcontratação.

(Localidade), de de

(assinaturas de quem obriga a empresa)

(\*) Tratando-se de empresa da cadeia de subcontratação, deverá substituir-se por “E..., subcontratado da empresa (*designação da empresa contratante, a qual poderá ser subcontratada de outra*) para a empreitada (*designação da empreitada / obra*), declara, nos termos ...”



## COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA DE ESTALEIRO

(art.º 15º, n.º 2, do Dec. Lei n.º 273/2003 de 29/10)

### 1. Endereço do estaleiro:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

### 2. Natureza da obra:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 3. Utilização prevista:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 4. Dono da obra:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NIF/NIPC:

\_\_\_\_\_

Sede/Endereço:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

### 5. Autor ou autores do projeto:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Endereço(s):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

### 6. Entidade executante:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NIF/NIPC:

\_\_\_\_\_

Sede/Endereço:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

**7. Fiscalização da Obra** (designado pelo dono da obra):

---

---

Sede/Endereço:

---

---

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

Representado por (fiscal da obra):

---

---

 Tel.: \_\_\_\_\_

**8. Coordenação de Segurança em Projeto:**

---

---

Sede/Endereço:

---

---

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

Representado por (Coordenador de Segurança em Projeto):

---

---

Endereço:

---

---

 Tel.: \_\_\_\_\_

**9. Coordenação de Segurança em Obra:**

---

---

Sede/Endereço:

---

---

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

Representado por (Coordenador de Segurança em Obra):

---

---

Endereço:

---

---

 Tel.: \_\_\_\_\_

**10. Diretor Técnico da Empreitada** (designado pelo adjudicatário / Entidade executante, em obra pública):

---

---

Endereço:

---

---

**11. Representante da Entidade Executante** (em obra pública):

---

---

Endereço:

---

---

**12. Responsável pela Direção Técnica da Obra** (designado pela entidade executante, em obra particular):

---

---

Endereço:

---

---

**13. Datas previsíveis de início e termo dos trabalhos no estaleiro:**

Data de início: \_\_\_\_\_ Data de termo: \_\_\_\_\_

**14. Estimativa do número máximo de trabalhadores por conta de outrem e independentes, presentes em simultâneo no estaleiro:**

---

(ou)

Somatório dos dias de trabalho prestado por cada um dos trabalhadores:

---

**15. Estimativa do número de empresas a operar no estaleiro:** \_\_\_\_\_

Estimativa do número de trabalhadores independentes a operar no estaleiro: \_\_\_\_\_

**16. Subempreiteiros já selecionados:**

a) \_\_\_\_\_

NIF/NIPC: \_\_\_\_\_

Sede/Endereço: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

NIF/NIPC: \_\_\_\_\_

Sede/Endereço: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_  
NIF/NIPC: \_\_\_\_\_  
Sede/Endereço: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

d) \_\_\_\_\_  
NIF/NIPC: \_\_\_\_\_  
Sede/Endereço: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

(...)

### **17. Documentos (declarações) anexos:**

(art.º 15.º, n.º 3 do Dec. Lei n.º 273/2003 de 29/10)

- ☐ Declaração do(s) autor(es) do projeto;
- ☐ Declaração do coordenador de segurança em projeto;
- ☐ Declaração da entidade Executante;
- ☐ Declaração do coordenador de segurança em obra;
- ☐ Declaração do fiscal ou fiscais da obra;
- ☐ Declaração do diretor técnico da empreitada;
- ☐ Declaração do representante da entidade executante;
- ☐ Declaração do responsável pela direção Técnica da Obra.

O Dono da Obra

Data

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DECLARAÇÕES** (previstas nas alíneas a) e b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29/10)

### **DECLARAÇÃO DE AUTOR DO PROJETO**

..... (indicar nome, habilitação académica, bilhete de identidade, n.º de identificação fiscal, domicílio e, se for o caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito), declara, para efeitos do disposto do disposto na **alínea a) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro**, que é **Autor do Projeto** de..... (conforme a responsabilidade assumida no projeto), relativo à obra..... (indicar natureza e utilização previstas), a realizar em.....e cujo dono da obra é..... (indicação do nome e domicílio ou sede).

..... de ..... de 200...

..... (Assinatura, conforme B.I)

## DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM PROJETO

(pessoa singular)

..... (indicar nome, habilitação académica, qualificação profissional, bilhete de identidade, número de identificação fiscal, domicílio e, se for o caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito), declara, para efeitos do disposto na **alínea a) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro**, que é o **Coordenador de Segurança em Projeto**, da obra..... (indicar natureza e utilização previstas), a realizar em..... e cujo dono da obra é ..... (indicação do nome e domicílio ou sede).

..... de ..... de 200...

..... (Assinatura, conforme B.I)

## DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM PROJETO

(pessoa coletiva)

..... (indicar nome da sociedade, n.º de identificação de pessoa coletiva, sede/domicílio, nome e qualidade dos representantes legais que vão assinar a declaração), declara, para efeitos do disposto na **alínea a) n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro**, que:

- É responsável pela **coordenação de segurança em projeto**, da obra..... (indicar natureza e utilização previstas), a realizar em..... e cujo dono da obra é .....(indicação do nome e domicílio ou sede);
- O exercício das atividades de coordenação em projeto é assegurado por..... (nome do **Coordenador de Segurança em Projeto**, habilitação académica, qualificação profissional, bilhete de identidade, número de identificação fiscal, domicílio e, se for o caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito).

..... de ..... de 200...

..... (Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(s), conforme B.I.)

..... (Assinatura do Coordenador de Segurança em Projeto, conforme B.I.)

**DECLARAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTANTE**  
(Pessoa Coletiva)

..... (indicar nome da sociedade, n.º de identificação de pessoa coletiva, sede/domicílio, filiais que interessem à execução da empreitada, n.º do alvará/título de registo, bem como o nome e qualidade dos representantes legais que vão assinar a declaração), declara, nos termos e para os efeitos da **alínea b) do n.º 3 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro**, assumir a qualidade e responsabilidade de **Entidade Executante** na obra..... (indicar natureza e utilização previstas), sita em..... e cujo dono de obra é .....(indicação do nome e domicílio ou sede).

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia.....do mês de.....de 200..... e a respetiva conclusão para o dia.....do mês de ..... de 200.....

.....,..... de ..... de 200...

..... (Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(s), conforme B.I.)

## DECLARAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTANTE

(Empresário em nome individual)

..... (indicar nome, n.º de identificação fiscal, sede/ domicílio e n.º do alvará/título de registo), declara, nos termos e para os efeitos da **alínea b) do n.º 3 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro**, assumir a qualidade e responsabilidade de **Entidade Executante** na obra..... (indicar a natureza e utilização previstas), sita em..... e cujo dono de obra é ..... (indicação do nome e domicílio ou sede).

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia.....do mês de..... de 200..... e a respetiva conclusão para o dia.....do mês de ..... de 200..... .

.....,..... de ..... de 200...

..... (Assinatura do empresário em nome individual, conforme B.I.)

## DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA

(pessoa singular)

..... (indicar nome, habilitação académica, qualificação profissional, bilhete de identidade, número de identificação fiscal, domicílio e, se for o caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito), declara, para efeitos do disposto na **alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro**, que é o **Coordenador de Segurança em Obra**, na obra.....  
(indicar natureza e utilização previstas), a realizar em ..... e cujo dono da obra é .....  
(indicação do nome e domicílio ou sede).

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia..... do mês .....de 200..... e a respetiva conclusão para o dia .... do mês..... de 200..... .

.....,..... de ..... de 200...

..... (Assinatura, conforme B.I)

## DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA

(pessoa coletiva)

..... (indicar nome da sociedade, n.º de identificação de pessoa coletiva, sede/domicílio, nome e qualidade dos representantes legais que vão assinar a declaração), declara, para efeitos do disposto na **alínea b) n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro**, que:

- É responsável pela **coordenação de segurança em obra**, da obra .....(indicar natureza e utilização previstas), a realizar em ..... e cujo dono da obra é .....(indicação do nome e domicílio ou sede);
- O exercício das atividades de coordenação de segurança em obra é assegurado por..... (nome do **Coordenador de Segurança em Obra**, habilitação académica, qualificação profissional, bilhete de identidade, número de identificação fiscal, domicílio e, se for o caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito);
- Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia ..... do mês .....de 200..... e a respetiva conclusão para o dia ..... do mês ..... de 200..... .

..... de ..... de 200.....

..... (Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(s), conforme B.I.)

..... (Assinatura do Coordenador de Segurança em Obra, conforme B.I.)

## DECLARAÇÃO DO FISCAL DA OBRA

(Pessoa singular)

..... (indicar nome, habilitação académica, bilhete de identidade, número de identificação fiscal, domicílio e, se for o caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito), declara, para efeitos do disposto na **alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro**, que é o **Fiscal da Obra** de..... (indicar natureza e utilização previstas), a realizar em..... e cujo dono da obra é ..... (indicação do nome e domicílio ou sede).

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia..... do mês .....de 200..... e a respetiva conclusão para o dia ..... do mês..... de 200..... .

.....,..... de ..... de 200...

..... (Assinatura, conforme B.I)

## DECLARAÇÃO DO FISCAL DA OBRA

(Pessoa coletiva)

..... (indicar nome da sociedade, n.º de identificação de pessoa coletiva, sede/domicílio, nome e qualidade dos representantes legais que vão assinar a declaração), declara, para efeitos do disposto na **alínea b) n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro**, que:

- É responsável pelos **serviços de fiscalização da obra**..... (indicar natureza e utilização previstas), a realizar em..... e cujo dono da obra é .....(indicação do nome e domicílio ou sede);
- O exercício das atividades de fiscalização em obra é assegurado por .....(nome de **quem assegura a fiscalização**, habilitação académica, bilhete de identidade, número de identificação fiscal, domicílio e, se for o caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito);
- Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia..... do mês .....de 200..... e a respetiva conclusão para o dia ..... do mês ..... de 200.... .

.....,..... de ..... de 200.....

..... (Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(s), conforme B.I.)

..... (Assinatura de quem assegura o exercício, conforme B.I.)

## DECLARAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO DA EMPREITADA

..... (indicar nome, bilhete de identidade, n.º de identificação fiscal, domicílio, habilitação académica e, se for o caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito), declara, nos termos e para os efeitos da **alínea b) do n.º 3 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro**, que é o **Diretor Técnico da Empreitada**..... (indicar natureza e utilização prevista), sita em.....e cujo dono de obra é..... (indicação do nome e domicílio ou sede).

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia..... do mês de ..... de 200..... e a respetiva conclusão para o dia..... do mês de ..... de 200..... .

.....,..... de ..... de 200...

..... (Assinatura, conforme B.I.)

## DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE EXECUTANTE

..... (indicar nome, bilhete de identidade, n.º de identificação fiscal, domicílio, habilitação académica e, se for o caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito), declara, nos termos e para os efeitos da **alínea b) do n.º 3 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro**, que é o **Representante da Entidade Executante** na obra..... (indicar natureza e utilização previstas), sita em..... e cujo dono de obra é .....(indicação do nome e domicílio ou sede).

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia..... do mês de ..... de 200..... e a respetiva conclusão para o dia..... do mês de ..... de 200..... .

.....,..... de ..... de 200...

..... (Assinatura, conforme B.I.)

## DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO TÉCNICA DA OBRA

..... (indicar nome, bilhete de identidade, n.º de identificação fiscal, domicílio, habilitação académica e, se for o caso, nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito), declara, nos termos e para os efeitos da **alínea b) do n.º 3 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro**, que é o **Responsável pela Direção Técnica da Obra**..... (indicar natureza e utilização prevista), sita em..... e cujo dono de obra é ..... (indicação do nome e domicílio ou sede).

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia..... do mês de ..... de 200... e a respetiva conclusão para o dia..... do mês de ..... de 200..... .

..... de ..... de 200.....

..... (Assinatura, conforme B.I.)

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div> <div>  <p>Logotipo do<br/>Dono da Obra</p> </div> </div> | <div> <div>IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES E INSPEÇÃO MÉDICA</div> <div> <div>Número</div> <div>____</div> </div> <div> <div>Página</div> <div>____/____</div> </div> </div> |                          |
|                                                                                                                                                 | <div> <div>Empreitada:</div> <div>Código:</div> </div>                                                                                                                      |                          |
|                                                                                                                                                 | <div>Dono da Obra:</div>                                                                                                                                                    | <div>Fiscalização:</div> |
|                                                                                                                                                 | <div>Projetista:</div>                                                                                                                                                      | <div>Empreiteiro:</div>  |

[illegible]

|                |       |                 |       |               |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
| Preparado por: | Data: | Verificado por: | Data: | Aprovado por: | Data: |
|----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|

(\*) **E** = Empreiteiro; **S** = Subcontratado / Tarefeiro; **TI** = Trabalhador independente



|                                     |                                                      |  |         |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------|------------|
| <b>Logotipo do<br/>Dono da Obra</b> | <b>DISTRIBUIÇÃO DE EPI E INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS</b> |  | Número: | Pág.:<br>/ |
|                                     | Dono da Obra:                                        |  |         |            |
|                                     | Empreitada:                                          |  |         |            |
|                                     | Empreiteiro:                                         |  |         |            |

|                                                                                                                        |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>Nome do Trabalhador</b><br>(Tratando-se de trabalhador independente assinalar aqui <input type="checkbox"/> )       | <b>Categoria</b> | <b>N.º</b> |
|                                                                                                                        |                  |            |
| <b>Empregador:</b> <input type="checkbox"/> Empreiteiro <input type="checkbox"/> Outro, incl. Trab. Ind. (Nome: _____) |                  |            |

| Ref. <sup>a</sup> | Designação do EPI | Riscos <sup>(1)</sup> | Receção <sup>(2)</sup>              | Devolução final <sup>(3)</sup>      |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                   |                       | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ |
|                   |                   |                       | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ |
|                   |                   |                       | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ |
|                   |                   |                       | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ | Data: ____/____/____<br>Ass.: _____ |

<sup>(1)</sup> Indicar códigos de acordo com a tabela abaixo

<sup>(2)</sup> Data e assinatura do trabalhador

<sup>(3)</sup> Data e assinatura de quem recebe

| RISCOS A PROTEGER                    |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 – Quedas em altura                 | 11 – Pancadas na cabeça |
| 2 – Quedas ao mesmo nível            | 12 – Cortes             |
| 3 – Queda de objetos                 | 13 – Estilhaços         |
| 4 – Queda por escorregamento         | 14 – Entalamentos       |
| 5 – Objetos pontiagudos ou cortantes | 15 – Electrocussão      |
| 6 – Esmagamento do pé                | 16 –                    |
| 7 – Torção do pé                     | 17 –                    |
| 8 – Choque ao nível dos maléolos     | 18 –                    |
| 9 – Choque ao nível do metatarso     | 19 –                    |
| 10 – Choque ao nível da perna        | 20 –                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DECLARAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Declaro que recebi os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) acima mencionados e que fui informado dos respetivos riscos que pretendem proteger, comprometendo-me a utilizá-los corretamente de acordo com as instruções recebidas, a conservá-los e mantê-los em bom estado, e a participar ao meu superior hierárquico todas as avarias ou deficiências de que tenha conhecimento. |             |
| Mais declaro que fui informado estar coberto por seguro de acidentes de trabalho através da apólice n.º _____ da Companhia de Seguros _____ em nome de _____.                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Trabalhador Ass.: _____<br>____/____/____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data: _____ |

|                                                                             |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável do Empreiteiro pela SST<br><br>Data: ____/____/____ Ass.: _____ | Diretor Técnico da Empreitada / Obra<br><br>Data: ____/____/____ Ass.: _____ |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|



|                             |                                                                        |               |                 |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Logotipo do<br>Dono da Obra | <b>CONTROLO DE SUBCONTRATADOS E SUCESSIVA CADEIA DE SUBCONTRATAÇÃO</b> |               | Número<br>_____ | Página<br>____/____ |
|                             | Empreitada:                                                            |               | Código:         |                     |
|                             | Dono da Obra:                                                          | Fiscalização: |                 |                     |
|                             | Projetista:                                                            | Empreiteiro:  |                 |                     |

| Ref. <sup>a</sup> | Empregador | Ref. <sup>a</sup><br>Emp. | Tipo de trabalho que executa | N.º max. trab.<br>na obra | Período de intervenção |             | Alvará de construção / Registo / Outro alvará |         |      |         |        |       |
|-------------------|------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------|------|---------|--------|-------|
|                   |            |                           |                              |                           | Início                 | Fim         | Alvará                                        | Registo | Cat. | Subcat. | Classe | Outro |
|                   |            | ---                       |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |
|                   |            |                           |                              |                           | ___/___/___            | ___/___/___ |                                               |         |      |         |        |       |

Notas: (1) A referência pode ser um número sequencial (na 1.ª linha deve figurar o empreiteiro); (2) Na 3.ª coluna deve indicar-se o n.º de Ref.<sup>a</sup> do empregador com quem possui contrato; (3) Na 4.ª coluna deve indicar-se o n.º máximo de trabalhadores na obra; (4) O fim da intervenção deve ser indicado após a saída do empregador; (5) Indicar os números dos alvarás de construção ou outros, dos títulos de registo e a categoria e subcategorias mais relevantes e classes em função do tipo de intervenção nesta empreitada; (6) Anexar cópia dos respetivos Alvarás ou Registos de exercício de atividade

|                      |                       |                     |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Preparado por: _____ | Verificado por: _____ | Aprovado por: _____ |
|----------------------|-----------------------|---------------------|



|                             |                                                                 |         |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Logotipo do<br>Dono da Obra | <b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CADEIA DE<br/>SUBCONTRATAÇÃO</b> | Número: | Pág.:     |
|                             | Dono da Obra:                                                   | _____   | ___ / ___ |
|                             | Empreitada:                                                     |         |           |
|                             | Empreiteiro:                                                    |         |           |

(n.º indicados nos “quadrados” abaixo de “ligação” a estrutura precedente, caso se trate de continuidade de organograma )

Designação do Empreiteiro Geral (ou do Subcontratado / Sub-subcontratado / ... consoante cada caso, a que corresponde o n.º indicado acima)

|  |                                                         |    |
|--|---------------------------------------------------------|----|
|  | Designação do Subcontratado / Sub-subcontratado/ ... 1  | 1  |
|  | Designação do Subcontratado / Sub-subcontratado/ ... 2  | 2  |
|  | Designação do Subcontratado / Sub-subcontratado/ ... 3  | 3  |
|  | Designação do Subcontratado / Sub-subcontratado/ ... 4  | 4  |
|  | Designação do Subcontratado / Sub-subcontratado/ ... 5  | 5  |
|  | Designação do Subcontratado / Sub-subcontratado/ ... 6  | 6  |
|  | Designação do Subcontratado / Sub-subcontratado/ ... 7  | 7  |
|  | Designação do Subcontratado / Sub-subcontratado/ ... 8  | 8  |
|  | Designação do Subcontratado / Sub-subcontratado/ ... 9  | 9  |
|  | Designação do Subcontratado / Sub-subcontratado/ ... 10 | 10 |

(n.º de “ligação” para estrutura seguinte, caso necessário dar continuidade ao organograma)



|                                                      |                                                                   |                          |                                    |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <div> <div>Logotipo do<br/>Dono da Obra</div> </div> | <div>REGISTO DE APÓLICES DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO</div> |                          | <div>Número</div> <div>_____</div> | <div>Página</div> <div>____/____</div> |
|                                                      | <div>Empreitada:</div>                                            |                          | <div>Código:</div>                 |                                        |
|                                                      | <div>Dono da Obra:</div>                                          | <div>Fiscalização:</div> |                                    |                                        |
|                                                      | <div>Projetista:</div>                                            | <div>Empreiteiro:</div>  |                                    |                                        |

[illegible]

(\*) **E** = Empreiteiro; **S** = Subempreiteiro / Tarefeiro; **TI** = Trabalhador independente; (\*\*) **PF-CN** = Prémio fixo com nomes; **PF-SN** = Prémio Fixo sem nomes; **PV** = Prémio Variável

|                |       |                 |       |               |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
| Preparado por: | Data: | Verificado por: | Data: | Aprovado por: | Data: |
|----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|




|                                         |                                                      |               |                 |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| <div>Logotipo do<br/>Dono da Obra</div> | <b>CONTROLO DE EQUIPAMENTO DE APOIO E ACESSÓRIOS</b> |               | Número<br>_____ | Página<br>____/____ |
|                                         | Empreitada:                                          |               | Código:         |                     |
|                                         | Dono da Obra:                                        | Fiscalização: |                 |                     |
|                                         | Projetista:                                          | Empreiteiro:  |                 |                     |

[illegible]

|                      |                       |                     |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Preparado por: _____ | Verificado por: _____ | Aprovado por: _____ |
|----------------------|-----------------------|---------------------|

Notas: (1) Placa de fabricante / identificação deverá incluir nome e endereço do fabricante, marca, modelo, n.º série e ano de fabrico; (2) Marcação CE no equipamento e possuir declaração CE de conformidade de acordo com D.L. 320/2001 (Diretiva Máquinas) e declaração CE de conformidade complementar de acordo com o D.L. 76/2002 (RES- Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para Utilização no Exterior), e ainda, nos casos aplicáveis, marcação no equipamento do nível de potência sonora garantida (Lwa) de acordo com este último DL; (3) Cumprimento da legislação aplicável a máquinas usadas (DL 214/95) e a equipamentos de trabalho (DL 50/2005).



|                                                                                   |                                                        |  |                 |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|--|
|  | <b>CONTROLO DE RECEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b> |  | Número<br>_____ | Página<br>___/___ |  |
|                                                                                   | Empreitada:                                            |  |                 | Código:           |  |
|                                                                                   | Dono da Obra:                                          |  | Fiscalização:   |                   |  |
|                                                                                   | Projetista:                                            |  | Empreiteiro:    |                   |  |

| Material ou Equipamento |                        |        |                          |                       |                              |       |                     | Código |  |
|-------------------------|------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|---------------------|--------|--|
|                         |                        |        |                          |                       |                              |       |                     |        |  |
| Ref.ª                   | Verificações / Tarefas | Riscos | Documentos de referência | Método de verificação | Ações Corretivas/Preventivas | Resp. | Frequência Inspeção | PP     |  |
|                         |                        |        |                          |                       |                              |       |                     |        |  |
|                         |                        |        |                          |                       |                              |       |                     |        |  |
|                         |                        |        |                          |                       |                              |       |                     |        |  |
|                         |                        |        |                          |                       |                              |       |                     |        |  |
|                         |                        |        |                          |                       |                              |       |                     |        |  |
|                         |                        |        |                          |                       |                              |       |                     |        |  |

|                      |                       |                     |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Preparado por: _____ | Verificado por: _____ | Aprovado por: _____ |
|----------------------|-----------------------|---------------------|

| Registo do controlo de receção                                       |                                   |                                                                      |                                   |                                                                      |                                   |                                                                      |                                   |                                                                      |                                   |                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> Guia Remessa n.º _____                                      |                                   | <b>2</b> Guia Remessa n.º _____                                      |                                   | <b>3</b> Guia Remessa n.º _____                                      |                                   | <b>4</b> Guia Remessa n.º _____                                      |                                   | <b>5</b> Guia Remessa n.º _____                                      |                                   | <b>6</b> Guia Remessa n.º _____                                      |                                   |
| <input type="checkbox"/> Conf. <input type="checkbox"/> NC N.º _____ |                                   | <input type="checkbox"/> Conf. <input type="checkbox"/> NC N.º _____ |                                   | <input type="checkbox"/> Conf. <input type="checkbox"/> NC N.º _____ |                                   | <input type="checkbox"/> Conf. <input type="checkbox"/> NC N.º _____ |                                   | <input type="checkbox"/> Conf. <input type="checkbox"/> NC N.º _____ |                                   | <input type="checkbox"/> Conf. <input type="checkbox"/> NC N.º _____ |                                   |
| Empreiteiro<br>_____/_____/_____                                     | Fiscalização<br>_____/_____/_____ | Empreiteiro<br>_____/_____/_____                                     | Fiscalização<br>_____/_____/_____ | Empreiteiro<br>_____/_____/_____                                     | Fiscalização<br>_____/_____/_____ | Empreiteiro<br>_____/_____/_____                                     | Fiscalização<br>_____/_____/_____ | Empreiteiro<br>_____/_____/_____                                     | Fiscalização<br>_____/_____/_____ | Empreiteiro<br>_____/_____/_____                                     | Fiscalização<br>_____/_____/_____ |







|                                                                                                                                                              |                                                                           |  |                                                 |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <div> <div>  </div> <div> <p>Logotipo do<br/>Dono da Obra</p> </div> </div> | <div> <div> <div>REGISTO DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO</div> </div> </div> |  | <div> <div>Número</div> <div>_____</div> </div> | <div> <div>Página</div> <div>____/____</div> </div> |
|                                                                                                                                                              | <div> <div>Empreitada:</div> </div>                                       |  | <div> <div>Código:</div> </div>                 |                                                     |
|                                                                                                                                                              | <div> <div>Dono da Obra:</div> </div>                                     |  | <div> <div>Fiscalização:</div> </div>           |                                                     |
|                                                                                                                                                              | <div> <div>Projetista:</div> </div>                                       |  | <div> <div>Empreiteiro:</div> </div>            |                                                     |

[illegible]

(1) A definição dos Pontos de Paragem é da competência da Fiscalização, caso em que esta tem que intervir obrigatoriamente no controlo.



|                             |                                                              |                |                 |                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Logotipo do<br>Dono da Obra | REGISTO DE NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS |                | Número<br>_____ | Página<br>____/____ |
|                             | Empreitada:                                                  |                | Código:         |                     |
|                             | Dono da Obra:                                                | Fiscalizaç ão: |                 |                     |
|                             | Projetista:                                                  | Empreiteiro:   |                 |                     |

Descrição da não conformidade:

Localização:

Descrito por:      \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Verificado por:      \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Documentos de referência:

Descrição das ações: ☐ corretivas   ☐ preventivas

☐ Aceite a ação proposta

☐ Aceite nas condições em anexo

☐ Rejeitado

☐ \_\_\_\_\_

Corrigir até: \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Proposto por:      \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Verificado por:      \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Decidido por:      \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Execução das ações corretivas / preventivas:

Executado por:      \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Verificado por:      \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Aprovado por:      \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_



|                                     |                                        |  |         |            |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--|---------|------------|
| <b>LOGOTIPO DO<br/>DONO DA OBRA</b> | <b>REGISTO DE ACIDENTE DE TRABALHO</b> |  | Número: | Pág.:<br>/ |
|                                     | Dono da Obra:                          |  |         |            |
|                                     | Obra:                                  |  |         |            |
|                                     | Empreiteiro:                           |  |         |            |

|                                                                            |                                    |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--|
| <b>DADOS DO SINISTRADO</b>                                                 |                                    |                  |  |  |
| Nome: _____                                                                |                                    | N.º Trab.: _____ |  |  |
| Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino | Data de Nascimento: ____/____/____ |                  |  |  |
| Naturalidade: _____                                                        |                                    |                  |  |  |
| Nacionalidade: _____                                                       |                                    |                  |  |  |
| Morada: _____                                                              |                                    |                  |  |  |
| Estado civil: _____                                                        |                                    |                  |  |  |
| B. I. N.º: _____ de ____/____/____ emitido por _____                       |                                    |                  |  |  |
| Passaporte <sup>(1)</sup> N.º: _____ de ____/____/____ emitido por _____   |                                    |                  |  |  |
| Categoria profissional: _____                                              |                                    |                  |  |  |
| Data de admissão na obra: ____/____/____                                   |                                    |                  |  |  |

|                                               |  |                                    |  |  |
|-----------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| <b>DADOS RELATIVOS À ENTIDADE EMPREGADORA</b> |  |                                    |  |  |
| Entidade empregadora: _____                   |  |                                    |  |  |
| Companhia de Seguros: <sup>(2)</sup> _____    |  | Apólice: <sup>(2)</sup> N.º: _____ |  |  |
| Data de admissão na empresa: ____/____/____   |  |                                    |  |  |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>DADOS RELATIVOS AO ACIDENTE</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Data e hora: ____/____/____ às ____h ____m                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Local: <input type="checkbox"/> No estaleiro <input type="checkbox"/> Fora do estaleiro <input type="checkbox"/> Desloc. Domicílio ⇒ Trabalho <input type="checkbox"/> Desloc. Trabalho ⇒ Domicílio |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Onde? _____                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Destino do sinistrado: _____                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Entidade que o transportou: _____ Data e hora: ____/____/____ às ____h ____m                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Houve mais sinistrados no acidente? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim Quantos? _____                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Testemunhas: _____                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>Causa do acidente:</b>                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Atropelamento<br><input type="checkbox"/> Capotamento<br><input type="checkbox"/> Colisão de veículos<br><input type="checkbox"/> Compressão por objeto<br><input type="checkbox"/> Choque elétrico | <input type="checkbox"/> Sub. nocivas / radiações<br><input type="checkbox"/> Choque com objetos<br><input type="checkbox"/> Esforço físico excessivo<br><input type="checkbox"/> Explosão / Incêndio<br><input type="checkbox"/> Intoxicação | <input type="checkbox"/> Queda em altura<br><input type="checkbox"/> Queda ao mesmo nível<br><input type="checkbox"/> Queda de objetos<br><input type="checkbox"/> Soterramento<br><input type="checkbox"/> _____ |  |  |
| <b>Tipo de lesão:</b>                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Amputação<br><input type="checkbox"/> Asfixia<br><input type="checkbox"/> Concussão / Lesões internas<br><input type="checkbox"/> Contusão<br><input type="checkbox"/> Distensão                    | <input type="checkbox"/> Electrização / Electrocussão<br><input type="checkbox"/> Entorse<br><input type="checkbox"/> Esmagamento<br><input type="checkbox"/> Ferida / Golpe<br><input type="checkbox"/> Fratura                              | <input type="checkbox"/> Lesões múltiplas<br><input type="checkbox"/> Luxação<br><input type="checkbox"/> Queimadura<br><input type="checkbox"/> Traumatismo<br><input type="checkbox"/> _____                    |  |  |
| <b>Parte do corpo atingida:</b>                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Cabeça, exceto olhos<br><input type="checkbox"/> Olho(s)<br><input type="checkbox"/> Tronco, exceto coluna<br><input type="checkbox"/> Coluna vertebral                                             | <input type="checkbox"/> Braço(s)<br><input type="checkbox"/> Mão(s), exceto dedos<br><input type="checkbox"/> Dedo(s) da(s) mão(s)<br><input type="checkbox"/> Pernas(s)                                                                     | <input type="checkbox"/> Pé(s), exceto dedos<br><input type="checkbox"/> Dedo(s) do(s) pé(s)<br><input type="checkbox"/> Localizações múltiplas<br><input type="checkbox"/> _____                                 |  |  |

|                                     |                                        |  |         |            |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--|---------|------------|
| <b>LOGOTIPO DO<br/>DONO DA OBRA</b> | <b>REGISTO DE ACIDENTE DE TRABALHO</b> |  | Número: | Pág.:<br>/ |
|                                     | Dono da Obra:                          |  |         |            |
|                                     | Obra:                                  |  |         |            |
|                                     | Empreiteiro:                           |  |         |            |

Breve descrição do acidente: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Medidas de prevenção adotadas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

|                                        |                                                   |                                                  |                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Efeitos do acidente:</b><br>_____ % | <input type="checkbox"/> Sem incapacidade         | <input type="checkbox"/> Incapacidade temporária | Regresso ao trabalho:<br>____/____/____ ⇨ ____ dias perdidos |
|                                        | <input type="checkbox"/> Incapacidade permanente: | <input type="checkbox"/> Morte                   |                                                              |

|                                                                             |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Responsável do Empreiteiro pela SST<br><br>Data: ____/____/____ Ass.: _____ | Diretor Técnico da Empreitada<br><br>Data: ____/____/____ Ass.: _____ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

(1) Caso não seja mencionado o Bilhete de Identidade sinistrado

(2) Apólice de seguro de acidentes de trabalho a coberto da qual se encontra o trabalhador

|                                                                                   |                                                            |  |                 |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------|--|
|  | <b>RESUMO MENSAL DA SITUAÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO</b> |  | Número<br>_____ | Página<br>____/____ |  |
|                                                                                   | Empreitada:                                                |  |                 | Código:             |  |
|                                                                                   | Dono da Obra:                                              |  | Fiscalização:   |                     |  |
|                                                                                   | Projetista:                                                |  | Empreiteiro:    |                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Notas: <b>a)</b> A Ref. <sup>a</sup> deverá ser a mesma da do Relatório de Investigação do acidente; <b>b)</b> Considerar todos os acidentados que se encontram de baixa no mês (acidentes ocorridos em mês anterior) e todos os acidentes ocorridos neste mês. | Ano: | Mês: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|

| Ref. <sup>a</sup> | Data acidente (ocorrência) | Nome abreviado do acidentado | Entidade Patronal | Data regresso ao trabalho | N.º dias perdidos (desde o início) | Breve descrição do acidente e/ou observações |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   | ___/___/___                |                              |                   | ___/___/___               |                                    |                                              |
|                   | ___/___/___                |                              |                   | ___/___/___               |                                    |                                              |
|                   | ___/___/___                |                              |                   | ___/___/___               |                                    |                                              |
|                   | ___/___/___                |                              |                   | ___/___/___               |                                    |                                              |
|                   | ___/___/___                |                              |                   | ___/___/___               |                                    |                                              |
|                   | ___/___/___                |                              |                   | ___/___/___               |                                    |                                              |
|                   | ___/___/___                |                              |                   | ___/___/___               |                                    |                                              |
|                   | ___/___/___                |                              |                   | ___/___/___               |                                    |                                              |
|                   | ___/___/___                |                              |                   | ___/___/___               |                                    |                                              |

|                     |
|---------------------|
| Observações gerais: |
|---------------------|

|                      |                       |                     |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Preparado por: _____ | Verificado por: _____ | Aprovado por: _____ |
|----------------------|-----------------------|---------------------|







## ACIDENTES DE TRABALHO E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL

**Empreitada:**

**Ref.<sup>a</sup>:**

[illegible][illegible]

- |                                                                |                                                                                           |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Ano a que respeita a informação                            | (10) N.º de dias de trabalho perdidos nos acidentes com 3 ou menos dias de baixa          | (19) Índice de Gravidade dos acidentes mortais e não mortais                             |
| (2) Mês a que respeita a informação                            | (11) N.º de dias de trabalho perdidos nos acidentes com mais 3 de dias de baixa           | (20) Índice de Gravidade dos acidentes mortais e não mortais com mais de 3 dias de baixa |
| (3) N.º médio de pessoas na obra, incluindo técnicos e adm.    | (12) N.º total de dias perdidos com todos acidentes não mortais, com baixa                | (21) Índice de Duração de todos os acidentes não mortais com 1 ou mais dias de baixa     |
| (4) N.º total de pessoas-horas trabalhadas no mês              | (13) Índice de Incidência dos acidentes mortais e não mortais                             | (22) Índice de Duração dos acidentes não mortais com mais de 3 dias de baixa             |
| (5) N.º acidentes mortais ocorridos no mês                     | (14) Índice de Incidência dos acidentes mortais e não mortais com 1 ou mais dias de baixa |                                                                                          |
| (6) N.º acidentes não mortais sem baixa                        | (15) Índice de Incidência dos acidentes mortais e não mortais com mais de 3 dias de baixa |                                                                                          |
| (7) N.º acidentes não mortais com 1 ou mais dias de baixa      | (16) Índice de Frequência dos acidentes mortais e não mortais                             |                                                                                          |
| (8) N.º acidentes não mortais com mais de 3 dias de baixa      | (17) Índice de Frequência dos acidentes mortais e não mortais com 1 ou mais dias de baixa |                                                                                          |
| (9) N.º total de acidentes de trabalho (Mortais e não mortais) | (18) Índice de Frequência dos acidentes mortais e não mortais com mais de 3 dias de baixa |                                                                                          |
- Notas:** a) Os índices apresentados referem-se a valores acumulados;

b) Consideram-se todos os acidentes declarados às Companhias de Seguros;

c) O n.º de dias perdidos não inclui o dia do acidente e o dia de regresso ao trabalho;

d) Consideram-se dias de trabalho e não dias de calendário.





**Notas:** a) Os índices apresentados referem-se a valores acumulados;  
b) Consideram-se todos os acidentes declarados às Companhias de Seguros;  
c) O n.º de dias perdidos não inclui o dia do acidente e o dia de regresso ao trabalho.  
d) Consideram-se dias de trabalho e não dias de calendário

Logotipo do  
Dono da Obra

## ACIDENTES DE TRABALHO E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL

Empreitada:

Ref.ª:

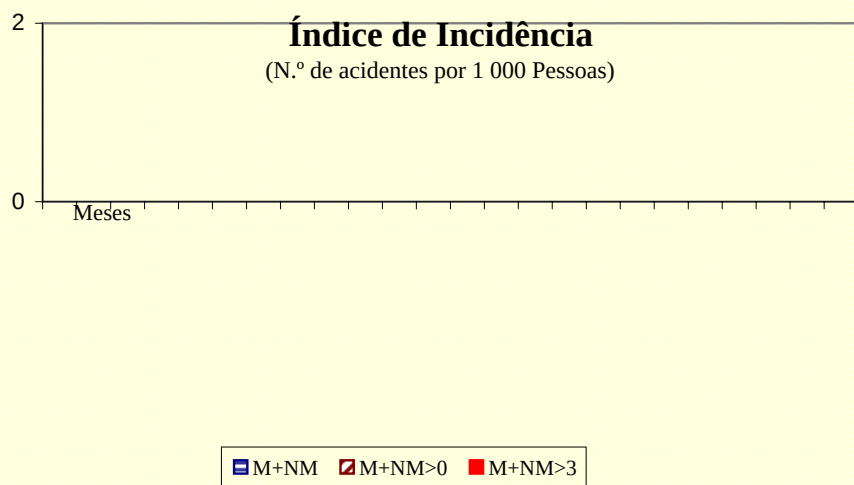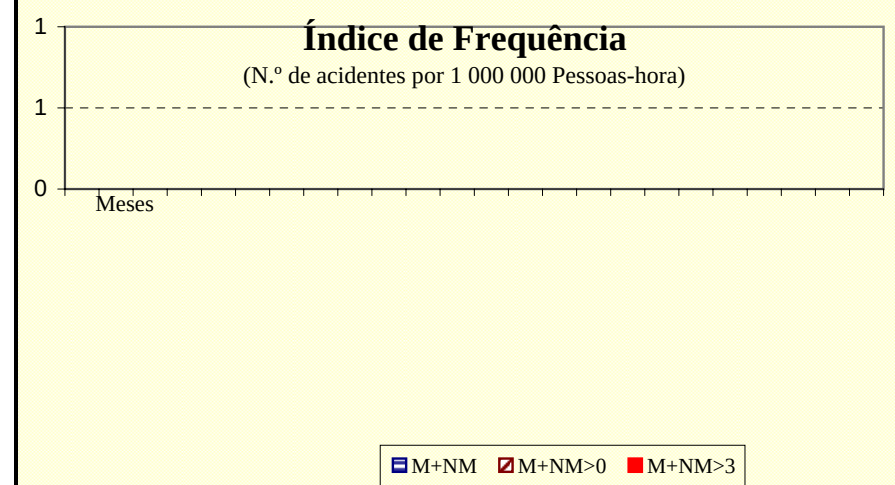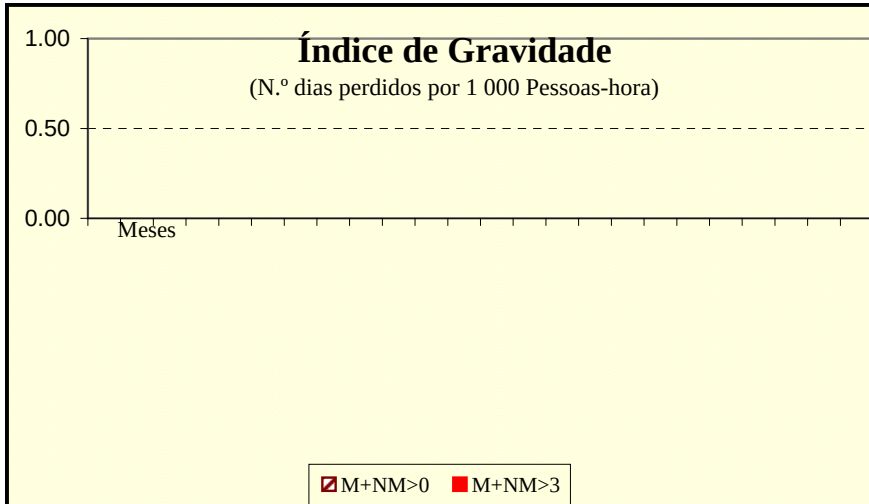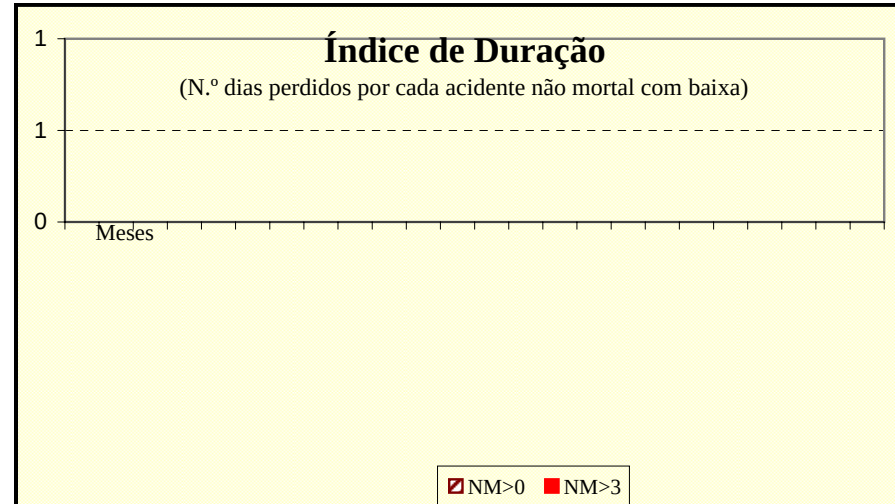

|                                     |                                                       |  |         |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------|------------|
| <b>Logotipo do<br/>Dono da Obra</b> | <b>MONITORIZAÇÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO</b> |  | Número: | Pág.:<br>/ |
|                                     | Dono da Obra:                                         |  |         |            |
|                                     | Empreitada:                                           |  |         |            |
|                                     | Empreiteiro:                                          |  |         |            |

**Notas:** a) Nos casos aplicáveis, considerar os dados relativos ao último dia do mês;  
b) Todos os dados devem incluir informação relativa ao empreiteiro, subempreiteiros, subcontratados de cedência de mão-de-obra, e sucessivas cadeias de subcontratação.

**Mês / Ano**

/

### DADOS GERAIS REPORTADOS AO MÊS EM CAUSA

|                                                                                                                |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organograma nominal funcional está atualizado ? <input type="checkbox"/> Sim; <input type="checkbox"/> Não     | Plano de trabalhos aprovado está a ser cumprido ? <input type="checkbox"/> Sim; <input type="checkbox"/> Não |
| Definição de funções da equipa técnica atualizada ? <input type="checkbox"/> Sim; <input type="checkbox"/> Não | Trabalhos estão <input type="checkbox"/> Atrasados / <input type="checkbox"/> Adiantados dias calendário     |
| N.º total de trabalhadores no estaleiro:                                                                       | N.º de trabalhos relevantes em curso ou realizados:                                                          |
| N.º total de trabalhadores do empreiteiro:                                                                     | N.º de Instruções de Trabalho elaboradas:                                                                    |
| N.º total de trabalhadores de subempreiteiros:                                                                 | N.º de Planos de Monitorização e Prevenção elaborados:                                                       |
| N.º total de trabalhadores independentes:                                                                      | N.º de registos de monitorização e prevenção elaborados:                                                     |
| N.º de trabalhadores que pernoitam no estaleiro:                                                               | N.º de não conformidades levantadas (registos abertos):                                                      |
| N.º de subempreiteiros no estaleiro:                                                                           | N.º de não conformidades resolvidas (registos fechados):                                                     |
| N.º de sub-subempreiteiros no estaleiro:                                                                       | N.º de acidentes de trabalho declarados às Seguradoras:                                                      |
| N.º de subcontratos de Empresas de Trabalho Temporário:                                                        | N.º ações formação/informação efetuadas e registadas:                                                        |
| N.º de sub-subcontratos de empresas Trab. Temp.:                                                               | N.º auditorias internas/Inspeções efetuadas e registadas                                                     |
| N.º de outros subcontratados (por ex. serviços):                                                               | N.º de Autos de Notícia levantadas pela ACT                                                                  |
| N.º de apólices de seguro de acidentes de trabalho:                                                            |                                                                                                              |
| N.º de equipamentos de apoio objeto de controlo (S13):                                                         |                                                                                                              |

### ACONTECIMENTOS MAIS RELEVANTES OCORRIDOS DURANTE O MÊS NO ÂMBITO DA SST

(Caso necessário, anexe folha com a informação aqui requerida, assinalando tal facto. Sem prejuízo de outras informações que o Empreiteiro considere relevantes, podem considerar-se referências a reuniões de Comissões de Segurança e Saúde, acidentes de trabalho graves ocorridos, razões de incumprimento de situações previstas, etc.).

### DOCUMENTOS APRESENTADOS EM ANEXO

|                                                                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Documento com acontecimentos mais relevantes                   | <input type="checkbox"/> Lista de Planos de Monitorização e Prevenção (índice de S15)   |
| <input type="checkbox"/> Registo de identificação trabalhadores e inspeção médica (S09) | <input type="checkbox"/> Lista Registos de Monitorização e Prevenção (índice de S16)    |
| <input type="checkbox"/> Lista de distribuição de EPI e informação sobre riscos (S10)   | <input type="checkbox"/> Lista de registos de não conformidades (índice de S17)         |
| <input type="checkbox"/> Controlo de subempreiteiros (S11)                              | <input type="checkbox"/> Resumo mensal da situação dos acidentes de trabalho (S19)      |
| <input type="checkbox"/> Registo de apólices de seguro de acidentes de trabalho (S12)   | <input type="checkbox"/> Registo de acidentes e índices de sinistralidade laboral (S20) |
| <input type="checkbox"/> Controlo de equipamentos de apoio e acessórios (S13)           | <input type="checkbox"/>                                                                |
| <input type="checkbox"/> Controlo de receção de MT e EQ (índice de S14)                 | <input type="checkbox"/>                                                                |

### DECLARAÇÃO

Declaramos que os dados acima apresentados e bem assim a informação anexa a este documento correspondem à situação verificada em obra os quais podem ser comprovados através de registos que mantemos de forma organizada e permanentemente atualizada em nosso poder.

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Responsável do Empreiteiro pela SST | Diretor Técnico da Empreitada     |
| Data:     /     /     Ass.: _____   | Data:     /     /     Ass.: _____ |







RUA LUÍS CRISTINO DA SILVA, LOTE 248-2º 98E • 1950-172 LISBOA – PORTUGAL  
TELEFONE: (+351) 218 310 320 • FAX: (+351) 218 597 070

[engidro@engidro.pt](mailto:engidro@engidro.pt) • [www.engidro.pt](http://www.engidro.pt)
