
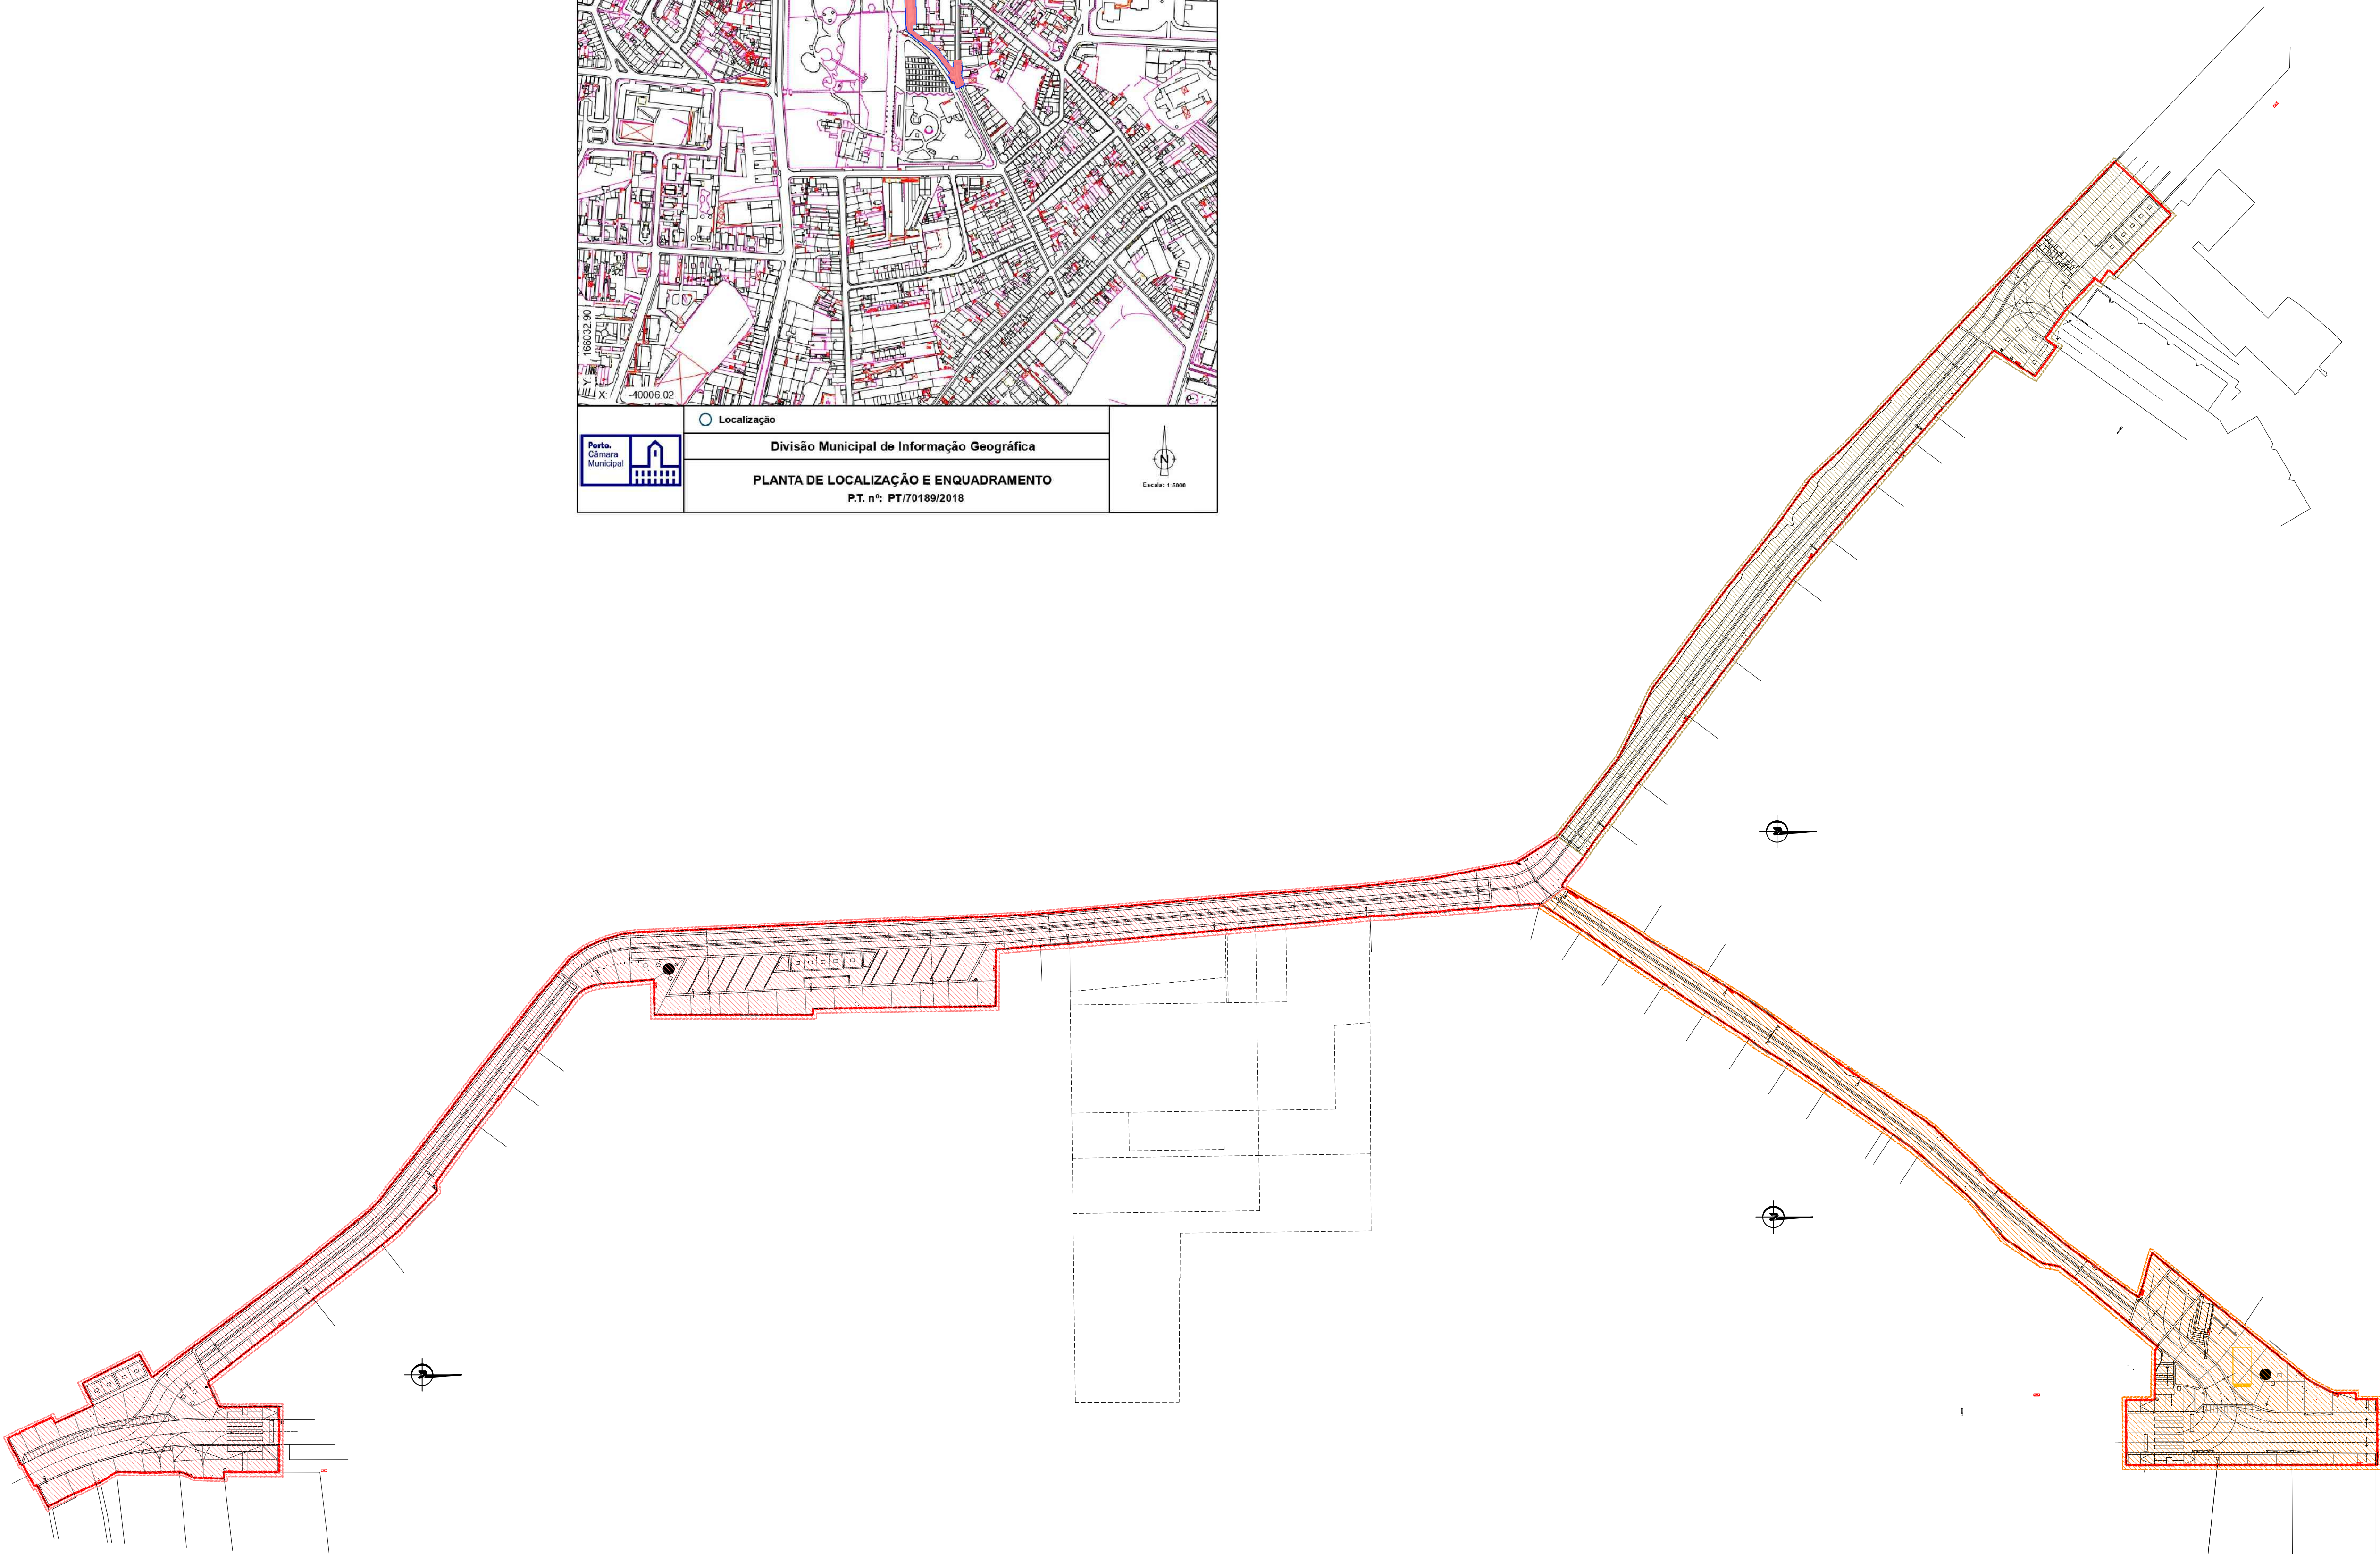


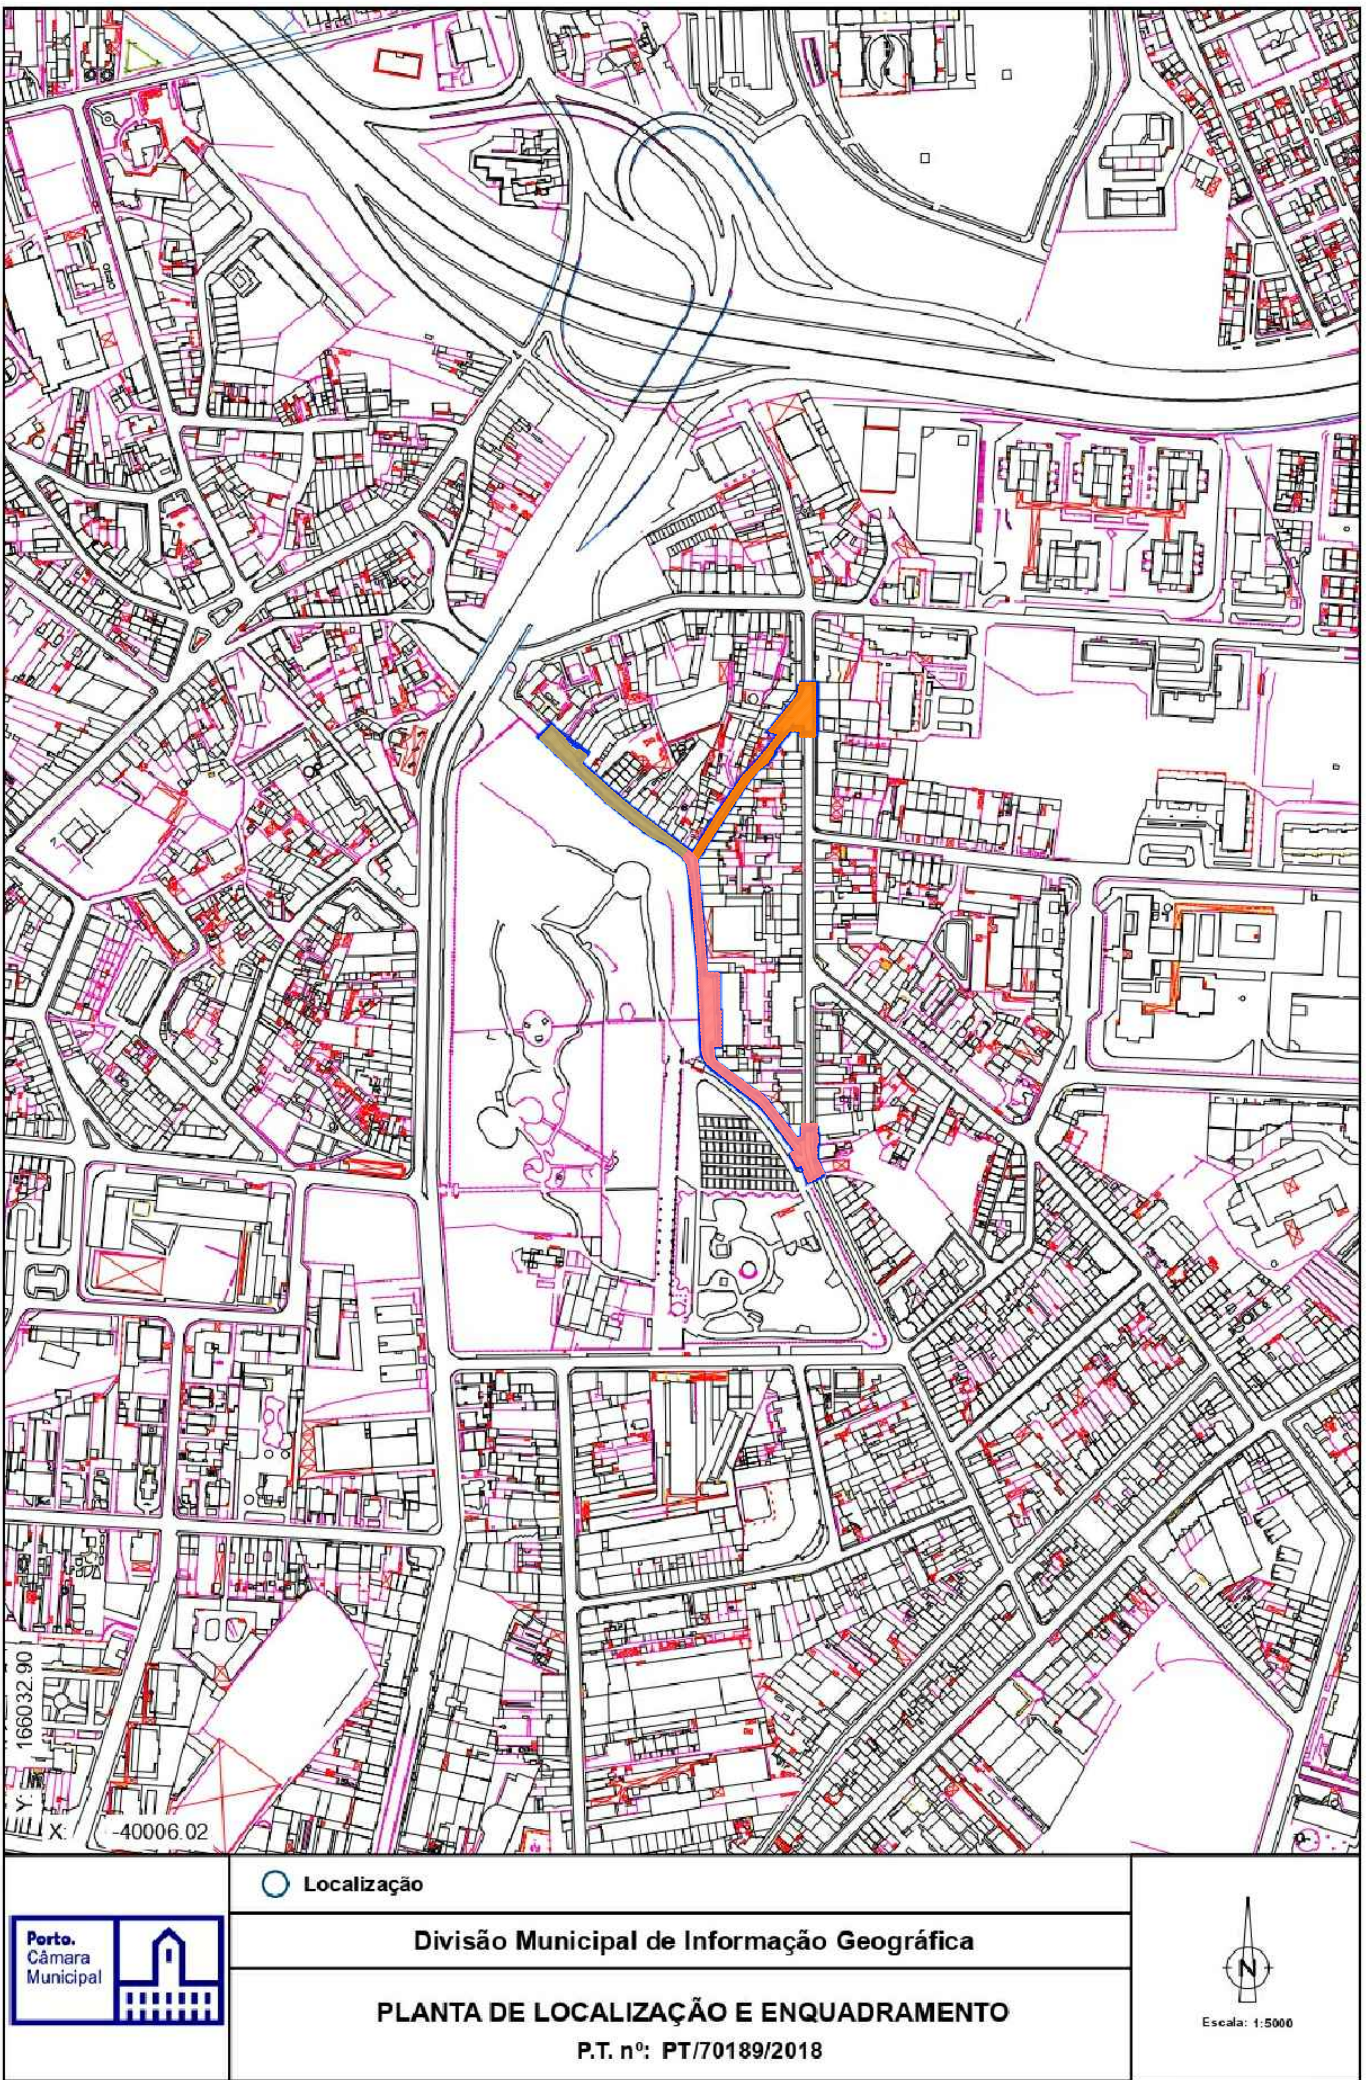

FASEAMENTO CONSTRUTIVO
O faseamento dos condicionamentos de trânsito e pressupostos a cumprir na elaboração do plano de sinalização de caráter temporário da presente empreitada.

Considerações gerais

- Deverá ser apresentado projeto sinalização de caráter temporário com os desvios propostos e a respetiva sinalização temporária com painéis e setas de desvios.
- No início de cada fase (primeira semana) poderá ser necessário o acompanhamento policial a fim de garantir a fluidez do tráfego. O custo deste acompanhamento terá de estar integrado no custo de manutenção de estaleiro.
- Caso se verifiquem dificuldades na circulação do trânsito, poderá ser necessário retomar o acompanhamento policial.
- No decurso das fases de trabalho o Município poderá ser forçado a suspender os trabalhos caso para o local em causa esteja previsto algum evento ou ocorra algum fenómeno da natureza, súbito, fortuito e inesperado (aluvimento, derrocada de fachada etc).

As diferentes fases deverão ser efetuadas de uma forma sequencial, não podendo ser iniciada a fase seguinte sem a anterior estar concluída.

Fase 1: Rua do Monte de São João

- Os trabalhos deverão ser efetuados à meia faixa entre a Calçada do Monte de São João e o Bairro do Monte de São João;
- Entre o Bairro do Monte de São João e a Travessa do Monte de São João, com corte total de via, exceto acesso a moradores e serviços.

Fase 2: Travessa do Monte de São João (lado Sul), entre a Rua do Monte de São João e a Rua Álvaro Castelões

- Na Travessa do Monte de São João com corte total de via, exceto acesso a moradores e serviços;
- Na Rua Álvaro Castelões, os trabalhos deverão ser efetuados à meia faixa.

Fase 3: Travessa do Monte de São João (lado Norte), entre a Rua do Monte de São João e a Rua Álvaro Castelões

- Na Travessa do Monte de São João com corte total de via, exceto acesso a moradores e serviços;
- Na Rua Álvaro Castelões, os trabalhos deverão ser efetuados à meia faixa.

- FASE 01**
Rua do Monte de São João
- FASE 02**
Travessa do Monte de São João (lado Sul), entre a Rua do Monte de São João e a Rua Álvaro Castelões
- FASE 03**
Travessa do Monte de São João (lado Norte), entre a Rua do Monte de São João e a Rua Álvaro Castelões
- Limite da Área de Intervenção (Superfície = 3 756.16 m2)**

Revisão n.º	Descrição da matéria revista	Data da revisão
-------------	------------------------------	-----------------

Dono da obra	Gestão e Obras do Porto, EM
Designação da obra	Programa Rua Direita – Grupos 3, 4, 5 e 6 – Lote 3 _ Projeto 4.4
Local	Rua do Monte de São João e Travessa do Monte de São João

Equipa Projetista	A. Cesário C. Moreira, arquiteto + DAJ - engenheiros associados, sociedade unipessoal, Lda, em consórcio
	CMCE arquitetos
	DAJ
	Rua do Campo Alegre n. 606, apt 701 - 4150 - 171 PORTO Tel+ fax 226956023 cmce@cmcearquitectos.com
	Av. Dr. Antunes Guimarães, 235 4100-079 Porto T/F: 224915360 geral@grupo-daj.com • www.grupo-daj.com

Notas	Este desenho contém, de modo mais explícito a em desenho autónomo, a proposta de faseamento de realização da obra que consta nos elementos que integram o Projeto de Execução já entregue.
Fase do projeto	PROJETO DE EXECUÇÃO - REVISÃO 02
Especialidade	PROJETO DE ARQUITETURA
Designação do desenho	FASEAMENTO DA REALIZAÇÃO DA OBRA
Escala	1/5000 e 1/1000
