



CADERNO DE ENCARGOS
AJUSTE DIRETO N.º 42-2020 UALG

[Assinatura
Qualificada]
Paulo Manuel
Roque Águas

Assinado de forma
digital por [Assinatura
Qualificada] Paulo
Manuel Roque Águas
Dados: 2020.11.05
17:10:31 Z

**EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR DO
BALCÃO DO ESTUDANTE**

Índice

CAPÍTULO I	5
DISPOSIÇÕES GERAIS	5
CLÁUSULA 1. ^a	5
<i>Objeto</i>	5
CLÁUSULA 2. ^a	5
<i>Entidade adjudicante</i>	5
CLÁUSULA 3. ^a	5
<i>Disposições por que se rege a empreitada</i>	5
CLÁUSULA 4. ^a	6
<i>Interpretação dos documentos que regem a empreitada</i>	6
CLÁUSULA 5. ^a	7
<i>Representação do empreiteiro</i>	7
CLÁUSULA 6. ^a	8
<i>Representação da Universidade do Algarve</i>	8
CLÁUSULA 7. ^a	8
<i>Esclarecimento de dúvidas</i>	8
CLÁUSULA 8. ^a	8
<i>Inspeção ao local</i>	8
CLÁUSULA 9. ^a	9
<i>Livro de registo da obra</i>	9
CLÁUSULA 10. ^a	9
<i>Projeto</i>	9
CAPÍTULO II	10
OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO	10
SECÇÃO I	10
PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS.....	10
CLÁUSULA 11. ^a	10
<i>Preparação e planeamento da execução da obra</i>	10
CLÁUSULA 12. ^a	11
<i>Obrigações gerais do empreiteiro quando à execução da empreitada</i>	11
CLÁUSULA 13. ^a	13
<i>Plano de trabalhos ajustado</i>	13
CLÁUSULA 14. ^a	14
<i>Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos</i>	14
SECÇÃO II	15
PRAZOS DE EXECUÇÃO.....	15
CLÁUSULA 15. ^a	15
<i>Prazo de execução da empreitada</i>	15
CLÁUSULA 16. ^a	16
<i>Cumprimento do plano de trabalhos</i>	16
CLÁUSULA 17. ^a	17
<i>Sanção por violação dos prazos contra tuais</i>	17
CLÁUSULA 18. ^a	17
<i>Atos e direitos de terceiros</i>	17
SECÇÃO III	17
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA.....	17
CLÁUSULA 19. ^a	17

<i>Condições gerais de execução dos trabalhos</i>	17
CLÁUSULA 20. ^a	18
<i>Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção</i>	18
CLÁUSULA 21. ^a	19
<i>Materiais e elementos de construção pertencentes à Universidade do Algarve</i>	19
CLÁUSULA 22. ^a	19
<i>Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção</i>	19
CLÁUSULA 23. ^a	20
<i>Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção</i>	20
CLÁUSULA 24. ^a	20
<i>Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção</i>	20
CLÁUSULA 25. ^a	20
<i>Aplicação dos materiais e elementos de construção</i>	20
CLÁUSULA 26. ^a	21
<i>Substituição dos materiais e elementos de construção</i>	21
CLÁUSULA 27. ^a	21
<i>Depósito dos materiais e elementos de construção não destinados à obra</i>	21
CLÁUSULA 28. ^a	21
<i>Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos</i>	21
CLÁUSULA 29. ^a	22
<i>Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro</i>	22
CLÁUSULA 30. ^a	23
<i>Menções obrigatórias no local dos trabalhos da empreitada</i>	23
CLÁUSULA 31. ^a	23
<i>Ensaios</i>	23
CLÁUSULA 32. ^a	24
<i>Medições</i>	24
CLÁUSULA 33. ^a	24
<i>Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados</i>	24
CLÁUSULA 34. ^a	25
<i>Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra</i>	25
SECÇÃO IV	25
PESSOAL	25
CLÁUSULA 35. ^a	25
<i>Obrigações gerais</i>	25
CLÁUSULA 36. ^a	26
<i>Horário de trabalho</i>	26
CLÁUSULA 37. ^a	26
<i>Segurança, higiene e saúde no trabalho</i>	26
SECÇÃO V	27
SEGUROS	27
CLÁUSULA 38. ^a	27
<i>Contratos de seguro</i>	27
CLÁUSULA 39. ^a	28
<i>Objeto dos contratos de seguro</i>	28
CAPÍTULO III	28
OBRIGAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE	28
CLÁUSULA 40. ^a	28
<i>Preço e condições de pagamento</i>	28
CLÁUSULA 41. ^a	29
<i>Adiantamentos ao empreiteiro</i>	29
CLÁUSULA 42. ^a	30

<i>Reembolso dos adiantamentos</i>	30
CLÁUSULA 43. ^a	31
<i>Caução</i>	31
CLÁUSULA 44. ^a	31
<i>Mora no pagamento</i>	31
CLÁUSULA 45. ^a	31
<i>Revisão de preços</i>	31
CAPÍTULO IV	31
RECEÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA	31
CLÁUSULA 46. ^a	31
<i>Receção provisória</i>	31
CLÁUSULA 47. ^a	32
<i>Prazo de garantia</i>	32
CLÁUSULA 48. ^a	33
<i>Receção definitiva</i>	33
CAPÍTULO V	33
DISPOSIÇÕES FINAIS	33
CLÁUSULA 49. ^a	34
<i>Deveres de colaboração recíproca e informação</i>	34
CLÁUSULA 50. ^a	34
<i>Subcontratação e cessão da posição contratual</i>	34
CLÁUSULA 51. ^a	35
<i>Resolução do contrato pela Universidade do Algarve</i>	35
CLÁUSULA 52. ^a	36
<i>Resolução do Contrato pelo empreiteiro</i>	36
CLÁUSULA 53. ^a	37
<i>Força maior</i>	37
CLÁUSULA 54. ^a	39
<i>Foro competente</i>	39
CLÁUSULA 55. ^a	39
<i>Comunicações e notificações</i>	39
CLÁUSULA 56. ^a	39
<i>Contagem dos prazos</i>	39
CLÁUSULA 57. ^a	39
<i>Legislação aplicável</i>	39
ANEXO RGPD	40
REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS	40

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Cláusula 1.^a

Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no Contrato a celebrar com a Universidade do Algarve no âmbito do procedimento de ajuste direto que tem por objeto a realização da “Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante”, de acordo com as condições estabelecidas e constantes deste Caderno de Encargos e respetivos Anexos que o integram.
2. De acordo com a nomenclatura de referência aplicável aos Contratos Públicos CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.º 2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 213/2008 de 28 de novembro de 2007, o presente procedimento tem a seguinte classificação: 45233200-1 Obras diversas de pavimentação.

Cláusula 2.^a

Entidade adjudicante

3. A entidade pública adjudicante é a Universidade do Algarve, NIF 505 387 271, sita no *Campus* da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro, com os números de telefone (+ 351) 289 800 106 e telefax (+ 351) 289 888 401 e com o endereço eletrónico: contratacao publica@ualg.pt. Horário de Funcionamento (dias úteis): das 9:00 horas às 12:30 horas e das 14:00 horas às 17:30 horas.

Cláusula 3.^a

Disposições por que se rege a empreitada

1. A execução do Contrato obedece:
 - a) Às cláusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
 - b) Ao Código dos Contratos Públicos, doravante designado por CCP;
 - c) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar;
 - d) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, gestão de resíduos de construção e demolição, à revisão de preços, às

- instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros;
- e) Às regras da boa arte.
2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96.º do CCP:
- a) O clausulado contratual e seus anexos, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código;
 - b) Os suprimentos de erros e omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes e pelo órgão competente para a decisão de contratar, desde que esses trabalhos tenham sido expressamente aceites por este órgão;
 - c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
 - d) O presente Caderno de Encargos, integrado pelas cláusulas contratuais e pelo projeto de execução;
 - e) A Proposta Adjudicada;
 - f) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo empreiteiro;
 - g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de Encargos.

Cláusula 4.ª

Interpretação dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da cláusula anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem em que são aí indicados.
2. Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos e o Projeto de Execução, prevalece o primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução da empreitada e o segundo em tudo o que respeita à definição da própria obra.
3. No caso de divergência entre as várias peças do Projeto de Execução:
 - a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às características dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes;
 - b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere à natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do disposto no artigo 50.º do CCP e sem prejuízo da remissão direta que estes elementos fizerem para outras peças;
 - c) Em tudo o mais prevalece o que constar na memória descritiva e nas restantes peças do Projeto de Execução.

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da cláusula anterior e o Contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo como disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código.

Cláusula 5.ª

Representação do empreiteiro

1. Durante a execução do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra com a qualificação mínima de engenheiro técnico, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.
2. Após a assinatura do Contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificação técnica, devendo esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direção técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e assiduidade.
3. As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da empreitada são dirigidos diretamente ao diretor de obra.
4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.
5. A Universidade do Algarve poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razões objetivas e ou inerentes à atuação profissional do diretor de obra durante a execução dos trabalhos da empreitada.
6. Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, perante o diretor de fiscalização da obra, pela marcha dos trabalhos.
7. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta aplicação do Plano de Segurança e Saúde.
8. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e demolição.

Cláusula 6.^a**Representação da Universidade do Algarve**

1. Durante a execução da empreitada a Universidade do Algarve é representada por um diretor de fiscalização acumulando a função de gestor do contrato em conformidade com o artigo 290.º-A do CCP, salvo nas matérias referidas na parte final do n.º 3 da presente Cláusula.
2. A Universidade do Algarve notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização que designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação.
3. O diretor de fiscalização da obra tem poderes de representação da Universidade do Algarve em todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, excetuando as matérias de modificação, resolução ou revogação do Contrato, e ainda outras que, eventualmente venham a ser comunicadas pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

Cláusula 7.^a**Esclarecimento de dúvidas**

1. As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do início da execução dos trabalhos a que respeitam e, bem assim, dos trabalhos que estejam relacionados com aqueles ou em que aqueles possam influir.
2. No caso das dúvidas surgirem somente após o início da execução dos trabalhos referidos no número anterior, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de fiscalização, juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução.
3. O incumprimento do disposto no número anterior, bem como a inexistência de razões técnicas ou outras de natureza diversa atendíveis para justificar a submissão tardia dos pedidos de esclarecimento, torna o empreiteiro responsável por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cláusula 8.^a**Inspeção ao local**

Com a assinatura do Contrato, o empreiteiro reconhece e declara expressamente ter realizado uma inspeção ao local e ter efetuado todos os levantamentos e estudos que considerou necessários à boa e completa execução dos trabalhos compreendidos na empreitada, tendo por

isso conhecimento integral dos locais, suas características, do solo e subsolo onde serão realizados os trabalhos da empreitada.

Cláusula 9.^a

Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalização, contendo uma informação sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.
2. Sem prejuízo do disposto no artigo 345.º do CCP, deverão ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os factos relevantes relacionados com a execução dos trabalhos que constituem o objeto da empreitada, designadamente os que respeitem a reclamações apresentadas pelo empreiteiro, modificações do programa de trabalhos, suspensões de trabalhos, fixação de novos preços, prorrogações contratuais e aplicação de sanções, bem como a ele deverão ser apensos os boletins com os resultados dos ensaios efetuados pelo empreiteiro e pela fiscalização.
3. O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverá apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalização ou por entidades oficiais com jurisdição sobre os trabalhos.

Cláusula 10.^a

Projeto

1. O Projeto de Execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no procedimento.
2. O conjunto de peças patenteadas no presente procedimento é o seguinte:

Caderno de Encargos

Disposições Gerais

Projeto de Execução

Memória Descritiva

Peças Desenhadas (9 peças)

Mapa de Quantidades de Trabalho

Mapa de Medições

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

Ficha de Segurança e Saúde

Capítulo II

Obrigações do empreiteiro

Secção I

Preparação e planeamento dos trabalhos

Cláusula 11.^a

Preparação e planeamento da execução da obra

1. O empreiteiro é responsável:
 - a) Perante a Universidade do Algarve pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da empreitada, incluindo das tarefas e trabalhos realizados por subcontratados, bem como pela preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Segurança e Saúde, e no plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição;
 - b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como pela aplicação do documento indicado na alínea h) do n.º 4 da presente cláusula.
2. O empreiteiro deverá assegurar perante a Universidade do Algarve que todos os trabalhos compreendidos na empreitada objeto do Contrato a celebrar e detalhados no presente Caderno de Encargos são realizados de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, e com os demais termos e condições e especificações técnicas estabelecidos neste Caderno Encargos e nos restantes documentos contratuais, cabendo-lhe assegurar a disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da empreitada e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da empreitada, designadamente:
 - a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;
 - b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na empreitada, ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos edifícios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho;

- c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;
 - d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
 - e) Trabalhos de triagem, reutilização, remoção e encaminhamento para valorização e eliminação de resíduos de construção e demolição produzidos em obra em consequência da implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.
4. A preparação e o planeamento da execução da empreitada compreendem ainda:
- a) A apresentação pelo empreiteiro à Universidade do Algarve de quaisquer dúvidas relativas aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;
 - b) O esclarecimento dessas dúvidas à Universidade do Algarve;
 - c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a trabalhos complementares que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 378.º do CCP, sem prejuízo do direito de o empreiteiro apresentar reclamação relativamente aos erros e omissões que só lhe seja exigível detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.º 3 do artigo 50.º do CCP;
 - d) A apreciação e decisão pela Universidade do Algarve das reclamações a que se refere a alínea anterior;
 - e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na realização dos trabalhos;
 - f) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.º 3 do artigo 361.º do CCP;
 - g) A aprovação pela Universidade do Algarve do documento referido na alínea f);
 - h) A elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prático do Plano de Segurança e Saúde, na fase de projeto é da responsabilidade da Universidade do Algarve, devendo o empreiteiro, analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas, em função do sistema utilizado para a execução da obra, em particular as tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;
 - i) A implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.

Cláusula 12.^a

Obrigações gerais do empreiteiro quando à execução da empreitada

1. O empreiteiro compromete-se ainda a:

- a) Fornecer os meios materiais e humanos que sejam necessários e adequados à completa e perfeita execução do Contrato a celebrar nos termos contratados;
- b) Proceder com a diligência necessária, nomeadamente no que respeita à recolha da informação prévia indispensável, à planificação das circunstâncias de modo, tempo e lugar, à ordenação dos meios e, em geral, à antecipação das situações relevantes para a execução da empreitada, de modo a salvaguardar que os mesmos são feitos nos termos contratados, sem suspensões ou falhas que pudessem ter sido previstas;
- c) Assumir os riscos inerentes ou relacionados com a realização da empreitada e, bem assim, com o fornecimento dos bens e equipamentos necessários à prestação dos mesmos;
- d) Garantir, a todo o tempo, a adequada articulação e compatibilização entre os trabalhos da empreitada, de acordo com o fim a que se destinam, e a atividade e sistemas da Universidade do Algarve que com eles estejam ou possam estar em relação, de modo a não afetar negativamente a regular prestação dos serviços que constituem a atividade principal da Universidade do Algarve;
- e) Não alterar as condições da realização da empreitada fora dos casos expressamente previstos no presente Caderno de Encargos;
- f) Executar os trabalhos compreendidos na empreitada de acordo com aqueles que sejam, em cada momento, os procedimentos e técnicas mais atuais, completos e funcionais;
- g) Observar e garantir a confidencialidade relativamente a toda a informação a que venha a ter acesso, no âmbito ou em virtude do Contrato a celebrar;
- h) Comunicar à Universidade do Algarve, de imediato e por escrito, qualquer circunstância que possa condicionar ou influir na regular execução das prestações objeto do Contrato a celebrar e, em particular, qualquer alteração à sua situação jurídica ou comercial, bem como dos seus colaboradores afetos à realização dos trabalhos da empreitada;
- i) Prestar, de forma correta, atempada e fidedigna, todos os esclarecimentos e informações que razoavelmente lhe sejam solicitados pela Universidade do Algarve;
- j) Responder perante a Universidade do Algarve por quaisquer deficiências, defeitos, desconformidades nos trabalhos e na obra compreendidos na empreitada, qualquer que seja a sua origem ou o momento em que sejam detetados, com exceção daqueles a que, exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve tenha dado causa;
- k) Em geral, efetuar a obra e realizar os trabalhos da empreitada de acordo com as melhores práticas e com elevada qualidade, eficiência, adequação e suficiência, atendendo ao fim a que se destinam, praticando todos os atos necessários ao bom cumprimento das obrigações para si emergentes do Contrato a celebrar.

2. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a empreitada.
3. A faculdade de fiscalização da execução do Contrato por parte da Universidade do Algarve não afasta ou diminui a responsabilidade do empreiteiro na sua execução.
4. Caso a Universidade do Algarve venha a ser demandada ou a incorrer em responsabilidade, de qualquer natureza, perante terceiros, com causa, direta, ou indireta, em quaisquer deficiências, erros ou omissões detetadas nas obras objeto da empreitada, ou na realização da empreitada imputáveis ao empreiteiro, ou a terceiros por si contratados, este obriga-se a indemnizar a Universidade do Algarve por todas as despesas que, em consequência, esta haja de fazer e por todas e quaisquer quantias que tenha de desembolsar, seja a que título for.
5. O empreiteiro responderá igualmente pelo risco, por quaisquer danos e prejuízos causados no âmbito da execução das prestações objeto do Contrato a celebrar, a Universidade do Algarve ou a terceiros, resultantes de circunstâncias fortuitas ou imprevisíveis ou de quaisquer outras, com exceção daquelas a que, exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve tenha dado causa.
6. Caberá ao empreiteiro proceder ainda à elaboração e fornecimento de 1 (um) exemplar em formato digital e 1 (um) exemplar em papel, das telas finais de todas as especialidades objeto de alteração, bem como o fornecimento, de todos os elementos necessários à elaboração da compilação técnica da obra até à receção provisória.

Cláusula 13.^a

Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebração do Contrato, a Universidade do Algarve pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignação, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboração da proposta.
2. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação do plano final de consignação, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessário, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.º do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboração a metodologia fixada no presente Caderno de Encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual, nem a alteração do prazo de conclusão da empreitada nem ainda alterações aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de consignação.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
 - a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à programação;
 - b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão de obra necessária, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;
 - c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;
 - d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente Caderno de Encargos, que serão mobilizados para a realização da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pela Universidade do Algarve, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cláusula 14.^a

Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. A Universidade do Algarve pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos, em vigor, por razões de interesse público.
2. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do Contrato, se for caso disso, em função dos danos sofridos em consequência dessa modificação, mediante reclamação a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.º 3 do artigo 354.º do CCP.
3. Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputável ao empreiteiro, deve este apresentar a Universidade do Algarve um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuízo do número anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução da empreitada ou dos respetivos prazos parcelares, a Universidade do Algarve pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, a Universidade do Algarve pronuncia-se sobre as alterações propostas pelo empreiteiro, ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 da presente cláusula, no prazo de 10 (dez) dias, sendo equivalente a falta de pronúncia à aceitação do novo plano.
6. Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pela Universidade do Algarve desde que dele não resulte prejuízo para a obra ou prorrogação dos prazos de execução.
7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.

Secção II

Prazos de execução

Cláusula 15.ª

Prazo de execução da empreitada

1. O empreiteiro, obriga-se a:
 - a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial, ou ainda da data em que a Universidade do Algarve comunique ao empreiteiro a aprovação do Plano de Segurança e Saúde, caso esta última data seja posterior, sem prejuízo do plano de trabalhos aprovado;
 - b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em vigor;
 - c) Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da sua receção provisória no prazo de **30 (trinta) dias**, a contar da data da sua consignação ou da data em que a Universidade do Algarve comunique ao empreiteiro a aprovação do Plano de Segurança e Saúde, caso esta última data seja posterior.
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.
3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda à execução de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no Caderno de Encargos ou resulte de caso de força maior, pode a Universidade do Algarve exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de serviço a prestar pelos representantes da fiscalização.

4. Pela conclusão da execução da obra antes do prazo fixado não serão atribuídos prémios ao empreiteiro.
5. Se houver lugar à execução de trabalhos complementares, cuja execução prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusão da obra será prorrogado nos seguintes termos:
 - a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no Contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execução constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
 - b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo entre a Universidade do Algarve e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execução.
6. Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo contratual previsto na cláusula anterior, proceder-se-á de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 373.º do CCP.
7. Sempre que ocorra suspensão de trabalhos não imputável ao empreiteiro, considerar-se-ão automaticamente prorrogados, por período igual ao da suspensão, o prazo global da execução da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensão.

Cláusula 16.^a

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalização dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalização notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos, previstos no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, é aplicável o disposto no n.º 4 da cláusula 14.^a.

Cláusula 17.^a**Sanção por violação dos prazos contratuais**

1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da empreitada por facto imputável ao empreiteiro, a Universidade do Algarve pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 ‰ do preço contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execução da empreitada por facto imputável ao empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 1, sendo o montante da sanção contratual, aí prevista reduzido a metade.
3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por incumprimento dos prazos parciais de execução da obra, quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do Contrato.

Cláusula 18.^a**Atos e direitos de terceiros**

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da obra, a fim de a Universidade do Algarve ficar habilitada a tomar as providências necessárias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalização, para que este possa tomar as providências que julgue necessárias.

Secção III**Condições de execução da empreitada**Cláusula 19.^a**Condições gerais de execução dos trabalhos**

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da boa arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condições técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos documentos identificados nas cláusulas 3.^a e 10.^a.
3. O empreiteiro pode propor à Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a obra.

Cláusula 20.^a

Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construção a empregar na obra terão a qualidade, as dimensões, a forma e as demais características definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerâncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais não fixem as respetivas características, o empreiteiro não poderá empregar materiais ou elementos que não correspondam às características da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idêntica utilização.
3. No caso de dúvida quanto aos materiais e elementos de construção a empregar nos termos dos números anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compatíveis com o direito comunitário, ou, na falta desta, as normas utilizadas na União Europeia, ou, em alternativa a ambos, observar normas ou especificações que o empreiteiro demonstre cabalmente que satisfazem de modo equivalente as exigências definidas por aquelas normas, nesta última situação, os materiais deverão ser submetidos à aprovação da Universidade do Algarve.
4. Sem prejuízo do disposto nos artigos 50.º e 378.º do CCP, quando aplicáveis, nos casos previstos nos n.ºs 2 e 3 desta cláusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as características dos materiais e elementos de construção fixadas no projeto, ou nos restantes documentos contratuais, não são tecnicamente aconselháveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicará o facto a Universidade do Algarve e apresentará uma proposta de alteração fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessários, para a aplicação dos novos materiais e elementos de construção e para a execução dos trabalhos correspondentes.
5. A proposta prevista no número anterior deverá ser apresentada, de preferência, no período de preparação e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligências de aprovação não comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se a Universidade do Algarve, no prazo de 15 (quinze) dias, não se pronunciar sobre a proposta e não determinar a suspensão dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizará os materiais e elementos de construção previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alterações das características técnicas dos materiais e elementos de construção, ou o regime aplicável à sua eventual diminuição, é o regime definido no CCP.

Cláusula 21.^a

Materiais e elementos de construção pertencentes à Universidade do Algarve

1. Se a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na obra materiais ou elementos de construção que lhe pertençam ou provenientes de outras obras ou demolições, o empreiteiro será obrigado a fazê-lo, descontando-se, se for o caso disso, no preço da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preço dos trabalhos em que aqueles forem aplicados, sem prejuízo do disposto no artigo 381º do CCP.
2. O disposto no número anterior não será aplicável se o empreiteiro demonstrar já haver adquirido os materiais necessários para a execução dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Cláusula 22.^a

Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das características dos equipamentos, materiais e elementos de construção a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submetê-los-á à aprovação da Universidade do Algarve.
2. Em qualquer momento poderá o empreiteiro solicitar a referida aprovação, considerando-se a mesma concedida se a Universidade do Algarve não se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que implique o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo período de tempo, pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer a Universidade do Algarve as amostras de materiais e elementos de construção que este lhe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverão ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposição em contrário, os encargos com a realização dos ensaios correrão por conta da Universidade do Algarve.

Cláusula 23.^a

Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção

1. Se for negada a aprovação dos materiais e elementos de construção e o empreiteiro entender que a mesma deveria ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condições contratuamente estabelecidas, este poderá pedir a imediata colheita de amostras e apresentar a Universidade do Algarve reclamação fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.
2. A reclamação considera-se deferida se a Universidade do Algarve não notificar o empreiteiro da respetiva decisão nos 15 (quinze) dias subsequentes à sua apresentação, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.
3. Os encargos com os novos ensaios a que a reclamação do empreiteiro dê origem serão suportados pela parte que decair.

Cláusula 24.^a

Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construção para a obra, não podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstâncias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovação dos materiais e elementos de construção poderá o empreiteiro exigir que se colham amostras de quaisquer deles.
3. Se a modificação da qualidade dos materiais e elementos de construção resultar de causa imputável ao empreiteiro, este deverá substituí-los à sua custa.

Cláusula 25.^a

Aplicação dos materiais e elementos de construção

Os materiais e elementos de construção devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as especificações técnicas contratuamente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificações, as normas oficiais em vigor ou, se estas não existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pela Universidade do Algarve

Cláusula 26.^a**Substituição dos materiais e elementos de construção**

1. Serão rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituídos por outros com os necessários requisitos, os materiais e elementos de construção que:
 - a) Sejam diferentes dos aprovados;
 - b) Não sejam aplicados em conformidade com as especificações técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que não possam ser utilizados de novo.
2. As demolições e a remoção e substituição dos materiais e elementos de construção serão da exclusiva responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que não se verificam as hipóteses previstas no n.º 1 desta cláusula, poderá pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cláusula 27.^a**Depósito dos materiais e elementos de construção não destinados à obra**

O empreiteiro não poderá depositar nos estaleiros, sem autorização da Universidade do Algarve, materiais e elementos de construção que não se destinem à execução dos trabalhos da empreitada.

Cláusula 28.^a**Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos**

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalização quaisquer trabalhos complementares dos elementos da solução da obra por que se rege a execução dos trabalhos da empreitada.
2. O empreiteiro tem a obrigação de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados por escrito pela Universidade do Algarve, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessários para esse efeito, salvo quanto a este último aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigação pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execução.
3. Só pode ser ordenada ao empreiteiro a execução de trabalhos complementares que resultem de situações não previstas quando o somatório desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstâncias não previstas, não

- exceda 10 (dez) % do valor contratual, por aplicação da alínea b) do n.º 2 do artigo 370.º do CCP.
4. Só pode ser ordenada ao empreiteiro execução de trabalhos complementares que resultem de circunstâncias imprevisíveis quando o somatório desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstâncias imprevisíveis, não exceda 40 (quarenta) % do valor contratual, por aplicação da alínea b) do n.º 4 do artigo 370º do CCP.
 5. A Universidade do Algarve é responsável pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execução ordene ao empreiteiro.
 6. O empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignação, reclamar sobre a existência de erros ou omissões do caderno de encargos, salvo dos que só sejam detetáveis durante a execução da obra, sob pena de ser responsável por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissões
 7. O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissões que, não podendo objetivamente ser detetados na fase de formação do contrato, também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe fosse exigível a sua deteção.

Cláusula 29.^a

Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessários à sua perfeita apreciação.
2. Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória ou nota descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das eventuais implicações nos prazos e custos e, se for caso disso, peças desenhadas e cálculos justificativos e especificações da qualidade da mesma.
3. Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Universidade do Algarve e apreciadas pelo autor do projeto de execução no âmbito da assistência técnica que a este compete.

Cláusula 30.^a**Menções obrigatórias no local dos trabalhos da empreitada**

1. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do Dono da obra e do empreiteiro, com menção do respetivo Alvará ou número de Título de Registo ou outros documentos, e manter cópia dos Alvarás ou Títulos de Registo dos subcontratados ou dos documentos, consoante os casos, no local da empreitada.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da empreitada, em bom estado de conservação, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos, a respeitar na execução da empreitada, com as alterações que neles tenham sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da empreitada o horário de trabalho em vigor, bem como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicáveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos aí em curso.

Cláusula 31.^a**Ensaios**

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas características e comportamentos são os especificados no presente Caderno de Encargos (ensaios referidos nas condições técnicas gerais e especiais) e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando a Universidade do Algarve tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realização de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem insatisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a seu cargo, sendo, no caso contrário, por conta da Universidade do Algarve.

Cláusula 32.^a**Medições**

1. As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projeto e os trabalhos não devidamente ordenados pela Universidade do Algarve, são feitas no local da obra com a colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto.
2. As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao 8.º (oitavo) dia do mês imediatamente seguinte a que respeitam.
3. A realização das medições obedece aos seguintes critérios:
 - a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor;
 - b) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil;
 - c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a Universidade do Algarve e o empreiteiro.

Cláusula 33.^a**Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados**

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de a Universidade do Algarve ser demandada por infração na execução dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.
3. O disposto nos números anteriores não é, todavia, aplicável a materiais e a elementos ou processos de construção definidos neste Caderno de Encargos para os quais se torne indispensável o uso de direitos de propriedade industrial quando a Universidade do Algarve não indique a existência de tais direitos.
4. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existência dos direitos em causa, não iniciará os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da fiscalização, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Cláusula 34.^a**Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra**

1. A Universidade do Algarve reserva-se o direito de executar ela própria ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada e no mesmo local, quaisquer trabalhos não incluídos no Contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o diretor de fiscalização, de modo a evitar atrasos na execução do Contrato ou outros prejuízos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos no n.º 1, deve apresentar a sua reclamação no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorrência, a fim de serem adotadas as providências adequadas à diminuição ou eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles trabalhos.
4. No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
 - a) Prorrogação do prazo do Contrato por período correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realização da obra e;
 - b) Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do Contrato, que demonstre ter sofrido.

Secção IV**Pessoal**Cláusula 35.^a**Obrigações gerais**

1. São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem da Universidade do Algarve, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor

proibidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes da Universidade do Algarve, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.
4. As quantidades e a qualificação profissional da mão de obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Cláusula 36.º

Horário de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorização da Universidade do Algarve, se necessária, nos termos da legislação aplicável, e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalização.

Cláusula 37ª

Segurança, higiene e saúde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos números anteriores, o diretor de fiscalização pode tomar, à custa dele, as providências que se revelem necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização o exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.º 1 da cláusula 39.ª.
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização, pela observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra e às pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Secção V

Seguros

Cláusula 38.^a

Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o período de execução do contrato, as apólices de seguro previstas no presente Caderno de Encargos e na legislação aplicável, devendo exibir cópia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignação.
2. O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente secção, devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados.
3. A Universidade do Algarve pode exigir, em qualquer momento, cópias das apólices e dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secção ou na legislação aplicável, não sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibição destes documentos.
4. Todas as apólices de seguro, e respetivas franquias previstas, constituem encargo único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, a Universidade do Algarve reserva-se o direito de se substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou por ele suportados.
7. O empreiteiro obriga-se a manter as apólices de seguro válidas até à data da receção provisória da obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos à obra ou ao estaleiro, até à data que deixem de o estar.

Cláusula 39.^a**Objeto dos contratos de seguro**

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislação em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil profissional, responsabilidade civil automóvel cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria afetos à obra, que circulem na via pública ou no local da obra, independentemente de serem veículos de passageiros ou de carga, máquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóvel (riscos de circulação), bem como a apresentar comprovativo de que os veículos afetos à obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e equipamentos fixos ou móveis.
4. No caso dos bens imóveis referidos no número anterior, a apólice deve cobrir, no mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automóvel, previsto no n.º 2 desta cláusula, deverá respeitar os limites mínimos legalmente obrigatórios.

CAPÍTULO III**Obrigações da Universidade do Algarve**Cláusula 40.^a**Preço e condições de pagamento**

1. Pela execução da empreitada, e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do respetivo Contrato, deve a Universidade do Algarve pagar ao empreiteiro, a quantia total que constar da proposta, a qual não pode exceder os **€ 29.553,67 (vinte e nove mil quinhentos**

- e cinquenta e três euros e sessenta e sete cêntimos**), acrescida de IVA à taxa legal em vigor, no caso de o Empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execução do Contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pela Universidade do Algarve têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto na cláusula 32.^a.
 3. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após a apresentação da respetiva fatura.
 4. As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização.
 5. Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização condicionada à realização completa daqueles.
 6. No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de fiscalização e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalização e uma outra com os valores por este não aprovados.
 7. O disposto no número anterior não prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.º 3 no que respeita à primeira fatura emitida, que se aplica para os valores desde logo aceites pelo diretor da fiscalização.
 8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicáveis, nos termos do artigo 373.º do CCP.

Cláusula 41.^a

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado à Universidade do Algarve, um adiantamento, da parte do preço da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja utilização haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 292.º e 293.º do CCP, o adiantamento referido no número anterior só pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestação de uma caução do valor do adiantamento, através de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução.
3. Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior correm por conta do empreiteiro.

4. A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pela Universidade do Algarve, nos termos do n.º 2 do artigo 295.º do CCP.
5. Decorrido o prazo da execução dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberação da correspondente caução, o empreiteiro pode notificar a Universidade do Algarve para que esta cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias após a notificação, a Universidade do Algarve não tiver dado cumprimento à referida obrigação, nos termos do n.º 9 do artigo 295.º do CCP.

Cláusula 42.^a

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cláusula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante dedução nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes fórmulas:

- a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

$$V_{ri} = (V_a / V_t) \times V_{pt} - V_{rt}$$

- b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

$$V_{ri} = (V_a / V_t) \times V'_{pt} - V_{rt}$$

Em que:

V_{ri} é o valor de cada reembolso a deduzir na situação de trabalhos contratuais;

V_a é o valor do adiantamento;

V_t é o valor dos trabalhos contratuais por realizar à data de pagamento do adiantamento;

V_{pt} é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao mês em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'_{pt} é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao mês em que se processa o reembolso;

V_{rt} é o valor acumulado dos reembolsos já deduzidos até ao mês em que se processa o reembolso.

Cláusula 43.^a**Caução**

A prestação de caução não é exigível nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do CCP.

Cláusula 44.^a**Mora no pagamento**

Em caso de atraso da Universidade do Algarve, no cumprimento das obrigações de pagamento do preço contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora.

Cláusula 45.^a**Revisão de preços**

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão de obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Fórmula.
2. A revisão de preços obedece à fórmula geral para pavimentação de estradas, F17.
3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de trabalhos.

CAPÍTULO IV**Receção e liquidação da obra****Cláusula 46.^a****Receção provisória**

1. A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa da Universidade do Algarve, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da empreitada.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é efetuada relativamente a toda a extensão da empreitada que não seja objeto de deficiência.
3. O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP.

Cláusula 47.ª

Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
 - a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 397.º do CCP;
 - b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou instalações, de acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 397.º do CCP;
 - c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis, de acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 397.º do CCP.
2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pela Universidade do Algarve desde que suscetível de uso independente e autonomizável.
3. Excetua-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina.
4. Durante o período de garantia o empreiteiro fica obrigado a efetuar, a expensas suas, todas as reparações, correções ou substituições que sejam necessárias à correção integral dos defeitos ou desconformidades com o previsto no projeto, no Caderno de Encargos e no Contrato, que venham a ser identificados na obra objeto da presente empreitada e, bem assim, nos equipamentos fornecidos ou integrados.
5. Se os defeitos não forem suscetíveis de correção a Universidade do Algarve poderá, sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execução da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos.
6. No caso em que o empreiteiro não proceda às correções, reparações e/ou substituições dentro do prazo razoavelmente fixados pela Universidade do Algarve, para o efeito, se recuse a efetuá-las ou manifeste expressamente não as poder realizar, poderá a Universidade do Algarve, sem necessidade de quaisquer interpelações adicionais ao empreiteiro, realizar as necessárias correções, reparações ou substituições diretamente por si ou através de terceiros, a expensas do empreiteiro.
7. Nas situações descritas no número anterior, e para os efeitos da parte final do número anterior, fica a Universidade do Algarve autorizada, sem necessidade de nova interpelação ou de

qualquer notificação prévia do empreiteiro, ou sequer de intentar qualquer ação judicial, a executar total ou parcialmente às garantias prestadas pelo empreiteiro para custear todas as despesas e custos em que incorra com a correção dos defeitos.

Cláusula 48.^a

Receção definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra para efeitos de receção definitiva.
2. Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condições de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.
3. A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:
 - a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigências contratualmente previstas;
 - b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.
4. No caso da vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos previstos no número anterior, a Universidade do Algarve fixa o prazo para a correção dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores.
5. São aplicáveis à vistoria e ao auto de receção definitiva, bem como à falta de agendamento ou realização da vistoria pela Universidade do Algarve, os preceitos que regulam a receção provisória quanto às mesmas matérias, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 398.º do CCP.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Cláusula 49.^a**Deveres de colaboração recíproca e informação**

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, sem prejuízo dos deveres de informação previstos no artigo. 290º do CCP.

Cláusula 50.^a**Subcontratação e cessão da posição contratual**

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitação, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.ºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP.
2. A Universidade do Algarve apenas pode opor-se à subcontratação na fase de execução quando não estejam verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do Contrato.
3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar.
4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pelo diretor de fiscalização para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.
6. No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o facto à Universidade do Algarve, remetendo-lhe cópia do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8. A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º do CCP.
9. Os subempreiteiros podem reclamar junto da Universidade do Algarve os pagamentos em atraso que lhe sejam devidos pelo empreiteiro, nos termos do artigo 321.º- A do CCP.

Cláusula 51.^a**Resolução do contrato pela Universidade do Algarve**

1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, a Universidade do Algarve pode resolver o Contrato nos seguintes casos:
- a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputável ao empreiteiro;
 - b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais;
 - c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização pela Universidade do Algarve;
 - d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro da manutenção das obrigações assumidas pela Universidade do Algarve contrarie o princípio da boa fé;
 - e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP;
 - f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
 - g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
 - h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente;
 - i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;
 - j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pela Universidade do Algarve, o empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pela Universidade do Algarve para nova consignação desde que não apresente justificação de tal falta aceite pela Universidade do Algarve;
 - k) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execução da obra;
 - l) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze) dias da notificação da decisão da Universidade do Algarve que indefere a reclamação apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execução;
 - m) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pela Universidade do Algarve por facto imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento

- e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do CCP, desde que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público;
- n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 404.º do CCP;
 - o) Se não foram corrigidos os defeitos detetados no período de garantia da obra ou se não for repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP;
 - p) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
2. Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo da Universidade do Algarve poder executar as garantias prestadas.
3. No caso previsto na alínea p) do n.º 1, o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos.
4. A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importância.

Cláusula 52.ª

Resolução do Contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no presente Caderno de Encargos, bem como das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas seguintes situações:
- a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias;
 - b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputável à Universidade do Algarve;
 - c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pela Universidade do Algarve por período superior a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25% (vinte e cinco) do preço contratual, excluindo juros;
 - d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual da Universidade do Algarve, quando tornem contrária à boa fé a exigência pela parte pública da manutenção do Contrato;
 - e) Incumprimento pela Universidade do Algarve de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

- f) Se não for feita consignação da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da celebração do Contrato por facto não imputável ao empreiteiro;
 - g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;
 - h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma redução superior a 20% (vinte) do preço contratual;
 - i) Se a suspensão da empreitada se mantiver:
 - i) Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de caso de força maior;
 - ii) Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputável à Universidade do Algarve;
 - j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% (vinte) do preço contratual.
2. No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença.
3. O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4. Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração da Universidade do Algarve, produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se a Universidade do Algarve cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cláusula 53.^a

Força maior

- 1. Não será havido como incumprimento, nem por tal poderão ser impostas sanções contratuais ao empreiteiro, a não realização pontual de qualquer prestação a cargo de qualquer uma das Partes que resulte de caso de força maior.
- 2. Verificado um evento de força maior que comprovadamente impeça o cumprimento pontual das suas obrigações por qualquer uma das Partes, será o prazo para esse cumprimento

prorrogado pelo período correspondente à duração do impedimento daí resultante, sem prejuízo de a Parte afetada dever desenvolver os melhores esforços no sentido de minimizar as consequências do evento.

3. Para efeitos do Contrato a celebrar, entende-se por caso de força maior todo o evento imprevisível ou inevitável, alheio à vontade e ao controlo das Partes, que as impeça, total ou parcialmente, temporária ou definitivamente, de cumprir as suas obrigações nos prazos contratualmente fixados.
4. Poderão revestir a natureza de caso de força maior, desde que se verifiquem os requisitos do número anterior, nomeadamente, o estado de guerra, declarada ou não, rebeliões ou motins, atos de terrorismo, determinações governamentais ou administrativas injuntivas, catástrofes naturais, como terremotos ou inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves e embargos ou bloqueios internacionais.
5. Para efeitos do Contrato a celebrar, não constituem caso de força maior, designadamente:
 - a) Eventos que não constituam caso de força maior para os subcontratados do empreiteiro, na parte em que intervenham;
 - b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do empreiteiro ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
 - c) Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento, pelo empreiteiro, de obrigações ou ónus que sobre o mesmo recaiam;
 - d) Manifestações populares devidas ao incumprimento, pelo empreiteiro, de normas legais;
 - e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do empreiteiro, cuja causa, propagação ou proporções se devam a dolo ou negligência sua ou ao incumprimento, pelo mesmo, de normas de segurança;
 - f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do empreiteiro não devidas a sabotagem;
 - g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguro.
6. A Parte que invoque um evento de força maior como causa do não cumprimento das suas obrigações contratuais, deverá comunicá-lo, fundamentadamente, à outra Parte, com a máxima antecedência ou assim que possível, informando, desde logo, do prazo previsível para o restabelecimento da normalidade contratual.

Cláusula 54.^a**Foro competente**

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 55.^a**Comunicações e notificações**

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada à outra Parte, por escrito e por meio de carta com aviso de receção.

Cláusula 56.^a**Contagem dos prazos**

Os prazos previstos no Contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Cláusula 57.^a**Legislação aplicável**

Em tudo o que não se encontrar especialmente previsto no presente Caderno de Encargos, aplicar-se-ão as disposições constantes do CCP, do Código do Procedimento Administrativo e demais legislação aplicável.

ANEXO RGPD

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS

Introdução. Definições no quadro do RGPD e da LPDP

1.NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma jurídica aplicável no âmbito da proteção de dados pessoais e da segurança da informação pessoal, seja de carácter internacional ou comunitário, seja de carácter nacional, tal como, designadamente, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, a Lei de Proteção de Dados Pessoais e outra Legislação Complementar vigente no ordenamento jurídico.

2.RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO

«Responsável pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais.

3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, agência ou outro organismo que trate os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento destes.

Artigo 1ª

(Conformidade com a NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no ordenamento jurídico nacional em matéria de proteção de dados pessoais e de segurança da informação, normas essas designadas doravante por NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, cumprindo com as respetivas obrigações.

2. A NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente e aplicável no ordenamento jurídico nacional bem como toda e qualquer interpretação ou decisão de uma entidade administrativa ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer recomendação, código de conduta ou mecanismo de certificação vigente e aplicável emitido por uma autoridade de supervisão.

Artigo 2º**(Responsável pelo tratamento e subcontratante)**

No âmbito do Contrato celebrado entre a Universidade do Algarve e a firma MAJA – Manuel António & Jorge Almeida – Construções, S.A., ambas as partes acordam que, em matérias de proteção de dados pessoais e de segurança da informação, a Universidade do Algarve será a entidade responsável pelo tratamento e a firma MAJA – Manuel António & Jorge Almeida – Construções, S.A., será a SUBCONTRATANTE, de acordo com as definições e os termos gerais constantes da NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 3º**(Medidas técnicas e organizativas)**

A SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma que o tratamento satisfaça os requisitos da NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, assegurando a defesa dos direitos do titular dos dados e assumindo os custos pela implementação dessas medidas, como partes integrantes dos serviços objeto do Contrato.

Artigo 4º**(Sub-subcontratação)**

1. A SUBCONTRATANTE não está autorizada a contratar outro subcontratante sem que a responsável pelo tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorização específica ou geral.
2. Existindo uma autorização geral por escrito, a SUBCONTRATANTE deve informar a responsável pelo tratamento de quaisquer alterações pretendidas quanto ao aumento do número ou à substituição de outros subcontratantes, dando assim à responsável pelo tratamento a oportunidade de se opor a tais alterações.
3. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realização de operações específicas de tratamento de dados por conta da responsável pelo tratamento, são impostas a esse outro subcontratante, por contrato ou outro ato normativo ao abrigo do direito da União ou dos Estados-Membros, as mesmas obrigações em matéria de proteção de dados que as estabelecidas neste contrato, devendo obter garantias por parte deste de que cumprirá as obrigações da NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.
4. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realização de operações específicas de tratamento de dados por conta da responsável pelo tratamento, e se esse outro subcontratante não cumprir as suas obrigações em matéria de proteção de dados, o subcontratante inicial continua a ser plenamente responsável, perante o responsável pelo tratamento, pelo cumprimento das obrigações desse outro subcontratante.

5. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realização de operações específicas de tratamento de dados por conta do responsável pelo tratamento, o contrato deve ser feito por escrito, incluindo em formato eletrónico.

Artigo 5ª

(Termos de vinculação)

O tratamento de dados pessoais no âmbito das relações de subcontratação entre as partes é regulado por este contrato, ficando a SUBCONTRATANTE vinculada à responsável pelo tratamento nos termos estabelecidos no Apêndice quanto ao objeto e à duração do tratamento, à natureza e finalidade do tratamento, ao tipo de dados pessoais e às categorias dos titulares dos dados, e às obrigações e direitos do responsável pelo tratamento.

Artigo 6ª

(Tratamento segundo instruções)

1. A SUBCONTRATANTE trata os dados pessoais apenas mediante instruções documentadas da responsável pelo tratamento.

2. O tratamento a efetuar pela SUBCONTRATANTE deve ser realizado nos termos definidos no Apêndice [Condições Contratuais do Tratamento de Dados], de acordo com as revisões e atualizações periódicas, por escrito, de que este seja objeto, bem como outro qualquer tratamento que venha a ser notificado pela Universidade do Algarve à firma MAJA – Manuel António & Jorge Almeida – Construções, S.A., no âmbito do contrato.

Artigo 7ª

(Circulação e transferência de dados pessoais)

A SUBCONTRATANTE não está autorizada, sem que a responsável pelo tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorização específica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam as respetivas instruções, a proceder à transferência de dados pessoais para entidades terceiras, incluindo no que respeita às transferências de dados para países terceiros ou organizações internacionais, a menos que seja obrigada a fazê-lo pelo direito da União ou do Estado-Membro a que está sujeita, informando nesse caso a responsável pelo tratamento desse requisito jurídico antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informação por motivos importantes de interesse público.

Artigo 8ª

(Compromisso de confidencialidade)

A SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estão sujeitas a adequadas obrigações legais de confidencialidade;

Artigo 9º**(Medidas de segurança)**

1. A SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos de aplicação e a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos, de probabilidade e gravidade variável, para os direitos e liberdades das pessoas singulares.
2. Entre outras, a SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for adequado:
 - a) medidas de pseudonimização e de cifragem dos dados pessoais;
 - b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência permanentes dos sistemas e dos serviços de tratamento;
 - c) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de um incidente físico ou técnico;
 - d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia das medidas técnicas e organizativas para garantir a segurança do tratamento.
3. A SUBCONTRATANTE deve proceder à avaliação da adequação do nível de segurança, devendo ter em conta, designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados que esteja a realizar.
4. A SUBCONTRATANTE deve proceder à implementação de todas as medidas necessárias para prevenir a destruição, perda e alteração acidentais ou ilícitas, a divulgação ou ao acesso não autorizados, de dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento no âmbito deste contrato.

Artigo 10º**(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)**

1. A SUBCONTRATANTE é responsável por garantir a conformidade da atividade de todos os seus colaboradores ou trabalhadores com a NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.
2. A SUBCONTRATANTE deve garantir a implementação das medidas de segurança necessárias à respetiva conformidade, estando obrigada a celebrar acordos de confidencialidade enquadrados em contratos escritos com esses colaboradores ou trabalhadores.
3. Sempre que seja necessário para a realização de operações de tratamento de dados pessoais inerentes a este contrato, a SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.

4. A SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a fiabilidade do tratamento dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo responsável em proceder à formação adequada destes para garantia da atividade em conformidade com a NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 11^a

(Assistência à responsável pelo tratamento)

1. Assistência na resposta ao exercício dos direitos dos titulares:

Tendo em conta a natureza do tratamento, a SUBCONTRATANTE presta assistência à responsável pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra a sua obrigação de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercício dos seus direitos em matéria de proteção de dados pessoais previstos na NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, registando e notificando à responsável pelo tratamento, no prazo de dois dias úteis, quer todos os pedidos dos titulares dos dados pessoais, quer as reclamações ou quaisquer outros pedidos relacionados com as obrigações das partes em matéria de conformidade com a NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.

2. Assistência nas notificações ou comunicações de violação de incidentes de dados pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informação que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar assistência à responsável pelo tratamento no sentido de assegurar o cumprimento das obrigações previstas na NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS em matéria de notificações ou comunicações de violação de dados pessoais.

3. Assistência na realização de avaliações de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informação que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar assistência à responsável pelo tratamento no sentido de assegurar o cumprimento das obrigações previstas na NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS em matéria de realização de avaliações de impacto das operações de tratamento previstas sobre a proteção de dados pessoais.

4. Assistência na realização de consultas prévias:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informação que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar assistência à responsável pelo tratamento no sentido de assegurar o cumprimento das obrigações previstas na NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS em matéria de consultas prévias às autoridades de supervisão.

Artigo 12º**(Conservação dos dados)**

1. A SUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS para conservação dos dados pessoais, devendo seguir as instruções gerais ou especiais da responsável pelo tratamento nessa matéria.
2. Consoante a escolha da responsável pelo tratamento, a SUBCONTRATANTE deve apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais depois de concluída a prestação de serviços relacionados com o tratamento, apagando as cópias existentes, a menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo do direito da União ou dos Estados-Membros.

Artigo 13º**(Dever de prestar informações)**

1. A SUBCONTRATANTE deve disponibilizar à responsável pelo tratamento todas as informações necessárias para demonstrar o cumprimento das obrigações previstas na NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS em matéria de proteção de dados pessoais e de segurança da informação.
2. Em especial, a SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsável pelo tratamento se, no seu entender, alguma instrução violar o presente regulamento ou outras disposições do direito da União ou dos Estados-Membros em matéria de proteção de dados.

Artigo 14º**(Auditorias e inspeções)**

A SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspeções, conduzidas pela responsável pelo tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam consideradas necessárias no âmbito deste contrato, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos custos acrescidos associados a essas auditorias ou inspeções sempre que sejam detetadas desconformidades da sua exclusiva responsabilidade.

Artigo 15º**(Tratamento sob a autoridade da responsável pelo tratamento)**

A SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a dados pessoais, não procede ao tratamento desses dados exceto por instrução da responsável pelo tratamento, salvo se a tal for obrigado por força do direito da União ou dos Estados-Membros.

Artigo 16ª**(Registos das atividades de tratamento)**

1. A SUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, os seus representantes ou subcontratantes, deve conservar um registo de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e por conta da responsável pelo tratamento.
2. Deste registo deverá constar:
 - a) O nome e contactos da SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso do representante da responsável pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da proteção de dados;
 - b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsável pelo tratamento;
 - c) Se for aplicável, as transferências de dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais, incluindo a identificação desses países terceiros ou organizações internacionais e, no caso das transferências referidas no artigo 49.º, n.º 1, segundo parágrafo, do RGPD, a documentação que comprove a existência das garantias adequadas;
 - d) Se possível, uma descrição geral das medidas técnicas e organizativas no domínio da segurança referidas no artigo 32.º, n.º 1, do RGPD.
3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrónico.
4. A SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes devem disponibilizar, a pedido, o registo à responsável pelo tratamento bem com à autoridade de controlo nos termos da NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 17ª**(Dever de cooperação)**

A SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsável pelo tratamento sempre que haja necessidade de proceder a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no âmbito da prossecução das suas atribuições.

Artigo 18ª**(Dever de notificação de uma violação de dados pessoais)**

1. A SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestão de incidentes em matéria de dados pessoais e de segurança da informação.
2. Em caso de violação de dados pessoais, a SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a responsável pelo tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possível, até 12 horas após ter tido conhecimento da mesma, a menos que a violação dos dados pessoais não seja suscetível de resultar num risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares.

3. Se a notificação não for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos do atraso.

4. A notificação referida deve, pelo menos:

- a) Descrever a natureza da violação dos dados pessoais incluindo, se possível, as categorias e o número aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o número aproximado de registos de dados pessoais em causa;
- b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da proteção de dados ou de outro ponto de contacto onde possam ser obtidas mais informações;
- c) Descrever as consequências prováveis da violação de dados pessoais;
- d) Descrever as medidas adotadas ou propostas pela SUBCONTRATANTE para reparar a violação de dados pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos;

5. Caso, e na medida em que não seja possível fornecer todas as informações ao mesmo tempo, estas podem ser fornecidas por fases, sem demora injustificada.

6. A SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violações de dados pessoais, compreendendo os factos relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de reparação adotada, disponibilizando essa documentação à responsável pelo tratamento.

Artigo 19º

(Responsabilidade e indemnizações)

A SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsável pelo tratamento por quaisquer danos causados resultantes de dados pessoais, pela sua atuação ou pela atuação de um qualquer seu subcontratado, quer esses danos sejam decorrentes da violação dos termos deste contrato, quer esses danos sejam decorrentes da violação dos termos da NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 20º

(Gabinete de Proteção de Dados)

Para o exercício de qualquer tipo de direitos de proteção de dados e de privacidade ou para qualquer assunto referente aos temas da proteção de dados, privacidade e segurança da informação, os Utilizadores, Destinatários do serviço e Clientes ou Subcontratantes da Universidade do Algarve podem entrar em contacto com o Gabinete de Proteção de Dados através do correio eletrónico rgpd@ualg.pt, descrevendo o assunto do pedido e indicando um endereço de correio eletrónico, um endereço de contacto telefónico ou um endereço de correspondência para resposta.

APÊNDICE**CONDIÇÕES CONTRATUAIS DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS****1. Objeto do Tratamento**

Operações de tratamento de dados pessoais necessárias à execução do Contrato para a Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante entre a Universidade do Algarve e a firma MAJA – Manuel António & Jorge Almeida – Construções, S.A., celebrado em [LOCAL], em [DATA] (doravante o Contrato).

2. Duração do Tratamento

Duração do tratamento enquanto o Contrato entre a Universidade do Algarve e a firma MAJA – Manuel António & Jorge Almeida – Construções, S.A., estiver em vigor.

3. Natureza e Finalidade do Tratamento

Operações de tratamento de dados pessoais realizadas para prossecução das seguintes finalidades contratuais: para a Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante, com as funcionalidades descritas nas especificações técnicas do Caderno de Encargos.

4. Tipos de Dados Pessoais

Todos os tipos de dados que sejam considerados dados pessoais nos termos da NORMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.

5. Categorias dos Titulares dos Dados

Operações de tratamento de dados pessoais realizadas sobre as seguintes categorias: para a Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante, com as funcionalidades descritas nas especificações técnicas do Caderno de Encargos.

6. Instruções de Tratamento

A firma MAJA – Manuel António & Jorge Almeida – Construções, S.A., devem implementar e executar todas as medidas de segurança que sejam consideradas adequadas para garantir a proteção dos dados pessoais, comprometendo-se em particular a:

- a) Impedir o acesso de pessoas não autorizadas ao equipamento utilizado para o tratamento;
- b) Impedir que os suportes de dados sejam lidos, copiados, alterados ou retirados sem autorização;

- c) Impedir a introdução não autorizada de dados pessoais, bem como qualquer inspeção, alteração ou apagamento não autorizados de dados pessoais conservados;
- d) Impedir que os sistemas de tratamento automatizado sejam utilizados por pessoas não autorizadas por meio de equipamento de comunicação de dados;
- e) Assegurar que as pessoas autorizadas a utilizar um sistema de tratamento automatizado só tenham acesso aos dados pessoais abrangidos pela sua autorização de acesso;
- f) Assegurar que possa ser verificado e determinado a organismos que os dados pessoais foram ou podem ser transmitidos ou facultados utilizando equipamento de comunicação de dados;
- g) Assegurar que possa ser verificado e determinado a posteriori quais os dados pessoais introduzidos nos sistemas de tratamento automatizado, quando e por quem;
- h) Impedir que, durante as transferências de dados pessoais ou o transporte de suportes de dados, os dados pessoais possam ser lidos, copiados, alterados ou suprimidos sem autorização;
- i) Assegurar que os sistemas utilizados possam ser restaurados em caso de interrupção;
- j) Assegurar que as funções do sistema funcionem, que os erros de funcionamento sejam assinalados (fiabilidade);
- k) Assegurar que os dados pessoais conservados não possam ser falseados por um disfuncionamento do sistema;
- l) Assegurar a encriptação de todos os dados pessoais que estiverem armazenados ou transferidos num ambiente sem controlo físico ou fora do sistema de controlo de acesso físico ou lógico; e,
- m) Proceder à transmissão de informação de ficheiros via SFTP, serviços web ou correio eletrónico encriptado com palavra-chave.

Para além destas condições gerais, são aplicáveis todas as medidas que estão previstas no Contrato ou em outros instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de tratamento de dados pessoais.

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1- Introdução

Refere-se a presente memória, à execução da **Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante**, localizada no *Campus* de Gambelas da Universidade do Algarve, de acordo com a planta localização (peça desenhada n.º 1).

2- Características dos trabalhos

Pretende-se com estes trabalhos requalificar um dos locais mais centrais do *Campus* de Gambelas, onde se localiza o Balcão do Estudante, não só pela imensa circulação de pessoas nesta área, mas principalmente tendo como foco pessoas com mobilidade condicionada e pessoas com deficiência visual que necessitam de aceder ao Balcão do Estudante.

Os trabalhos a realizar constam da aplicação de pavimento tátil de aproximação, aplicação de pavimento tátil com piso direcional, execução de rampa de acesso ao edifício do Balcão do Estudante, criação de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada junto ao Balcão do Estudante, criação de uma área de estadia sem barreiras arquitetónicas, frente á entrada do Balcão do Estudante, implementação de passadeira com demarcação para invisuais, execução de muro de suporte, assentamento de calçada e aplicação de betuminoso.

Todos os trabalhos deverão executados de acordo com o projeto de execução e por pessoal especializado em cada uma das atividades interveniente e de acordo com todos os regulamentos e normas em vigor.

LISTA DE PEÇAS DESENHADAS

Desenho 1 - Planta de Localização

Desenho 2 - Levantamento Topográfico/Remoção de raízes

Desenho 3 - Demolições

Desenho 4 - Planta de Conjunto - Pavimentos



Desenho 5 - Pavimentos

Desenho 6 - Pavimentos

Desenho 7 - Pavimentos

Desenho 8 - Pavimentos - Pormenores

Desenho 9 - Muro de Suporte/Sumidouro

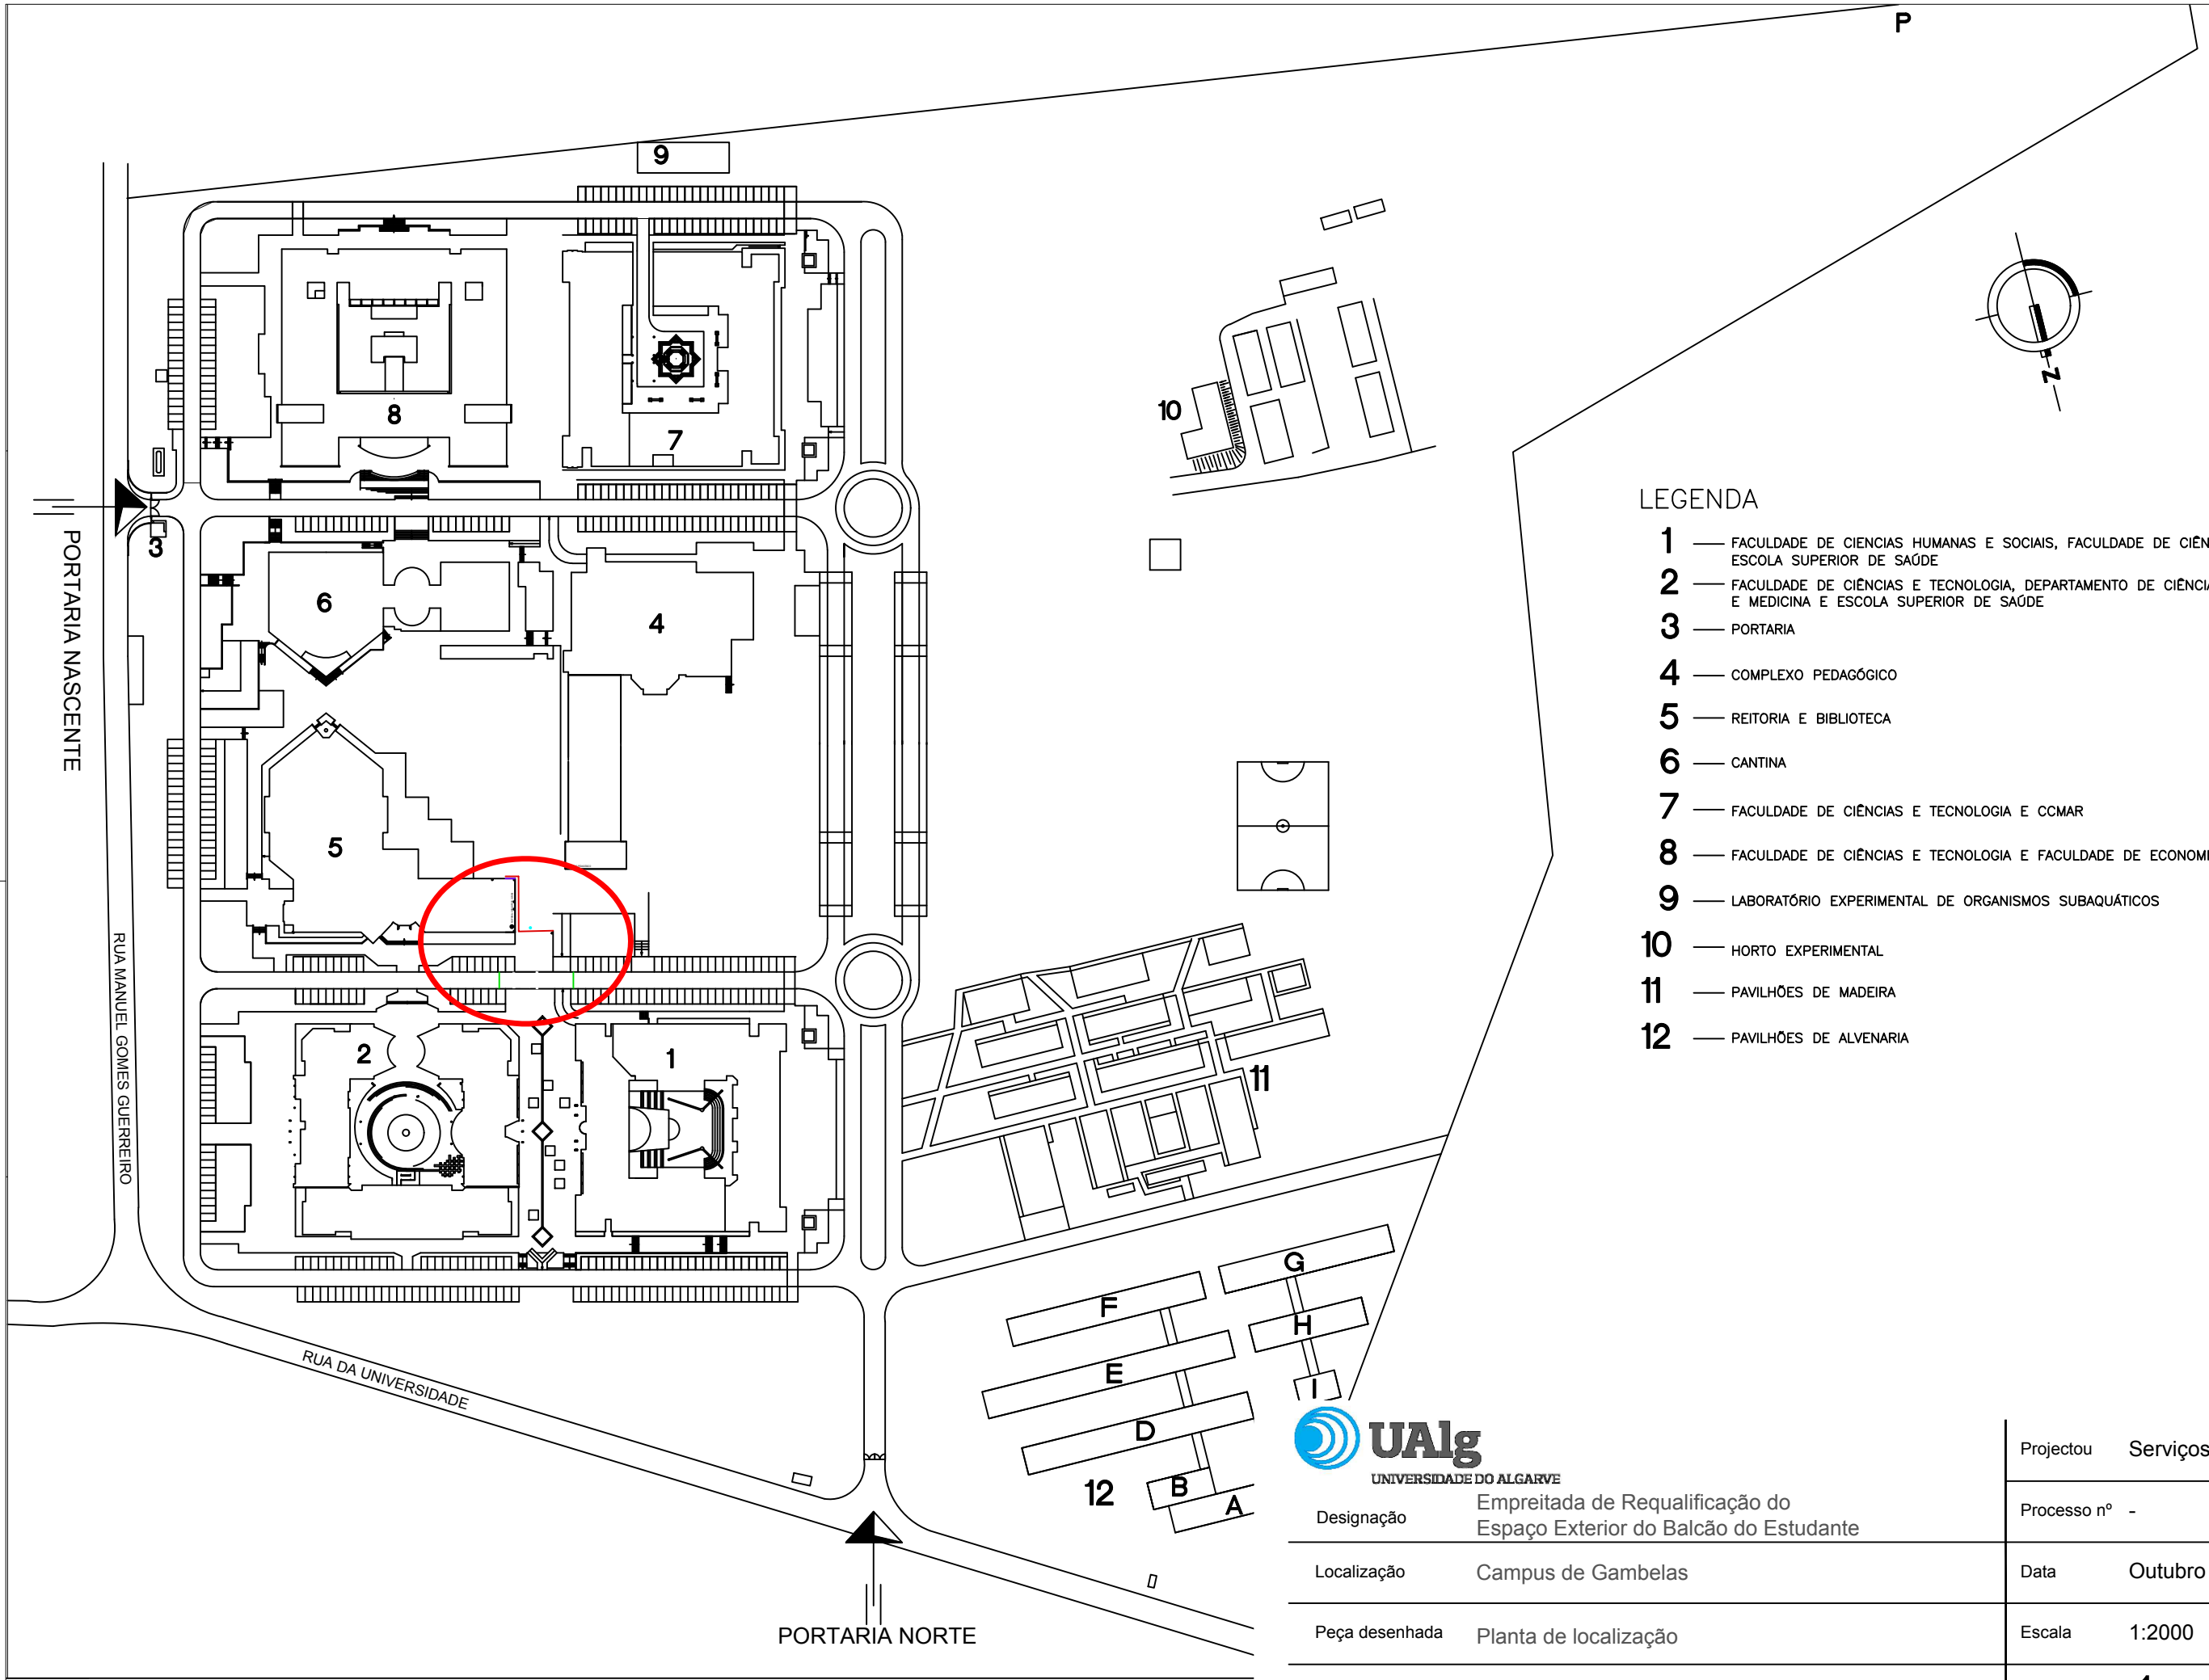


- LEGENDA
- 1 — FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE
 - 2 — FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS E MEDICINA E ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE
 - 3 — PORTARIA
 - 4 — COMPLEXO PEDAGÓGICO
 - 5 — REITORIA E BIBLIOTECA
 - 6 — CANTINA
 - 7 — FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA E CCMAR
 - 8 — FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA E FACULDADE DE ECONOMIA
 - 9 — LABORATÓRIO EXPERIMENTAL DE ORGANISMOS SUBAQUÁTICOS
 - 10 — HORTO EXPERIMENTAL
 - 11 — PAVILHÕES DE MADEIRA
 - 12 — PAVILHÕES DE ALVENARIA



Designação	Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante
Localização	Campus de Gambelas
Peça desenhada	Planta de localização
Especialidade	Arruamentos

Projectou	Serviços Técnicos
Processo nº	-
Data	Outubro 2020
Escala	1:2000
Des. nº	1

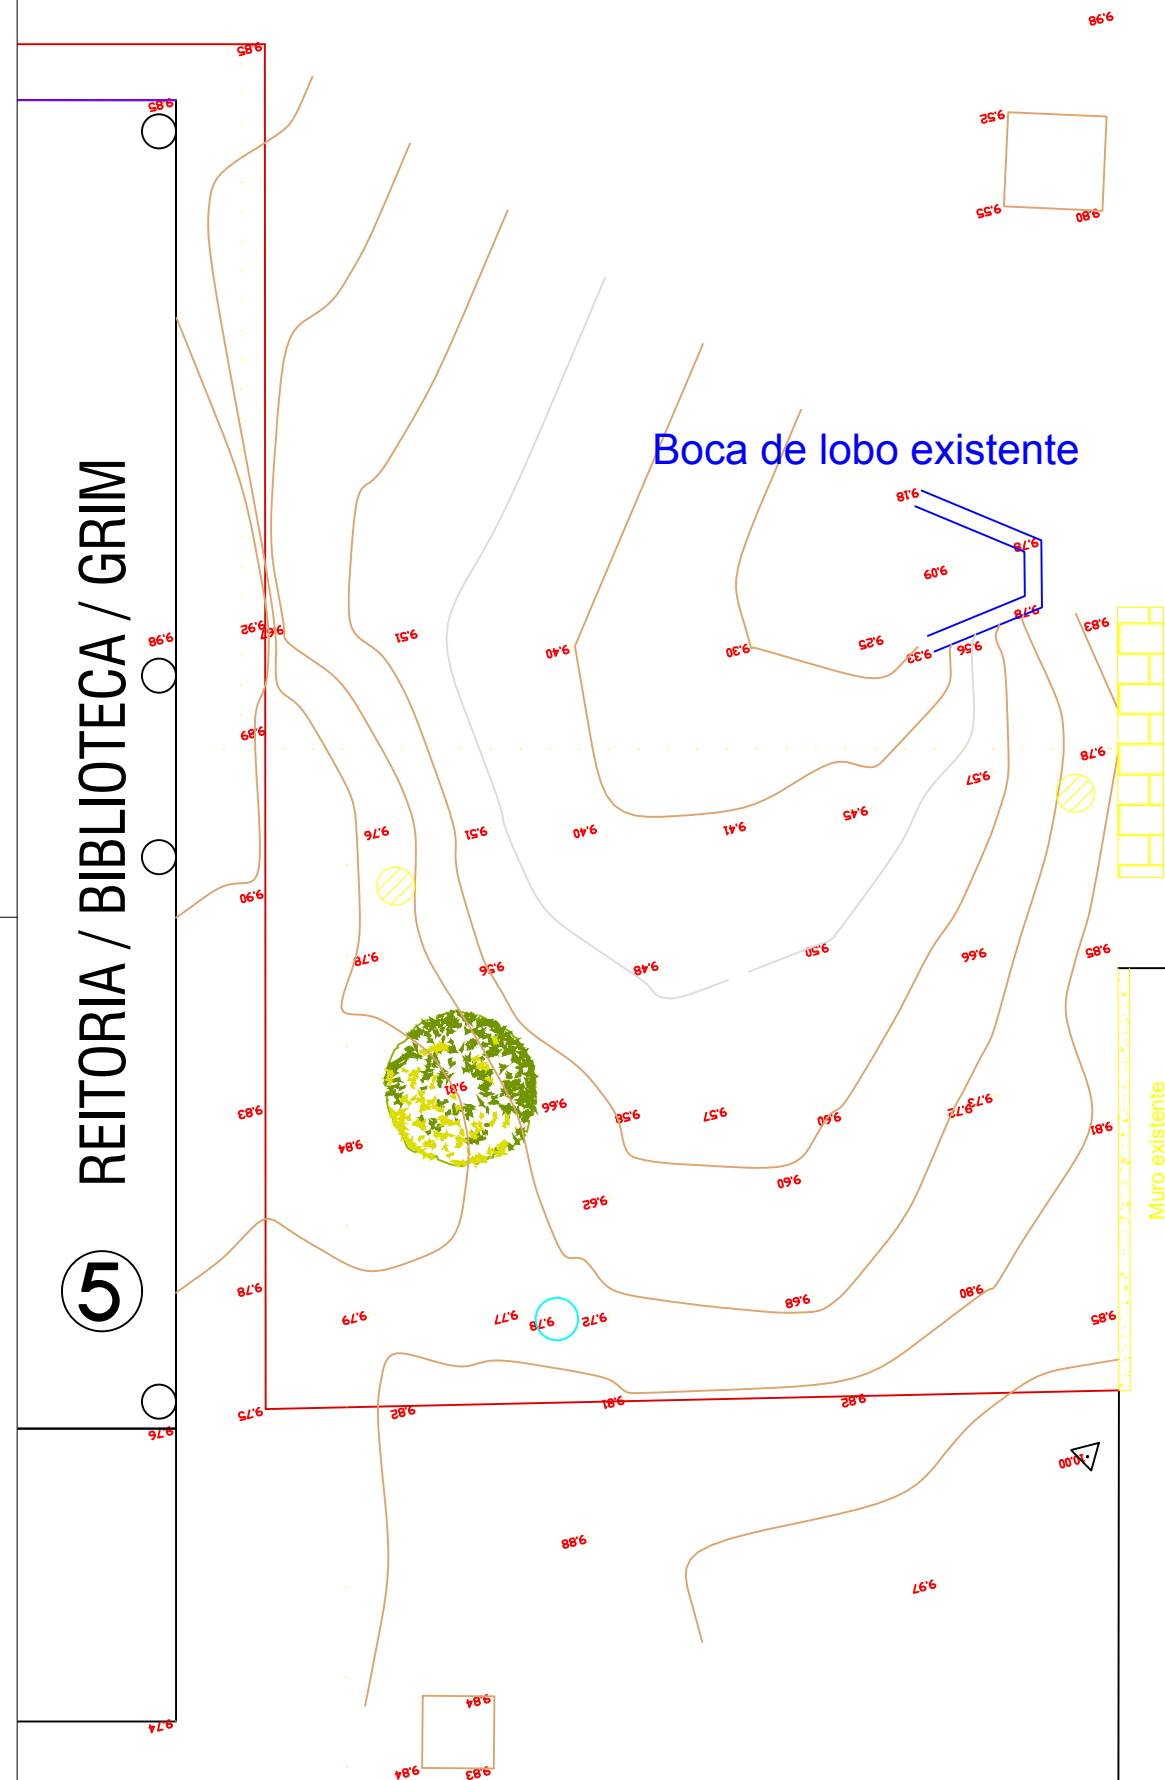


Legenda:

-  Tronco/raízes a remover
-  Muro de betão a remover
-  Lajetas pré fabricadas a remover



Designação	Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante	Processo nº	-
Localização	Campus de Gambelas	Data	Outubro 2020
Peça desenhada	Levantamento topográfico / Remoção de raízes	Escala	1:100
Especialidade	Arruamentos	Des. nº	2

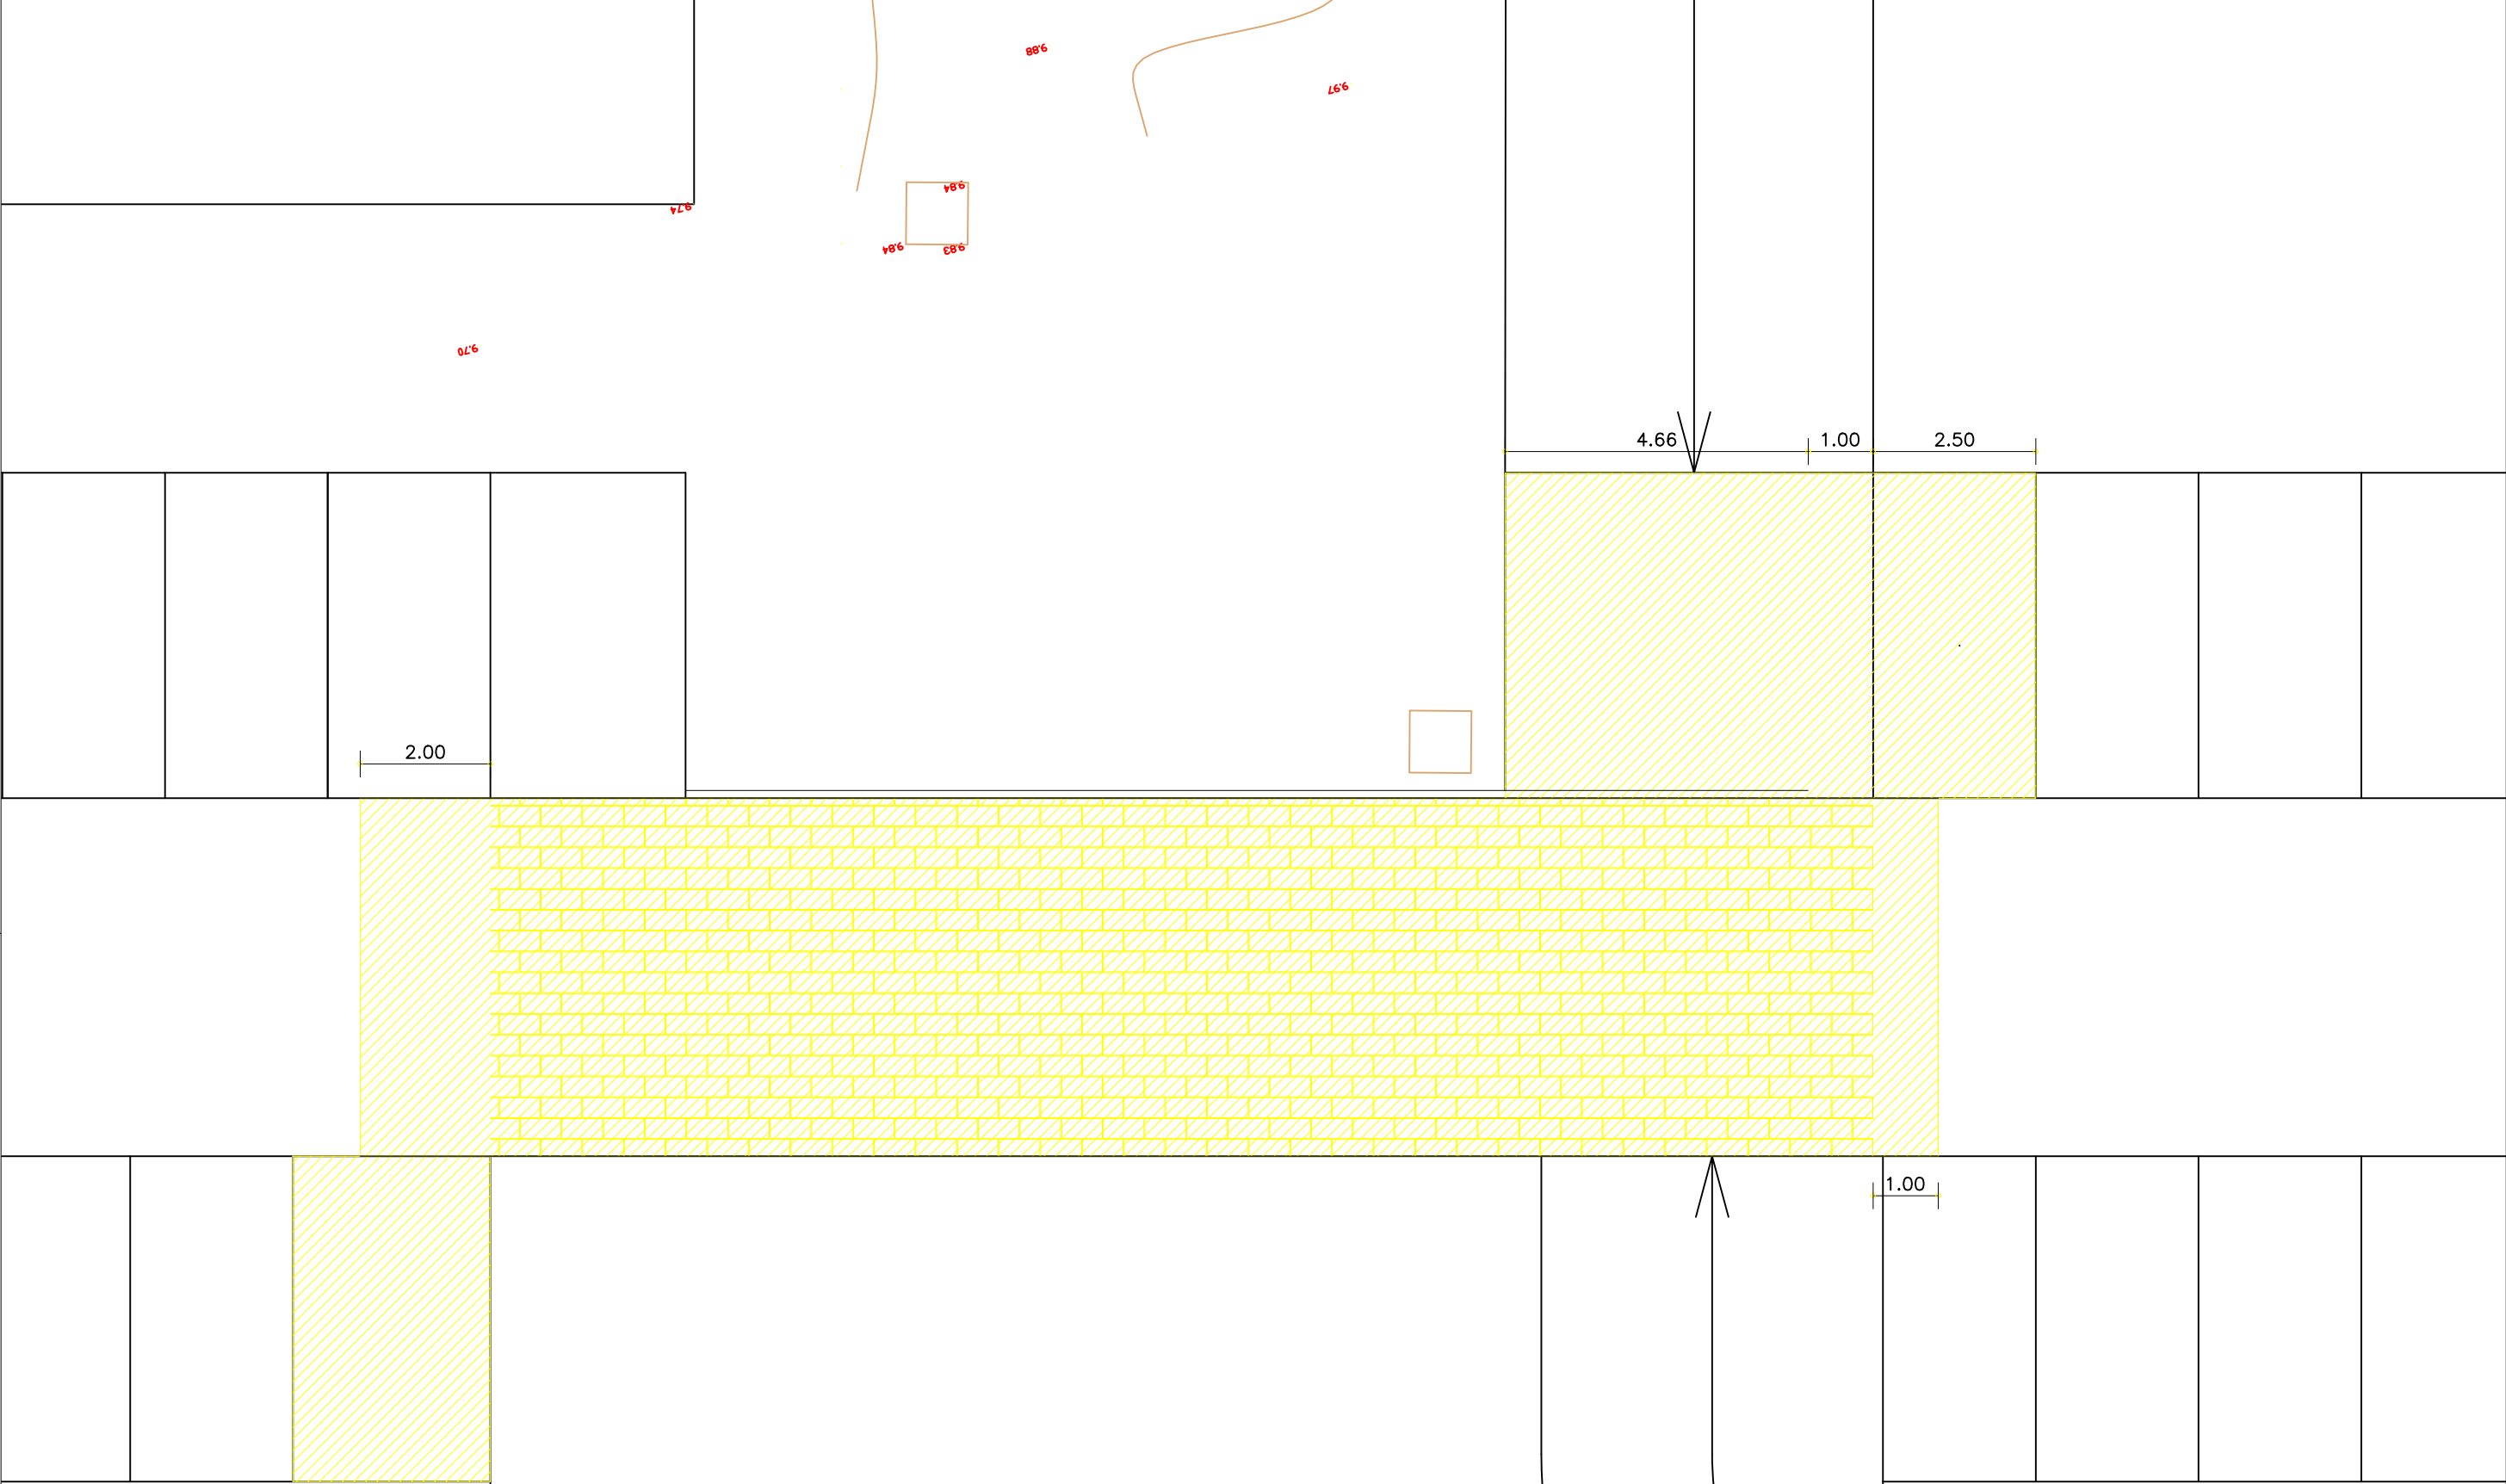


Legenda:

-  Tronco/raízes a remover
-  Muro de betão a remover
-  Lajetas pré fabricadas a remover



Designação	Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante	Projectou	Serviços Técnicos
Localização	Campus de Gambelas	Processo nº	-
Peça desenhada	Demolições	Data	Outubro 2020
Especialidade	Arruamentos	Escala	1:100
		Des. nº	3

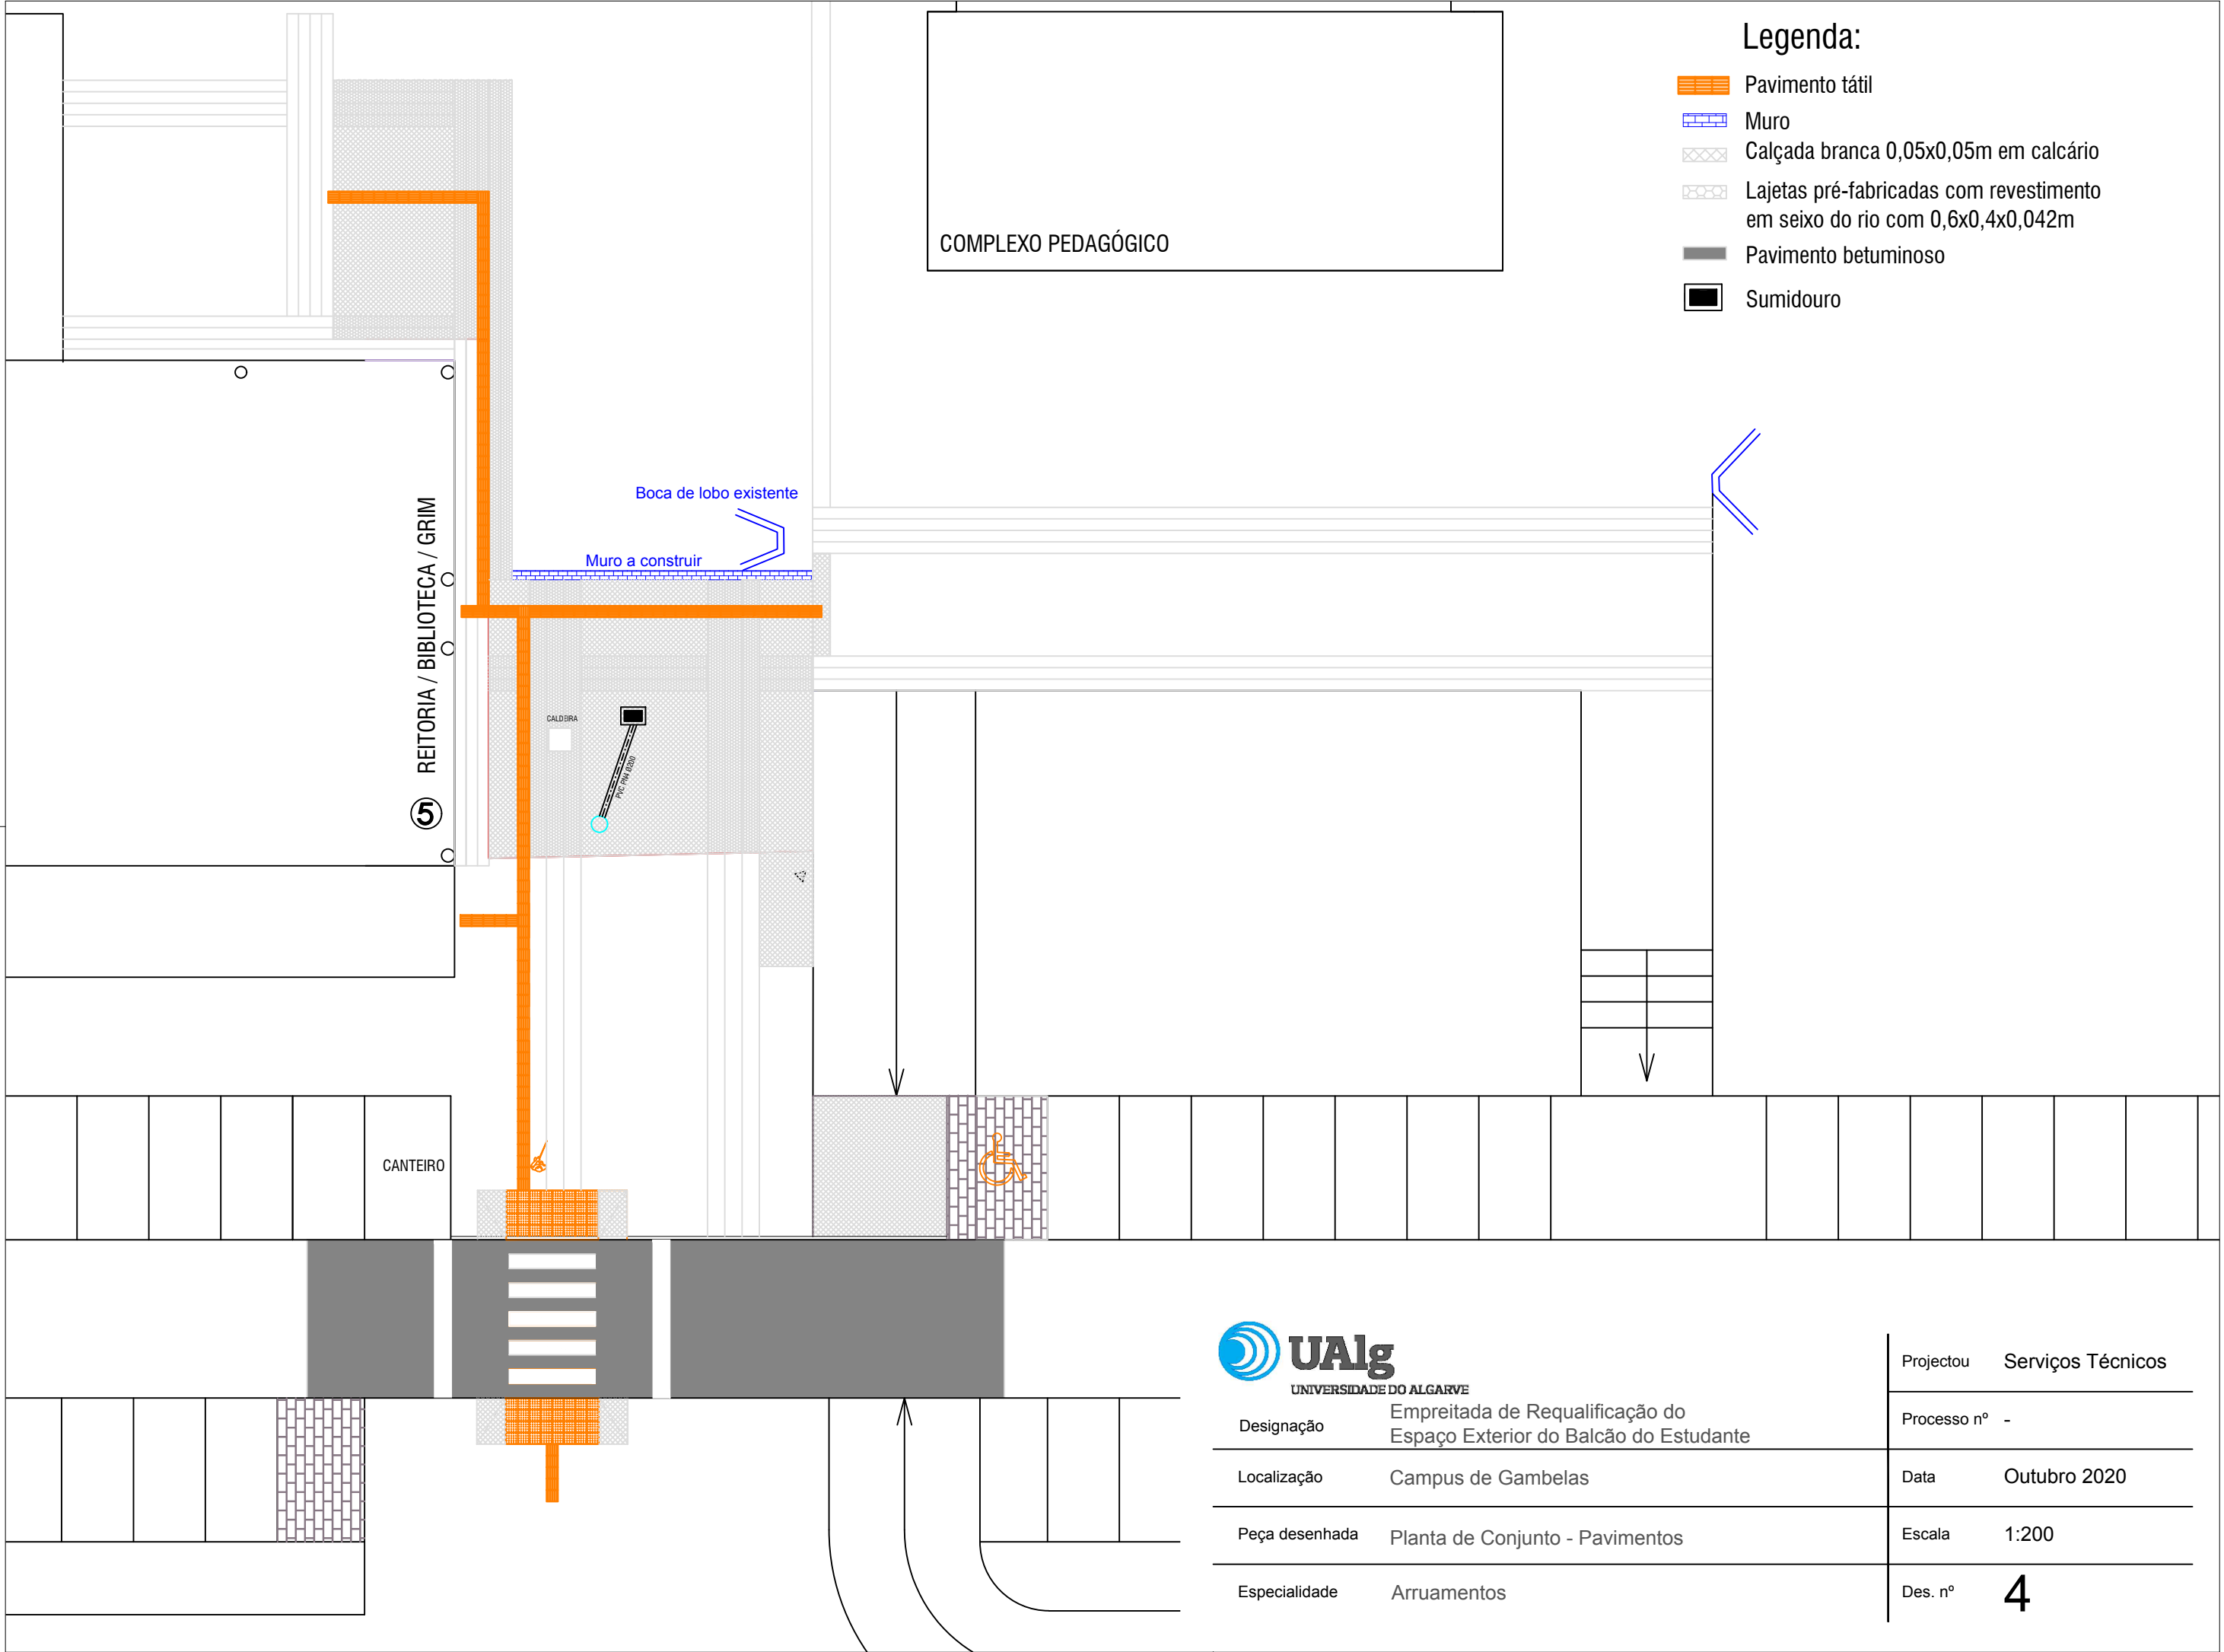

Designação: Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante

Localização: Campus de Gambelas

Peça desenhada: Planta de Conjunto - Pavimentos

Especialidade: Arruamentos

COMPLEXO PEDAGÓGICO

Legenda:

-  Pavimento tátil
-  Muro
-  Calçada branca 0,05x0,05m em calcário
-  Lajetas pré-fabricadas com revestimento em seixo do rio com 0,6x0,4x0,042m
-  Pavimento betuminoso
-  Sumidouro

Boca de lobo existente

Muro a construir

CALDEIRA

PVC PN4 Ø200



Designação Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante

Localização Campus de Gambelas

Peça desenhada Pavimentos

Especialidade Arruamentos

Projectou Serviços Técnicos

Processo nº -

Data Outubro 2020

Escala 1:100

Des. nº 5

REITORIA / BIBLIOTECA / GRIM

5

TEIRO

Boca de lobo existente

Muro a construir

CALDEIRA

PVC PN4 Ø200


Legenda:

- Pavimento tátil
- Muro
- Calçada branca 0,05x0,05m em calcário
- Lajetas pré-fabricadas com revestimento em seixo do rio com 0,6x0,4x0,042m
- Pavimento betuminoso
- Sumidouro



Designação	Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante
Localização	Campus de Gambelas
Peça desenhada	Pavimentos
Especialidade	Arruamentos

Projectou	Serviços Técnicos
Processo nº	-
Data	Outubro 2020
Escala	1:100
Des. nº	6

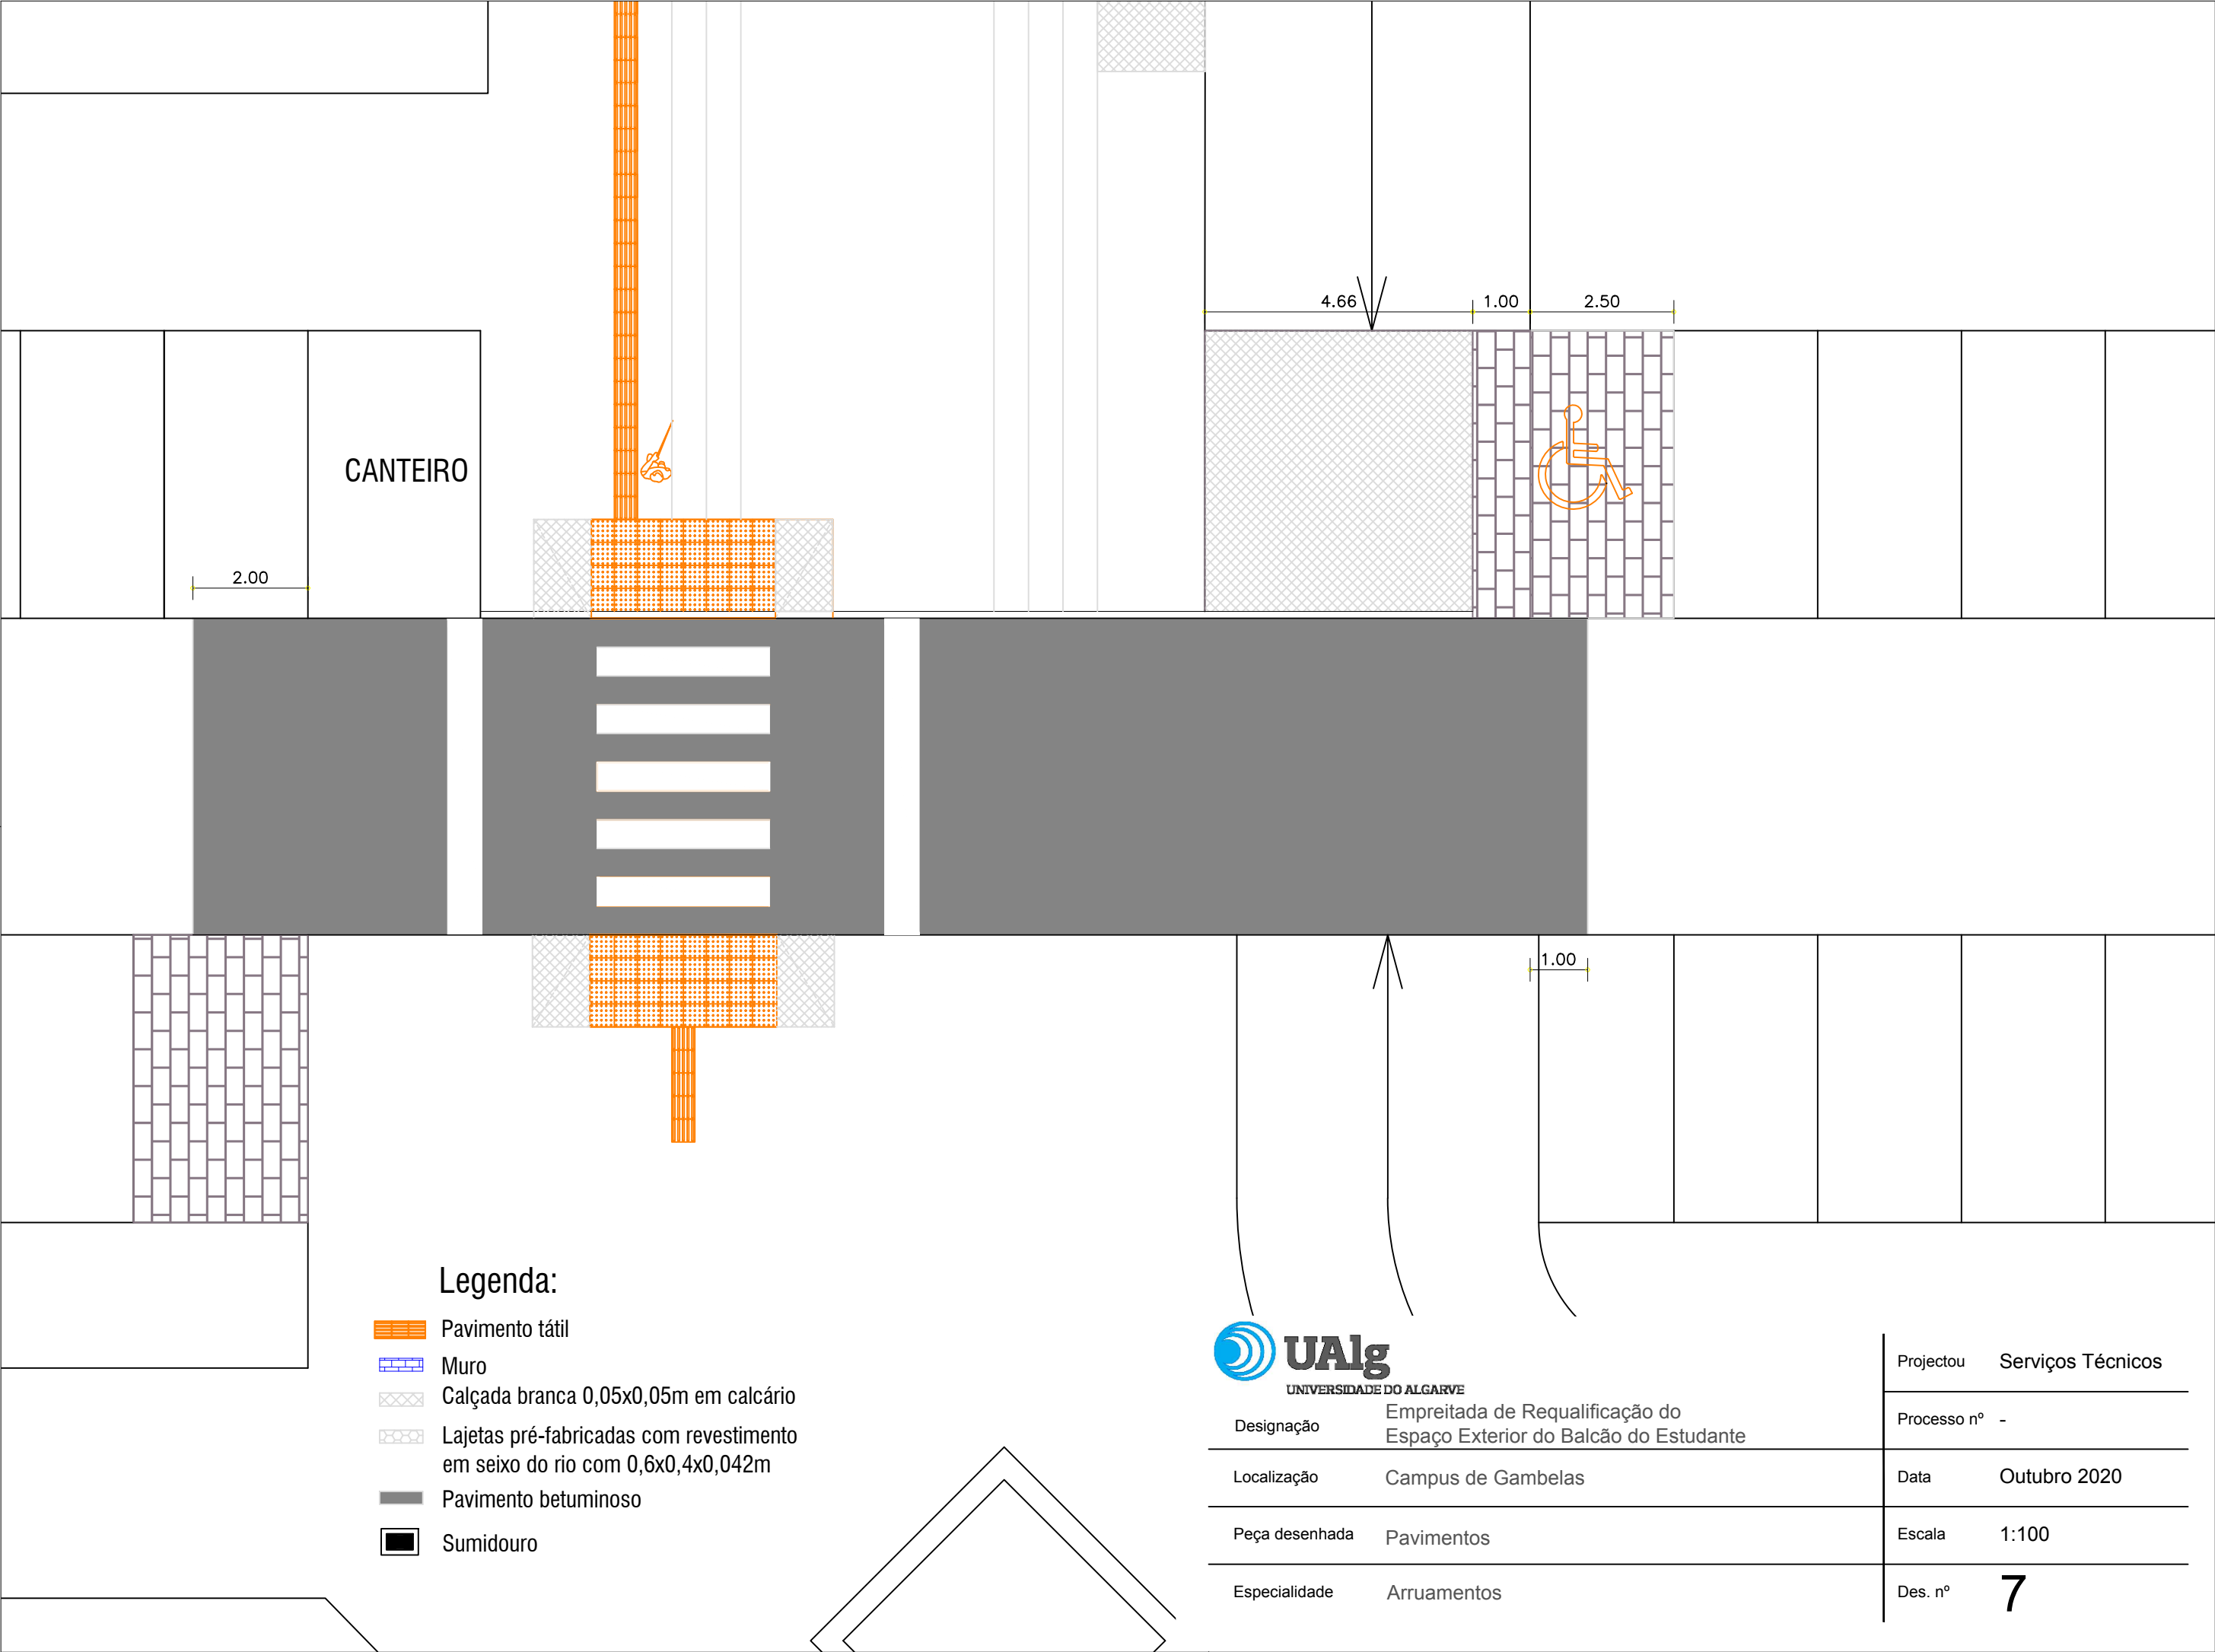


Legenda:

-  Pavimento tátil
-  Muro
-  Calçada branca 0,05x0,05m em calcário
-  Lajetas pré-fabricadas com revestimento em seixo do rio com 0,6x0,4x0,042m
-  Pavimento betuminoso
-  Sumidouro



Designação	Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante	Projectou	Serviços Técnicos
Localização	Campus de Gambelas	Processo nº	-
Peça desenhada	Pavimentos	Data	Outubro 2020
Especialidade	Arruamentos	Escala	1:100
		Des. nº	7


Muro - Corte transversal

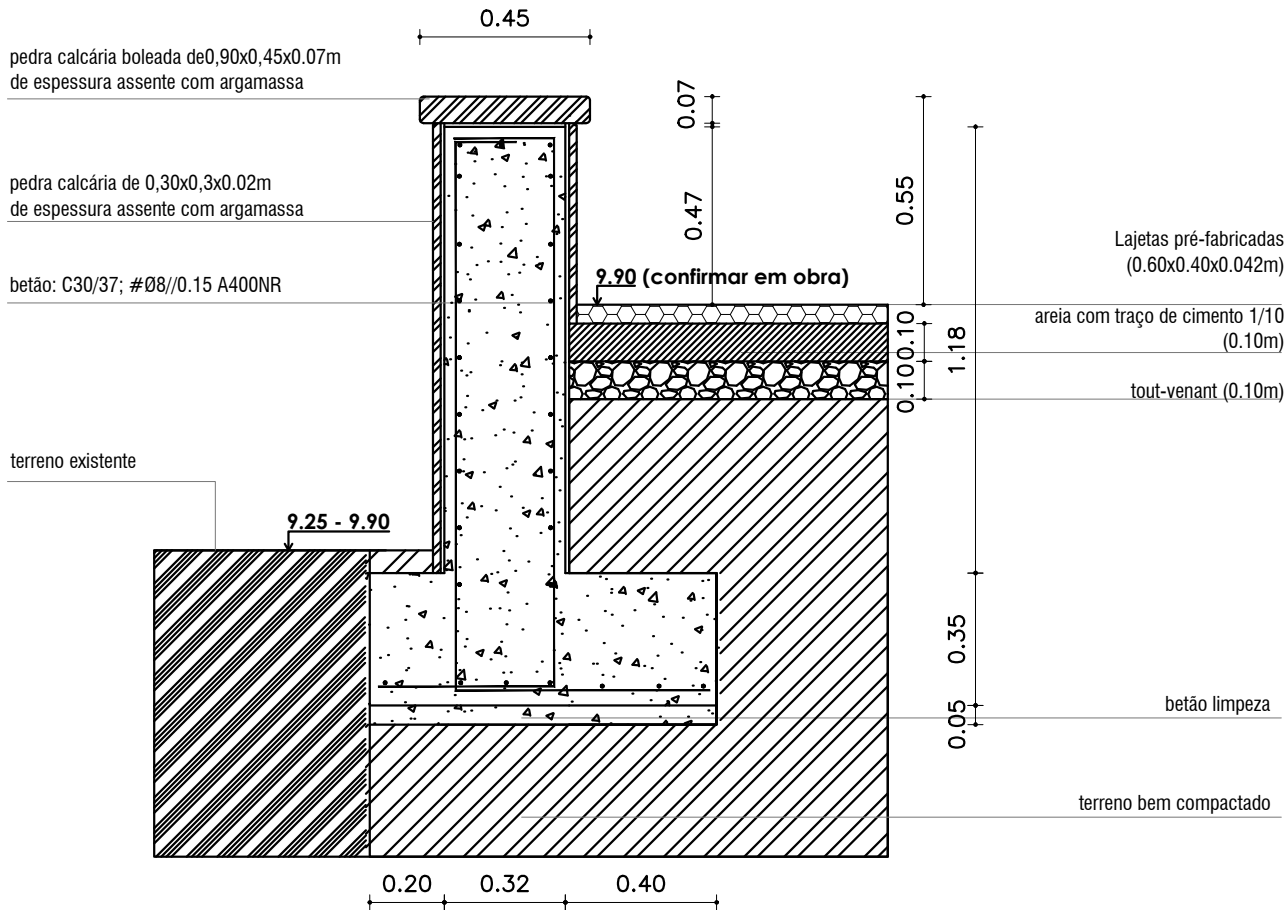

PLANTA

SUMIDOURO

corte GG'

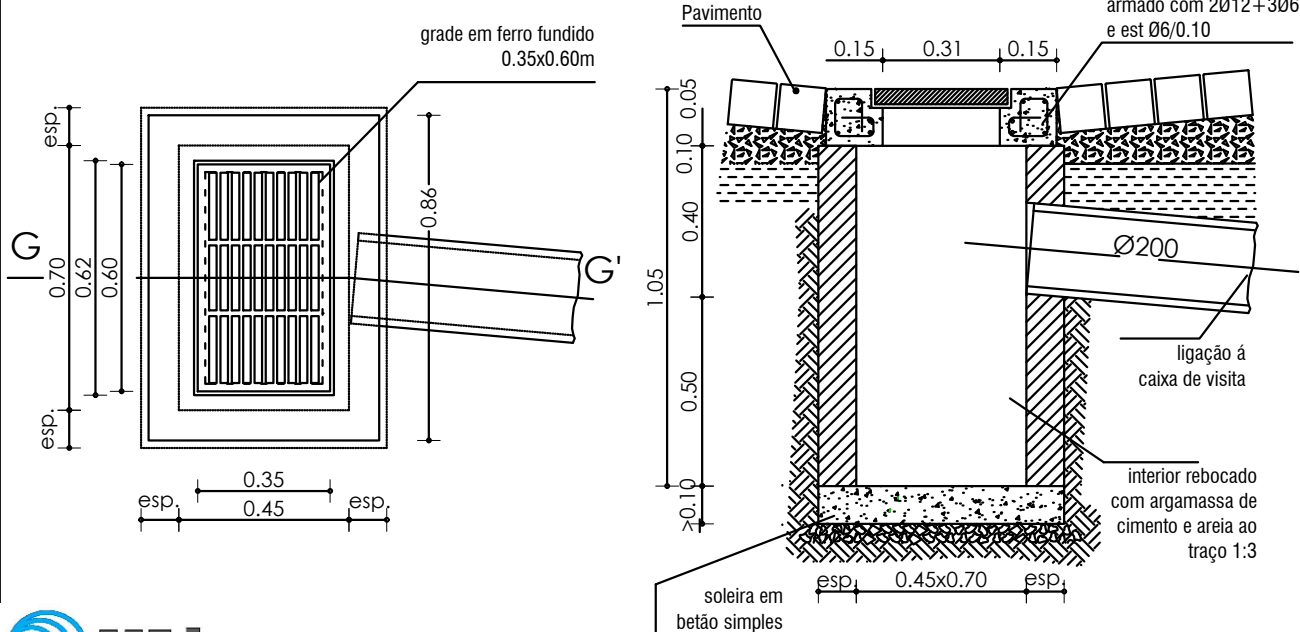

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE		Projectou	Serviços Técnicos
Designação	Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante	Processo nº	-
Localização	Campus de Gambelas	Data	Outubro 2020
Peça desenhada	Muro de Suporte / Sumidouro	Escala	1:20
Especialidade	Arruamentos	Des. nº	9

MAPA DE QUANTIDADES

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE
0	A execução dos trabalhos de remoção da empreitada, inclui todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro autorizado e todos os custos para depósito dos mesmos.		
1.1	Remoção cuidada de pavê, armazenagem para posterior utilização no local, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m2	25,00
1.2	Remoção cuidada de calçada, armazenagem para posterior utilização no local, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m2	32,59
1.3	Remoção do lancil existente, incluindo: Desmonte cuidado do lancil; armazenagem para posterior utilização no local; todos os trabalhos, equipamentos e materiais inerentes.	m	33,60
1.4	Remoção de pavimento betuminoso, incluindo transporte a vazadouro autorizado e custo de depósito dos mesmos, bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m2	16,50
1.5	Desmatção geral com remoção de raízes incluindo transporte a vazadouro autorizado e custo de depósito dos mesmos, bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m2	163,35
1.6	Remoção cuidada de lajetas pré-fabricadas, incluindo transporte a vazadouro autorizado e custo de depósito dos mesmos (peças não aproveitáveis), bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m2	118,25
1.7	Remoção de tronco e raiz de árvore cortada incluindo transporte a vazadouro autorizado e custo de depósito dos mesmos, bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	un	3,00
1.8	Escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m3	4,16
1.9	Demolição de muro em betão armado existente até à cota -0,10 metros do pavimento existente, incluindo transporte a vazadouro autorizado e custo de depósito dos mesmos, bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m3	0,33
2	Muro de Suporte		
2.1	Fornecimento e colocação de betão de limpeza C12/15, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m3	0,97
2.2	Fornecimento e colocação de betão em fundação C30/37, incluindo armadura A400NR, com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m3	3,38
2.3	Fornecimento e colocação de betão C30/37 em parede (muro), incluindo armadura A400NR, com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m3	3,96
2.4	Fornecimento e assentamento de pedra de revestimento semelhante à existente nas faces laterais do muro, com estereotomia e acabamento igual a pedra existente, incluindo material de colagem, equipamento, trabalhos, remates, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento	m2	18,27
2.5	Fornecimento e assentamento de pedra de revestimento semelhante à existente em capeamento com 0,45m de largura, com estereotomia e acabamento igual a pedra existente, incluindo material de colagem, equipamento, trabalhos, remates, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento	ml	10,50
3	Pavimentos - Passeios		

3.1	Fornecimento e aplicação de pavimento táctil de aproximação com dimensões 400x400x35, da Macel, ref.ª LS vermelho, ou equivalente; abertura de fundo de caixa fornecimento e aplicação de almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento do pavimento; criação de pendente de acordo com o desenho de pormenor, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7; correcção de tampas; corte e aplicação das peças; todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	10,24
3.2	Fornecimento e aplicação de pavimento táctil com piso direcional com dimensões 400x400x35, da Macel, ref.ª LG vermelho, ou equivalente; abertura de fundo de caixa; fornecimento e aplicação de almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento do pavimento; criação de pendente de acordo com o desenho de pormenor, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7; correcção de tampas; corte e aplicação das peças; todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	21,32
3.3	Execução de aterro com fornecimento, aplicação e compactação de terra de empréstimo, até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da máxima obtida no teste Proctor Modificado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m3	51,52
3.4	Fornecimento, aplicação de lajetas pré-fabricadas com revestimento em seixo do rio com 0,6x0,4x0,042 metros, abertura, regularização, compactação e nivelamento do fundo de caixa, fornecimento, aplicação e compactação de camada de 0,05m de tout-venant , almofada de assentamento em pó de pedra e cimento ao traço 1:7 com 0,10m de espessura, correcção de cotas em tampas existentes; corte e aplicação das peças; remoção de raízes, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	63,00
3.5	Fornecimento e assentamento de calçada cubos de vidro de calcário, abertura, regularização, compactação e nivelamento do fundo de caixa, fornecimento, aplicação e compactação de camada de 0,05m de tout-venant , almofada de assentamento em pó de pedra e cimento ao traço 1:7 com 0,10m de espessura, correcção de cotas em tampas existentes; corte e aplicação das peças; remoção de raízes, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes. (Nota: Deverão ser respeitadas as faixas e desenhos existentes nos passeios e respectivas cores da calçada).	m2	115,36
3.6	Fornecimento e aplicação de amacissamento em argamassa de cimento em estabilização de pedra de calçada / lajetas prefabricadas, com inclinação a 45°, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução e acabamento.	m3	3,54
3.7	Reposição de calçada cubos de vidro de calcário pré-existent no local incluindo: carga, transporte e descarga, da calçada pré-existente armazenada, fornecimento e aplicação de 10% de calçada idêntica à existente para suprir faltas, abertura, regularização, aplicação de almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento do pavimento; rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7; correcção de cotas em tampas existentes; corte e aplicação das peças; remoção de raízes, todos os materiais e trabalhos inerentes .	m2	39,40
3.8	Assentamento de pavê de perfil I, abertura, regularização, compactação e nivelamento do fundo de caixa, fornecimento, aplicação e compactação de camada de 0,10m de tout-venant, almofada de assentamento em pó de pedra e cimento ao traço 1:7 com 0,10m de espessura, correcção de cotas em tampas existentes; corte e aplicação das peças; remoção de raízes, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes. (Nota: Deverão ser respeitadas as faixas e desenhos existentes nos passeios e respectivas cores da calçada).	m2	32,50

3.9	Execução de retificação de caixas de visita de infraestruturas existentes, incluindo a remoção e assentamento de aro existente para a nova cota, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução e acabamento.	un	2,00
3.10	Fornecimento e assentamento de caixa de recepção tipo sumidouro com grelha metálica, incluindo abertura e tapamento de valas, ligações e todos os acessórios e trabalhos necessários à sua ligação à rede geral, remoção e transporte de produtos sobantes a vazadouro.	un	1,00
3.11	Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada em vala, em PVC PN 4, com Ø200 mm, incluindo abertura e tapamento de valas, acessórios, ligações, materiais e acessórios necessários à sua boa execução e acabamento.	ml	4,00
4	Arruamento		
4.1	Escavação a uma profundidade média de 0,40m para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo; todos os trabalhos e equipamentos; carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição – RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com depósito em vazadouro e 20% para empolamento.	m2	137,20
4.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout venat com 0,30m de espessura em base de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo:rega,compactação e todos os trabalhos e equipamentos inerentes.	m2	137,20
4.3	Fornecimento e aplicação de uma camada de Binder com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem; limpeza de superfícies; correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	137,20
4.4	Aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0,50 kg/m², incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	274,40
4.5	Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC12 com 0,06m de espessura média após compactação em faixa de rodagem ; limpeza de superfícies; correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	137,20
4.6	Reposição de lancil pré-existente com abaixamento do mesmo para 0,02m de altura máxima junto ao pavimento rodoviário incluindo: aplicação de Lancil pré-existente; escavação para abertura de fundação; fornecimento e aplicação de betão para fundação; todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	ml	10,40
4.7	Reposição de lancil pré-existente, com altura igual ao existente, junto ao pavimento rodoviário incluindo: aplicação de Lancil pré-existente; escavação para abertura de fundação; fornecimento e aplicação de betão para fundação; todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	ml	13,40
4.8	Fornecimento e aplicação de lancil de betão tipo L1 da Cavan ou equivalente , 0,09x0,15x1,00m de delimitação de passeio, incluindo: abertura de valas; fundações em betão;todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	14,60
4.9	Aplicação mecânica com máquina autopropulsada de tinta plástica para exterior, à base de resinas acrílicas, cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, para marca rodoviária transversal contínua, de 50 cm de largura. Inclusive microesferas de vidro, para conseguir efeito retrorreflectora em seco.	ml	26,00
4.10	Aplicação mecânica com máquina autopropulsada de tinta plástica para exterior, à base de resinas acrílicas, cor amarela, acabamento acetinado, textura lisa, para marca de estacionamento de mobilidade reduzida, incluindo equipamento, trabalhos, remates, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	un	1,00

Empreitada
Requalificação do Espaço Exterior do
Balcão do Estudante

MAPA DE TRABALHOS						
Artigo	Designação dos Trabalhos	Unidades	Dimensões		Quantidades	
			Largura	Altura	Parciais	Totais
0	A execução dos trabalhos de remoção da empreitada, inclui todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro autorizado e todos os custos para depósito dos mesmos.					
1	Movimento de terras					
1.1	Remoção cuidada de pavê, armazenagem para posterior utilização no local, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m2				25,00
	Estacionamento mobilidade reduzida		5,00		12,50	
	Estacionamento edifício 2		5,00		12,50	
1.2	Remoção cuidada de calçada, armazenagem para posterior utilização no local, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m2				32,59
	Plataforma da passadeira		1,60		16,64	
	Nivelamento de passeio (junto ao muro a demolir		2,00		8,00	
	Caminho tátil - passadeira / Balcão do Estudante		0,50		5,85	
	Caminho tátil - Biblioteca		0,50		1,10	
	Caminho tátil - passadeira / Edifício 1 e 2		0,50		1,00	
1.3	Remoção do lancil existente, incluindo: Desmonte cuidado do lancil; armazenagem para posterior utilização no local; todos os trabalhos, equipamentos e materiais inerentes.	m				33,60
	Ex zona do EcoPonto				14,20	
	Plataforma da passadeira				10,40	
	Plataforma - Caminho para a Cantina				9,00	
1.4	Remoção de pavimento betuminoso, incluindo transporte a vazadouro autorizado e custo de depósito dos mesmos, bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m2				16,50
	Arruamento		3,00		16,50	
1.5	Desmatção geral com remoção de raízes incluindo transporte a vazadouro autorizado e custo de depósito dos mesmos, bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m2				163,35
	Plataforma		107,35		107,35	
	Ex zona do EcoPonto		5,00		23,50	
	Estacionamento mobilidade reduzida		5,00		17,50	
	Estacionamento edifício 2		5,00		15,00	
1.6	Remoção cuidada de lajetas pré-fabricadas, incluindo transporte a vazadouro autorizado e custo de depósito dos mesmos (peças não aproveitáveis), bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m2				118,25
	Arruamento		5,50		118,25	
1.7	Remoção de tronco e raiz de árvore cortada incluindo transporte a vazadouro autorizado e custo de depósito dos mesmos, bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	un				3,00
	Plataforma				2,00	
	Plataforma - Caminho para a Cantina				1,00	
1.8	Escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m3				4,16
	Fundação do muro		0,92	0,40	4,16	

Empreitada
Requalificação do Espaço Exterior do
Balcão do Estudante

MAPA DE TRABALHOS						
Artigo	Designação dos Trabalhos	Unidades	Dimensões		Quantidades	
			Largura	Altura	Parciais	Totais
1.9	Demolição de muro em betão armado existente até à cota - 0,10 metros do pavimento existente, incluindo transporte a vazadouro autorizado e custo de depósito dos mesmos, bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m3				0,33
2	Muro de Suporte					
2.1	Fornecimento e colocação de betão de limpeza C12/15, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m3				0,97
			0,92	0,10	0,97	
2.2	Fornecimento e colocação de betão em fundação C30/37, incluindo armadura A400NR, com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m3				3,38
			0,92	0,35	3,38	
2.3	Fornecimento e colocação de betão C30/37 em parede (muro), incluindo armadura A400NR, com todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa	m3				3,96
			0,32	1,18	3,96	
2.4	Fornecimento e assentamento de pedra de revestimento semelhante à existente nas faces laterais do muro, com estereotomia e acabamento igual a pedra existente, incluindo material de colagem, equipamento, trabalhos, remates, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento	m2				18,27
	Faces laterais			1,70	17,85	
	Topos		0,35	1,20	0,42	
2.5	Fornecimento e assentamento de pedra de revestimento semelhante à existente em capeamento com 0,45m de largura, com estereotomia e acabamento igual a pedra existente, incluindo material de colagem, equipamento, trabalhos, remates, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento	ml				10,50
					10,50	
3	Pavimentos - Passeios					
3.1	Fornecimento e aplicação de pavimento tátil de aproximação com dimensões 400x400x35, da Macel, ref.ª LS vermelho, ou equivalente; abertura de fundo de caixa fornecimento e aplicação de almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento do pavimento; criação de pendente de acordo com o desenho de pormenor, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7; correcção de tampas; corte e aplicação das peças; todos os materiais e trabalhos necessários.	m2				10,24
	Aproximação à passadeira		1,60		10,24	
3.2	Fornecimento e aplicação de pavimento tátil com piso direcional com dimensões 400x400x35, da Macel, ref.ª LG vermelho, ou equivalente; abertura de fundo de caixa; fornecimento e aplicação de almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento do pavimento; criação de pendente de acordo com o desenho de pormenor, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7; correcção de tampas; corte e aplicação das peças; todos os materiais e trabalhos necessários.	m2				21,32
	Caminho tátil - passadeira / Balcão do Estudante		0,40		9,00	
	Caminho tátil - Biblioteca		0,40		0,88	
	Caminho tátil - passadeira / Edifício 1 e 2		0,40		0,80	
	Caminho tátil - Balcão do Estudante / Cantina		0,40		6,64	

MAPA DE TRABALHOS						
Artigo	Designação dos Trabalhos	Unidades	Dimensões		Quantidades	
			Largura	Altura	Parciais	Totais
	Caminho tátil - Balcão do Estudante / Complexo Pedagógico		0,40		4,00	
3.3	Execução de aterro com fornecimento, aplicação e compactação de terra de empréstimo, até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da máxima obtida no teste Proctor Modificado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução.	m3				51,52
	Plataforma - Balcão do Estudante		107,35	0,35	37,57	
	Plataforma - Balcão do Estudante / Cantina		6,20	0,25	13,95	
3.4	Fornecimento, aplicação de lajetas pré-fabricadas com revestimento em seixo do rio com 0,6x0,4x0,042 metros, abertura, regularização, compactação e nivelamento do fundo de caixa, fornecimento, aplicação e compactação de camada de 0,05m de tout-venant , almofada de assentamento em pó de pedra e cimento ao traço 1:7 com 0,10m de espessura, correcção de cotas em tampas existentes; corte e aplicação das peças; remoção de raízes, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2				63,00
	Plataforma - Balcão do Estudante		1,20		22,80	
	Plataforma - Balcão do Estudante		1,20		8,76	
	Plataforma - Balcão do Estudante / Cantina		0,40		13,92	
	Plataforma - Balcão do Estudante / Cantina		0,40		7,20	
	Plataforma - Balcão do Estudante / Cantina		0,40		3,44	
	Plataforma - Balcão do Estudante / Cantina		0,40		6,88	
3.5	Fornecimento e assentamento de calçada cubos de vidro de calcário, abertura, regularização, compactação e nivelamento do fundo de caixa, fornecimento, aplicação e compactação de camada de 0,05m de tout-venant almofada de assentamento em pó de pedra e cimento ao traço 1:7 com 0,10m de espessura, correcção de cotas em tampas existentes; corte e aplicação das peças; remoção de raízes, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes. (Nota: Deverão ser respeitadas as faixas e desenhos existentes nos passeios e respectivas cores da calçada).	m2				115,36
	Plataforma - Balcão do Estudante		8,40		61,32	
	Faixa junto à boca de lobo		0,60		2,16	
	Ex zona do EcoPonto		5,00		23,50	
	Plataforma - Balcão do Estudante / Cantina		4,30		28,38	
3.6	Fornecimento e aplicação de amacissamento em argamassa de cimento em estabilização de pedra de calçada / lajetas prefabricadas, com inclinação a 45°, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução e acabamento.	m3				3,54
	Plataforma - Balcão do Estudante / Cantina		0,30	0,50	3,54	
3.7	Reposição de calçada cubos de vidro de calcário pré-existent no local incluindo: carga, transporte e descarga, da calçada pré-existente armazenada, fornecimento e aplicação de 10% de calçada idêntica à existente para suprir faltas, abertura, regularização, aplicação de almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento do pavimento; rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7; correcção de cotas em tampas existentes; corte e aplicação das peças; remoção de raízes, todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2				39,40
	Plataforma da passadeira		1,00		6,40	
	Nivelamento de passeio (junto ao muro a demolir)		2,00		8,00	
	Nivelamento		5,00		25,00	

Empreitada
Requalificação do Espaço Exterior do
Balcão do Estudante

MAPA DE TRABALHOS						
Artigo	Designação dos Trabalhos	Unidades	Dimensões		Quantidades	
			Largura	Altura	Parciais	Totais
3.8	Assentamento de pavê de perfil I, abertura, regularização, compactação e nivelamento do fundo de caixa, fornecimento, aplicação e compactação de camada de 0,10m de tout-venant, almofada de assentamento em pó de pedra e cimento ao traço 1:7 com 0,10m de espessura, correcção de cotas em tampas existentes; corte e aplicação das peças; remoção de raízes, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes. (Nota: Deverão ser respeitadas as faixas e desenhos existentes nos passeios e respectivas	m2				32,50
	Estacionamento mobilidade reduzida		5,00		17,50	
	Estacionamento edifício 2		5,00		15,00	
3.9	Execução de retificação de caixas de visita de infraestruturas existentes, incluindo a remoção e assentamento de aro existente para a nova cota, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa execução e acabamento.	un				2,00
	Plataforma - Balcão do Estudante				1,00	
	Ex zona do EcoPonto				1,00	
3.10	Fornecimento e assentamento de caixa de recepção tipo sumidouro com grelha metálica, incluindo abertura e tapamento de valas, ligações e todos os acessórios e trabalhos necessários à sua ligação à rede geral, remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro.	un				1,00
	Plataforma - Balcão do Estudante				1,00	
3.11	Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada em vala, em PVC PN 4, com Ø200 mm, incluindo abertura e tapamento de valas, acessórios, ligações, materiais e acessórios necessários à sua boa execução e acabamento.	ml				4,00
	Plataforma - Balcão do Estudante				4,00	
4	Arruamento					
4.1	Escavação a uma profundidade média de 0,40m para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo; todos os trabalhos e equipamentos; carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição – RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com depósito em vazadouro e 20% para empolamento.	m2				137,20
	Faixa de rodagem		5,60		137,20	
4.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout venat com 0,30m de espessura em base de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo:rega,compactação e todos os trabalhos e equipamentos inerentes.	m2				137,20
	Faixa de rodagem		5,60		137,20	
4.3	Fornecimento e aplicação de uma camada de Binder com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem; limpeza de superfícies; correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2				137,20
	Faixa de rodagem		5,60		137,20	
4.4	Aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0,50 kg/m², incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.	m2				274,40
	Faixa de rodagem		5,60		274,40	

Empreitada
Requalificação do Espaço Exterior do
Balcão do Estudante

MAPA DE TRABALHOS						
Artigo	Designação dos Trabalhos	Unidades	Dimensões		Quantidades	
			Largura	Altura	Parciais	Totais
4.5	Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC12 com 0,06m de espessura média após compactação em faixa de rodagem ; limpeza de superfícies; correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2				137,20
	Faixa de rodagem		5,60		137,20	
4.6	Reposição de lancil pré-existente com abaixamento do mesmo para 0,02m de altura máxima junto ao pavimento rodoviário incluindo: aplicação de Lancil pré-existente; escavação para abertura de fundação; fornecimento e aplicação de betão para fundação; todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	ml				10,40
	Passadeira				10,40	
4.7	Reposição de lancil pré-existente, com altura igual ao existente, junto ao pavimento rodoviário incluindo: aplicação de Lancil pré-existente; escavação para abertura de fundação; fornecimento e aplicação de betão para fundação; todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	ml				13,40
	Ex zona do EcoPonto				4,40	
	Plataforma - Balcão do Estudante / Cantina				9,00	
4.8	Fornecimento e aplicação de lancil de betão tipo L1 da Cavan ou equivalente , 0,09x0,15x1,00m em delimitação de passeio, incluindo: abertura de valas; fundações em betão; todos os trabalhos e materiais necessários.	ml				14,60
	Plataforma - Balcão do Estudante / Cantina				14,60	
4.9	Aplicação mecânica com máquina autopropulsada de tinta plástica para exterior, à base de resinas acrílicas, cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, para marca rodoviária transversal contínua, de 50 cm de largura. Inclusive microesferas de vidro, para conseguir efeito retrorreflectora em seco.	ml				26,00
	Linha de paragem				11,00	
	Passadeira				15,00	
4.10	Aplicação mecânica com máquina autopropulsada de tinta plástica para exterior, à base de resinas acrílicas, cor amarela, acabamento acetinado, textura lisa, para marca de estacionamento de mobilidade reduzida, incluindo equipamento, trabalhos, remates, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	un				1,00
	Sinalização de mobilidade reduzida				1,00	

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

Empreitada Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante

Novembro | 2020

Índice

1.	Enquadramento	3
2.	Caracterização Sumária da Empreitada	3
3.	Incorporação de Reciclados de RCD	3
4.	Prevenção e Gestão de RCD	3
4.1.	Princípios Orientadores de Gestão	4
4.2.	Procedimentos de Gestão de RCD	5
5.	Acondicionamento e Triagem de RCD	5
5.1.	Armazenamento temporário dos RCD	5
5.2.	Transporte dos RCD para o destino final adequado	6
6.	Classificação dos RCD	6
7.	Plano Integrado de Gestão de Resíduos	8
8.	Ficha Resumo do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição ..	9
9.	Conclusões	11

1. Enquadramento

O presente Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) acompanha o Projeto da Empreitada Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante no *Campus* de Gambelas, Concelho de Faro, e assegura o cumprimento dos princípios gerais de gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e das normas legais aplicáveis, nomeadamente o Decreto-Lei N°46/2008, de 12 de março alterado pelo Decreto-Lei N°73/2011 de 17 de junho que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei N°178/2006, de 5 de setembro e transpõe a Diretiva N°2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos resíduos.

Incumbe à Entidade Executante ou ao Concessionário executar o PPGRCD tendo por principais objetivos:

- garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis
- a promoção de reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra
- a redução de produção de quantidades de RCD a eliminar, procedendo-se à sua valorização mediante uma correta triagem
- a existência de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva de RCD

2. Caracterização Sumária da Empreitada

A empreitada a levar a efeito é constituída por um conjunto de trabalhos que visam melhorar a circulação pedonal entre os espaços e edifícios, privilegiando a melhoria da acessibilidade de todos aos edifícios no *Campus* de Gambelas.

Pretende-se a adaptação de uma área de espaço exterior, junto ao edifício 5, onde se localiza o Balcão do Estudante, local muito movimentado por alunos, através de ações que levem à eliminação de barreiras arquitetónicas existentes e para que os utentes com mobilidade condicionada possam aceder mais facilmente a todos os locais

3. Incorporação de Reciclados de RCD

De acordo com os trabalhos a executar não está contemplado a Incorporação de Reciclados.

4. Prevenção e Gestão de RCD

A gestão dos RCD que serão gerados na execução dos trabalhos deverá privilegiar a exploração das oportunidades existentes para a sua valorização a nível local ou regional, procurando contribuir para a otimização do desempenho ambiental e económico da empreitada.

4.1. Princípios Orientadores de Gestão

Além do disposto na legislação, a conduta do produtor e/ou detentor de RCD nas operações de gestão deste tipo de resíduos terá necessariamente de ter como base os seguintes princípios:

- A gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da responsabilidade do respetivo produtor. Esta responsabilidade termina pela transmissão dos resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou pela sua transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de resíduos;
- O objetivo prioritário da política de gestão de resíduos é evitar e reduzir a sua produção bem como o seu carácter nocivo, devendo a gestão de resíduos evitar e reduzir o risco para a saúde humana e para o ambiente causado pelos resíduos, sem utilizar processos ou métodos suscetíveis de gerar efeitos adversos sobre o ambiente, nomeadamente através da criação de perigos para a água, o ar, o solo, a fauna e a flora, perturbações sonoras ou odoríficas ou de danos em quaisquer locais de interesse e na paisagem;
- A prevenção no fluxo de RCD, devendo existir uma redução na produção dos resíduos, mediante a aplicação de princípios de gestão correta;
- Sempre que possível, deverá recorrer-se a sistemas de reutilização. Quando esta não for viável deverá proceder-se à reciclagem e outras formas de valorização, com vista a reduzir a quantidade e a perigosidade dos resíduos a eliminar;
- A eliminação definitiva de resíduos, nomeadamente a sua deposição em aterro, deverá constituir a última opção de gestão, justificando-se apenas quando seja técnica ou financeiramente inviável a prevenção, a reutilização, a reciclagem ou outras formas de valorização;
- As operações de gestão de valorização e eliminação de RCD devem ser efetuadas por operadores devidamente autorizados / licenciados para esse efeito. Para tal, poderá consultar-se a “Lista de Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos”, que se encontra disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente. Caso existam fatores que não permitam a seleção de um operador licenciado, o Empreiteiro deverá optar, preferencialmente, por um operador que já tenha dado

entrada do processo de licenciamento da sua atividade junto das entidades competentes e apresentar o caso ao Dono da Obra, para apreciação e aprovação.

4.2. Procedimentos de Gestão de RCD

Na definição do destino final mais adequado, deverá privilegiar-se sempre a opção de valorização em detrimento da eliminação. As operações de valorização dos RCD passam pela reutilização por meios próprios no local da obra e/ou reciclagem por operadores de gestão licenciados.

A reutilização dos resíduos no local da obra deverá ser privilegiada e realizada sempre que tecnicamente possível. Esta operação, bem como o posterior armazenamento dos materiais reciclados, deverá realizar-se em condições ambientalmente adequadas e de acordo com a legislação vigente. Todos os encargos com a reciclagem dos resíduos no local serão por conta do Empreiteiro, sendo os materiais resultantes deste processo propriedade do mesmo.

No caso dos resíduos que serão valorizados externamente, estes são também pertença do Empreiteiro, devendo este dar cumprimento à legislação para fluxos específicos de resíduos contidos no RCD e proceder ao seu encaminhamento para os operadores de gestão devidamente autorizados / licenciados. Os encargos e/ou contrapartidas financeiras que o Empreiteiro venha a obter da valorização externa dos resíduos serão por sua conta e/ou reverterão a seu favor.

Os RCD que não são passíveis de valorização deverão ser encaminhados para operadores de gestão específicos devidamente autorizados para a sua eliminação. Todos os encargos com a eliminação dos resíduos são por conta do Empreiteiro.

O Dono da Obra – Universidade do Algarve – poderá exigir ao Empreiteiro a remoção de produtos para valorização exterior se se considerar que, na fração de resíduos a eliminar, existem quantidades significativas de materiais em condições de serem valorizáveis.

5. Acondicionamento e Triagem de RCD

5.1. Armazenamento temporário dos RCD

As operações de armazenagem e triagem de RCD em obra deverão ser realizadas de acordo com os requisitos definidos no Anexo I do Decreto-Lei Nº46/2008, de 12 de março, garantindo-se assim a máxima reutilização e valorização dos resíduos a produzir.

5.2. Transporte dos RCD para o destino final adequado

O transporte dos RCD deverá cumprir o disposto na legislação em vigor, nomeadamente a Portaria Nº 145/2017, de 26 de abril que define as regras aplicáveis a que fica sujeito o transporte de resíduos e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos – *e-GAR*.

Esta Portaria estabelece as responsabilidades e deveres dos produtores, transportadores e destinatários dos resíduos, nomeadamente:

- i. Deveres do produtor de resíduos:
 - Emitir a *e-GAR* em momento prévio ao transporte de resíduos;
 - Após a emissão da *e-GAR* deve verificar, na plataforma eletrónica, qualquer alteração dos dados originais efetuada pelo destinatário no prazo máximo de 10 dias;
 - Verificar que a *e-GAR* fica concluída na plataforma após receção dos resíduos pelo destinatário, no prazo máximo de 30 dias.
- ii. Deveres do transportador de resíduos:
 - Confirmar o correto preenchimento da *e-GAR*;
 - Disponibilizar a *e-GAR* sempre que solicitado pelas autoridades competentes durante o transporte devidamente autorizado pelo produtor dos resíduos.
- iii. Deveres do destinatário dos resíduos:
 - No prazo máximo de 10 dias confirmar a receção dos resíduos;
 - Propor a correção dos dados originais da *e-GAR* caso identifique alguma incorreção, ou rejeitar a receção dos mesmos, caso seja necessário.

O produtor ou detentor, o transportador e o destinatário dos resíduos devem conservar as *e-GAR*, em formato físico ou eletrónico, durante um período de cinco anos, e, quando solicitadas, ser facultadas às autoridades competentes em matéria de resíduos e de transporte de mercadoria.

6. Classificação dos RCD

Os RCD podem ser classificados de diferentes formas, as quais se resumem no quadro da página seguinte. No entanto, para efeitos legais os RCD devem ser classificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos - LER, a qual foi criada com o intuito de uniformizar e facilitar a identificação dos mesmos.

Classificação de acordo com a Lista Europeia de Resíduos	<p>A Lista Europeia de Resíduos, LER, foi publicada pela Decisão 2014/955/EU, da Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, referida no artigo 7º da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro e diz respeito a uma lista harmonizada de resíduos que tem em consideração a origem e composição dos resíduos.</p> <p>Esta decisão é obrigatória e diretamente aplicável pelos Estados membros e na prossecução, a partir de 1 de junho de 2015 passou a aplicar-se diretamente a Decisão, no que diz respeito à classificação LER, e consequentemente, foi revogado o anexo I da portaria n.º 209/2004, de 3 de março.</p>
Classificação de acordo com o tipo de obra	<p><u>Resíduos de construção</u> – resíduos provenientes de obras novas de construção de edifícios e infraestruturas</p> <p><u>Resíduos de demolição</u> – resíduos provenientes de obras de demolição de edifícios ou infraestruturas</p> <p><u>Resíduos de reparação</u> – resíduos resultantes de obras de remodelação e reparação de edifícios e infraestruturas</p>
Classificação segundo o tipo de material que se encontra presente	<p><u>Resíduos inertes</u> – terras, argamassas, tijolos, telhas, alvenaria, etc.</p> <p><u>Resíduos não inertes</u> – embalagens diversas, plásticos, madeiras, metais, vidros, etc.</p> <p><u>Resíduos perigosos</u> – fluidos de refrigeração, óleos usados, latas de tintas e solventes, amianto, etc.</p>
Classificação segundo o destino final dos resíduos	<p><u>Resíduos reutilizáveis</u> – resíduos que podem ser reutilizados diretamente no local da obra ou noutras.</p> <p><u>Resíduos recicláveis</u> – resíduos que podem ser reciclados.</p> <p><u>Resíduos não recicláveis</u> – resíduos que, devido às características ou por se encontrarem contaminados, não podem ser reciclados.</p>

 UALg UNIVERSIDADE DO ALGARVE DIREÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS	PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO	
---	--	--

7. Plano Integrado de Gestão de Resíduos

De acordo com os trabalhos a desenvolver e os materiais a aplicar, resume-se no seguinte quadro os resíduos expectáveis para a obra em estudo.

Produtor						Transportador	Destino Final			
Designação do Resíduo	Código LER	Classificação da Perigosidade	Local de Produção	Entidade Produtora	Condições de Armazenagem	Entidade Transportadora	Registo	Entidade Recetora	Data de Entrega	Operação
Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01.	17 03 02	Não Perigoso	Frente de Obra	Empreiteiro	Armazenamento Temporário Identificado	A Definir	e-GAR	A Definir	Final dos Trabalhos	A Definir
Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04	Não Perigoso	Frente de Obra	Empreiteiro	Armazenamento Temporário Identificado	A Definir	e-GAR	A Definir	Final dos Trabalhos	A Definir

8. Ficha Resumo do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

I. Dados gerais da entidade responsável pela obra

- a) Universidade do Algarve
- b) *Campus* da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro
- c) Contacto 289 800 100; st@ualg.pt
- d) Número Identificação Pessoa Coletiva 505 387 271
- e) CAE 85420

II. Dados gerais da obra

- a) Tipo de obra: Requalificação do Espaço Exterior do Balcão do Estudante
- b) Código do CPV: 45233200-1 Obras diversas de pavimentação.
- c) Nº de processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): Não aplicável
- d) Espaço Exterior do Balcão do Estudante no Campus de Gambelas

III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

1. Caracterização da obra

- a) Caracterização sumária da obra a efetuar
- Desta Empreitada, constam os seguintes trabalhos:
- Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro;
- Remoção de pavimentos
- Movimento de terras
- Escavações
- Demolição de muro em betão armado;
- Execução de muro de Suporte
- Execução de pavimento táctil e betuminoso.
- Sinalização
- Limpeza do espaço da obra.

2. Incorporação de reciclados

- a) Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD
- Deverá a Entidade Executante indicar a metodologia que irá utilizar para a incorporação de reciclados na empreitada. Reciclados de RCD integrados na obra (os valores devem ser aferidos em obra e registados)

b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificação dos reciclados	Quantidade integrada na obra (t)	Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)
---	---	---
---	---	---
Valor total	---	---

3. Prevenção

a) Metodologia de prevenção de RCD

A metodologia de prevenção baseia-se no controlo dimensional de todos os elementos materiais a utilizar na obra, de forma a maximizar a sua rentabilidade, minimizando assim as sobras, perdas e desperdícios de material, como o efeito de redução de resíduos produzidos pelo fabrico de certos materiais.

O empreiteiro será responsável pela instalação de triagem na obra a localizar no interior do perímetro da mesma, e posteriormente os elementos de resíduos serão encaminhados para reciclagem. O empreiteiro – produtor dos resíduos – será responsável pelo encaminhamento para operador de gestão licenciado.

Deverão igualmente ser desenvolvidas e registadas ações de sensibilização junto dos trabalhadores com o objetivo de promover a sua adesão à correta deposição e triagem de resíduos e dar a conhecer o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.

b) Cumprimento dos requisitos técnicos relativos à recolha, manuseamento, acondicionamento, transporte e armazenagem de substâncias regulamentadas, nomeadamente:

- i. Devem ser tomadas precauções especiais de forma a evitar perdas não controladas;
- ii. Os equipamentos não devem sofrer choques mecânicos nem ser invertidos;
- iii. Os equipamentos devem ser colocados de forma segura evitando que escorreguem ou caiam durante o seu transporte;

c) Materiais a reutilizar em obra

Identificação dos materiais	Quantidade a reutilizar (m³)	Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%)
---	---	---
---	---	---
---	---	---

4. Acondicionamento e triagem de RCD

a) A triagem será feita no local da obra, em espaço a designar pelo empreiteiro e deverá contemplar espaços para a deposição dos resíduos.

b) RCD produzidos em obra:

Com vista a uma adequada gestão dos resíduos produzidos na obra e ao seu armazenamento temporário, será criado um parque de resíduos coberto e equipado com big bag's e bidões metálicos, devidamente identificados com o tipo de resíduo a depositar.

Nas frentes de obra, serão ainda distribuídos, pelas várias equipas de trabalhos, big bag's de forma a separar na origem todos os resíduos, prevenir a sua mistura e contaminação, e potenciar a valorização dos mesmos aquando da transferência para os operadores de gestão de resíduos/destinos autorizados ou entidades responsáveis pelos sistemas de gestão de fluxos de resíduos.

Quando aplicável, o estaleiro deverá estar dotado de bacias de retenção para armazenar/acondicionar os produtos químicos, resíduos que possam ser perigosos e outros materiais suscetíveis de formarem lixiviados e contaminar o solo e os recursos hídricos.

Deverá a Entidade Executante aferir em obra as quantidades de resíduos e efetuar o respetivo registo, bem como entregar todas as guias de remessa.

d) Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua impossibilidade

5. Produção de RCD

Código LER	Quantidades produzidas (kg, ton ou m³)	Quantidade para reciclagem (%)	Operação de reciclagem	Quantidade para valorização (%)	Operação de valorização	Quantidade para eliminação (%)	Operação de eliminação
		-	-	-	-		

Deverá a Entidade Executante aferir em obra as quantidades de resíduos e efetuar o respetivo registo, bem como entregar todas as guias de remessa

9. Conclusões

O presente documento constitui uma proposta do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição para a execução da Empreitada de Requalificação dos Arruamentos Envolventes aos Pavilhões de Alvenaria no *Campus* de Gambelas, em cumprimento do definido no artigo 10º do Decreto – Lei N°46/2008, de 12 de março.

Este plano serve de orientação à gestão de resíduos na obra, devendo ser desenvolvido e adaptado pelo empreiteiro caso se verifique a necessidade de o tornar mais ajustado à realidade da obra durante a sua execução, ou de forma o articular às demais exigências em matéria de gestão de resíduos.



PLANIFICAÇÃO DA SEGURANÇA EM OBRA

Empreitada Requalificação do Espaço Exterior
do Balcão do Estudante no *Campus* de
Gambelas

PLANIFICAÇÃO DA SEGURANÇA EM OBRA

Tendo em conta o n.º 4 do art.º 5 do Decreto-Lei 273/2003 de 29 de outubro o plano de segurança e saúde não é obrigatório.

Contudo, antes de se iniciarem os trabalhos a entidade executante deverá apresentar fichas de segurança para os trabalhos a desenvolver de acordo com a seguinte estrutura prevista no referido Decreto-Lei:

- a) A identificação, caracterização e duração da obra;
- b) A identificação dos intervenientes no estaleiro que sejam relevantes para os trabalhos em causa;
- c) As medidas de prevenção a adotar tendo em conta os trabalhos a realizar e os respetivos riscos;
- d) As informações sobre as condicionantes existentes no estaleiro e na área envolvente, nomeadamente as características geológicas, hidrológicas e geotécnicas do terreno, as redes técnicas aéreas ou subterrâneas e as atividades que eventualmente decorram no local que possam ter implicações na prevenção de riscos profissionais associados à execução dos trabalhos;
- e) Os procedimentos a adotar em situações de emergência.

O coordenador de segurança em obra deve analisar a adequabilidade das fichas de procedimentos de segurança e propor à entidade executante as alterações adequadas.

A entidade executante só pode iniciar a implantação do estaleiro quando dispuser das fichas de procedimentos de segurança devidamente aprovadas, devendo o dono da obra assegurar o respeito desta prescrição.

As fichas de procedimentos de segurança devem estar acessíveis, no estaleiro, a todos os subempreiteiros e trabalhadores independentes e aos representantes dos trabalhadores para a segurança, higiene e saúde que nele trabalhem.
